



Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 5 - Gmina Pakość

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 5

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	23 795 552,10
Środki UE	12 382 261,05
Środki własne	7 628 682,31
Inne	3 784 608,74


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 5 w ujęciu procentowym

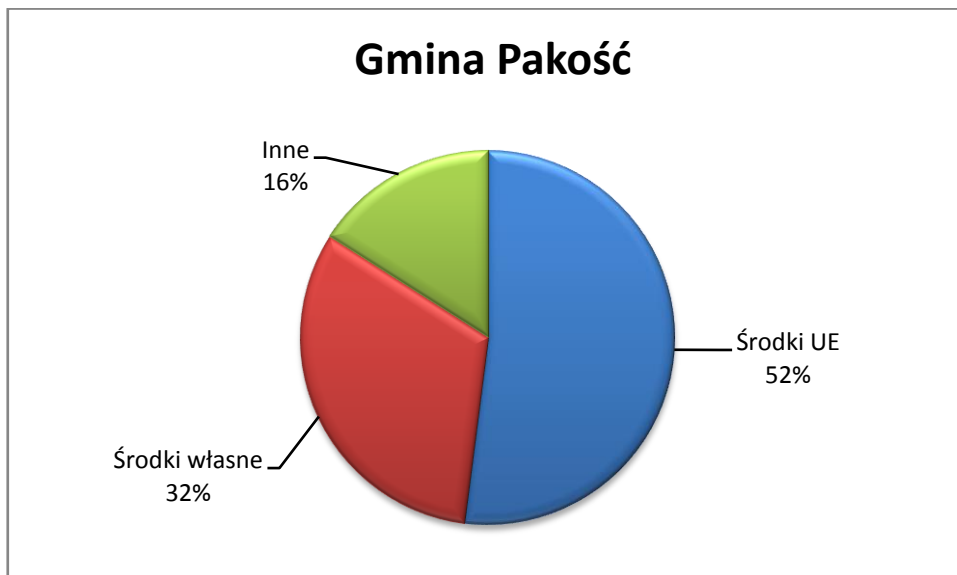


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 5

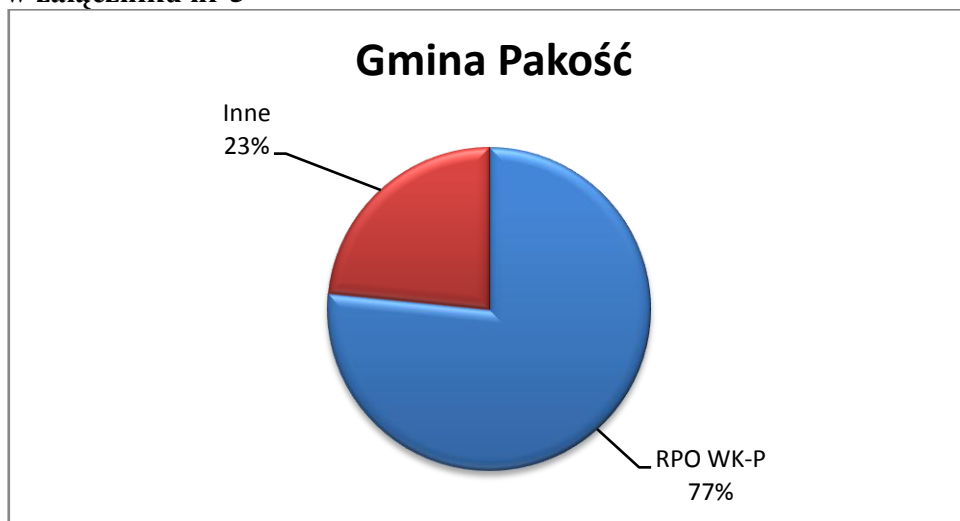

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 5

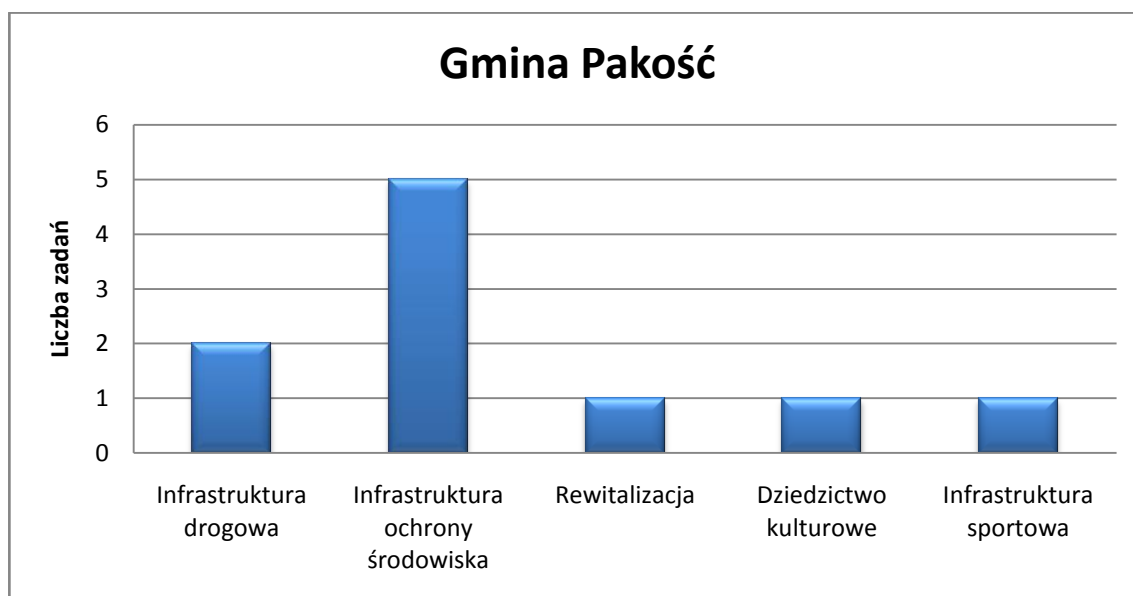

Źródło: opracowanie własne

Gmina Pakość**Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej	2007-2013	7 100 333,19	3 500 000	3 600 333,19	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Zrealizowany zakres zadania jest zgodny z planowanym. Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej została wykonana na długości 1,870 km. Realizacja projektu polegała m.in. na wykonaniu utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji, oświetlenia ulic oraz zatoki autobusowej.
2	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jankowo	2012	549 946,28	-	459 946,28	90 000,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Zadanie zostało zrealizowane w 100% w 2010 r. Nawierzchnia została wykonana na odcinku 1.718 mb.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz modernizacja stacji uzdatniania wody przy	2007-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Gmina przeprowadziła niezbędną do prawidłowego funkcjonowania modernizację stacji uzdatniania wody przy

	ul. Inowrocławskiej w Pakości i w miejscowości Kościelec						ul. Inowrocławskiej.
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	2007-2013	I etap 931 124,65 II etap 440 000,00	-	231 124,65 115 000,00	700 000,00 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 325 000,00 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie jest w trakcie realizacji. Ze względów finansowych inwestycja została podzielona na 3 etapy niezależne technologicznie. W 2011 r. został zrealizowany etap I, w ramach którego wybudowano 766 m sieci o średnicy 200 mm oraz przepompownię ścieków PS-3. W 2012 r. przystąpiono do realizacji II etapu (termin zakończenia 15 listopada 2012r.), w ramach którego wybudowano 438 m sieci o średnicy 200 mm, 178 m przyłączy o średnicy 180 mm oraz przepompownię ścieków PS-2
3	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej we wsi Rybitwy	2010-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2012 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej.
4	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Radłowskiej	2010-2012	1 109 130,98	-	717 130,98	392 000,00 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wybudowano 551 mb sieci o średnicy 250 mm, co umożliwiło podłączenie odcinków sieci wybudowanych w ramach zadania: pn. „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255 w Pakości” do istniejącej sieci.

5	Budowa instalacji spalania gazu wysypiskowego	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
---	---	-----------	---	---	---	---	-----------------------------------

Obszar tematyczny: Rewitalizacja

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłych zakładach lniarskich	2008-2013	-	-	-	-	W 2012 r. podjęto pracę nad dokumentacją projektową zgodnie z przyjętym planem. Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	2009-2013	13 665 017,00	8 882 261,05	2 505 147,21	2 277 608,74 - kredyt bankowy	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury. Dotychczas zrealizowanych zostało w ramach projektu ponad 46% zakładanych prac. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało w 2012 r. W ramach zadania wykonano: - infrastrukturę drogową, - kanalizację, - sanitariaty, - oświetlenie, - oświetlenie ul. Cmentarnej, - zieleń,

							<ul style="list-style-type: none"> - małą architekturę, - kapliczki, - elektrykę w kapliczkach, - uruchomiono Centrum Informacji Turystycznej.
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej	2010-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
