



Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 10 - Gmina Inowrocław

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 10

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	37 337 413,32
Środki UE	673 485,70
Środki własne	36 383 275,68
Inne	280 651,94


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 10 w ujęciu procentowym

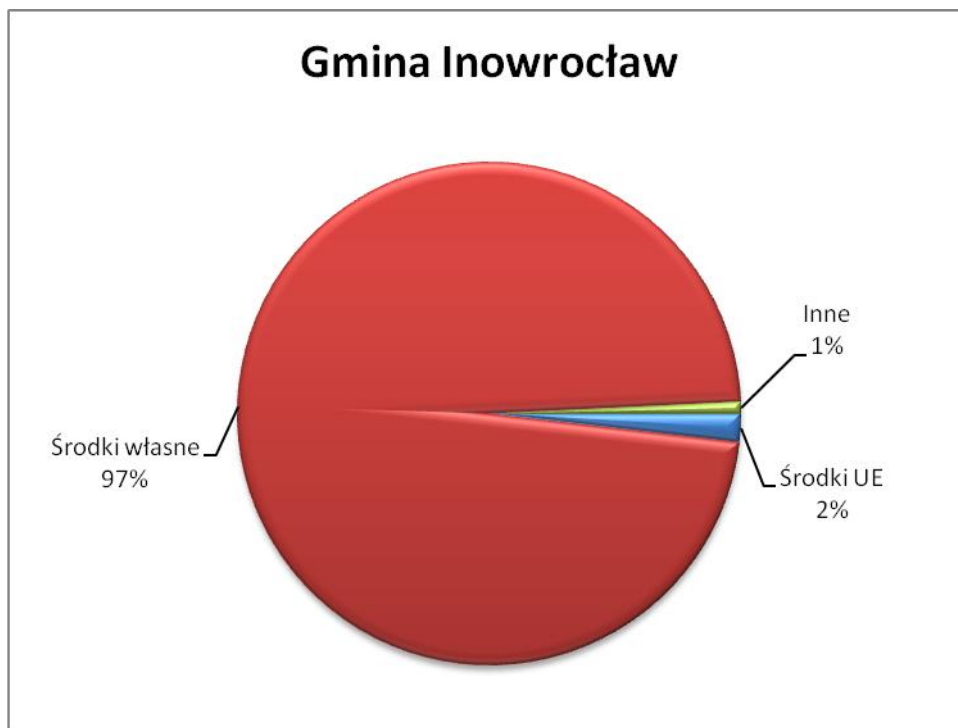


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 10

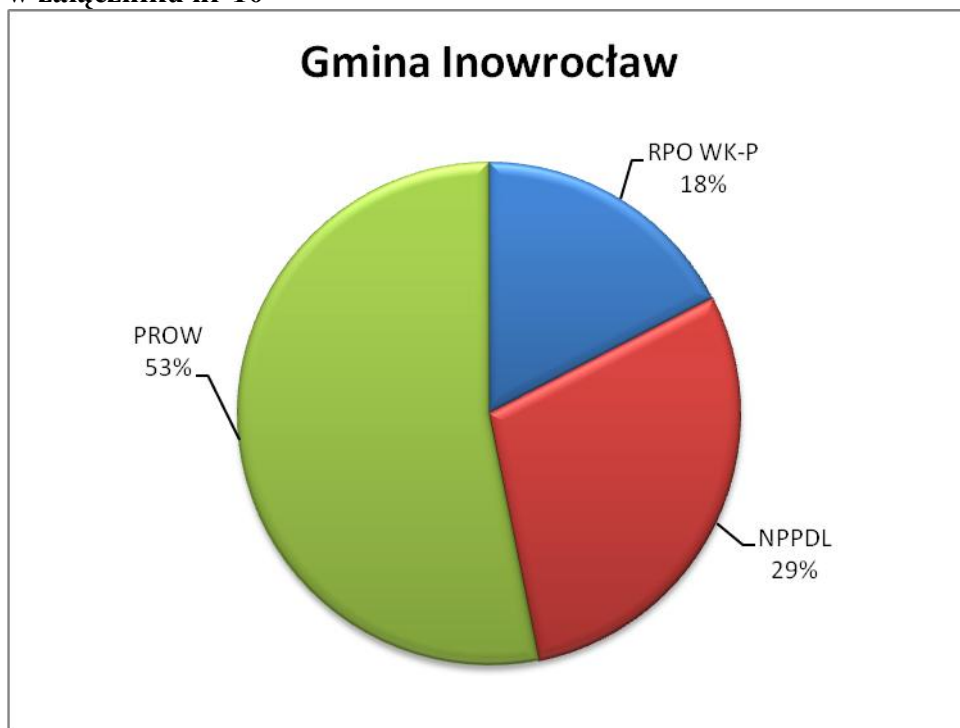

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 10

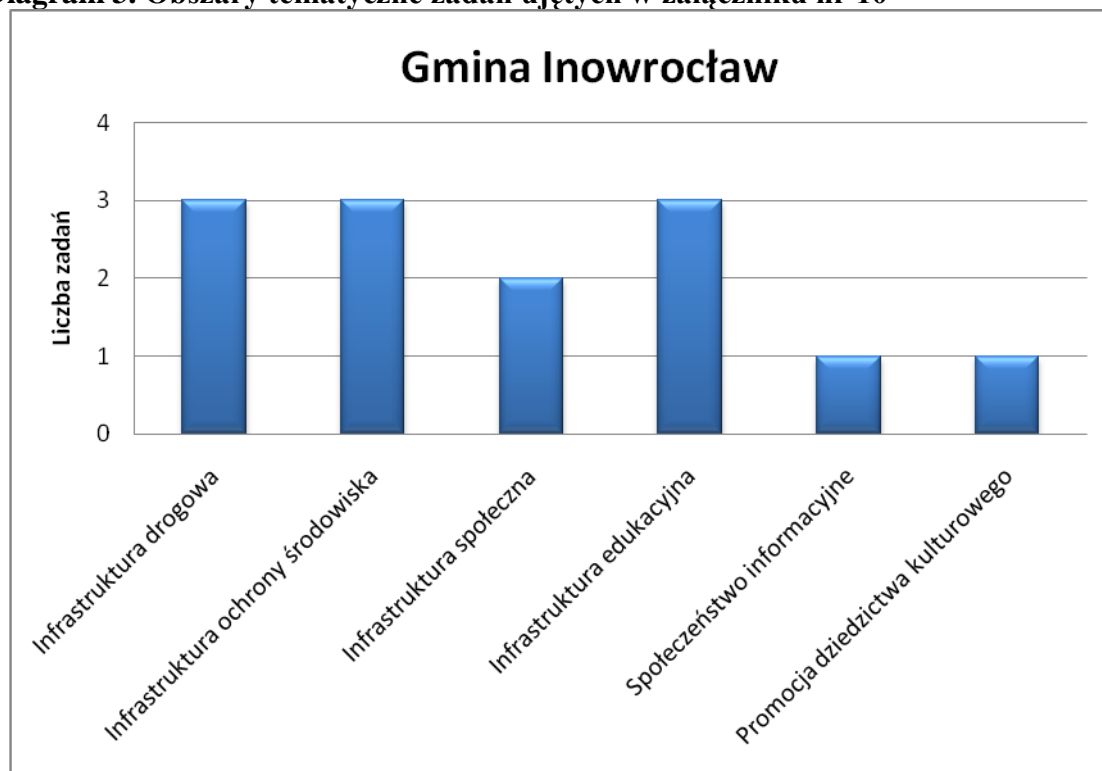

Źródło: opracowanie własne

Gmina Inowrocław**Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w podinowrocławskich miejscowościach	2007-2010	1 074 833,86	-	1 074 833,86	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Wybudowano chodniki w miejscowościach: – Kłopot-Orłowo, przy drodze powiatowej nr 2033 – ok. 2110 m, – Marcinkowo, przy drodze powiatowej nr 2545 – ok. 1500 m, – Jaksice, ul. Dworcowa – ok. 320 m, – Góra, przy drodze powiatowej nr 2569 – 160 m, – Czyste, przy drodze powiatowej nr 2518 – 150 m, – Sikorowo, przy drodze powiatowej nr 2567 – 300 m. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynierskich na łącznym odcinku 4540 m.
2	Budowa drogi Latkowo-Jacewo-Komaszyce	2009-2012	1 222 299,93	-	1 222 299,93	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończono dwa etapy budowy: I etap od drogi wojewódzkiej nr 252 w kierunku Komaszyc (centrum) – ok. 1,1 km. II etap od drogi powiatowej nr 2545 w m. Jacewo w kierunku Balina i Latkowa ok. 900 m. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2012-2015. W wyniku zakończonych dwóch etapów inwestycji, poprawie uległ stan techniczny i użytkowy dróg na odcinku ok. 2,0 km.
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych zapewniających dostępność do lokalnych ośrodków wzrostu i poprawiająca jakość	2007-2012	4 758 976,56	166 232,16	4 312 092,46	280 651,94 – budżet państwa	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1

	terytorium					<p>Infrastruktura drogowa oraz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi w m. Jacewo w kierunku Turzan – ok. 450 m, - naprawa dróg osiedlowych w m. Cieślin – ok. 300 m, - przebudowa drogi w m. Dulsk (od cmentarza w kierunku Pławinka) – ok. 500 m, - przebudowa dróg w m. Jaksice (Nowe Osiedle – ul. Polna 950 m, ul. Krótka – ul. Długa) – 1500 m, - budowa drogi Radłówek-Jaksice – 650 m, - przebudowa drogi w m. Sławęcinek do drogi w kierunku Sójkowa – ok. 500 m, - przebudowa drogi w m. Turzany – ok. 350 m, - przebudowa drogi w m. Żalinowo (droga w m. Piotrkowice ok. 350 m oraz w m. Żalinowo 350 m), - budowa drogi w m. Orłowo – 1500 m, - budowa drogi w m. Balczewo – 1500 m, - budowa drogi w m. Batkowo – 1300 m, - przebudowa drogi w m. Kłopot – 300 m, - przebudowa drogi w m. Tupadły w kierunku Kruszy Duchownej – 400 m, - budowa chodnika w m. Trzaski – 300 m, - budowa miejscowości w m. Krusza Podlotowa – 1500 m, - budowa chodnika w m. Turzany – 250 m, - budowa chodnika w m. Pławinek 240 m, - budowa drogi w m. Łojewo – 170 m. <p>Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynierskich na odcinku 11910 m.</p>
--	------------	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Inowrocław: Kłopot, Orłowo, Jacewo, Dalkowo, Marcinkowo, Balczewo, Sikorowo, Łojewo, Dulsk, Góra, Łąkocin, Pławinek, Krusza Duchowna, Tupadły, Krusza Zamkowa	2008-2012	1 005 900,98	-	1 005 900,98	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ramach zadania został wykonany gazociąg w części miejscowości Jacewo oraz w części miejscowości Kłopot.
2	Budowa kanalizacji głównej i szczegółowej następujących wsi na terenie Gminy Inowrocław: – Borkowo, Jaksice, Stefanowo, – Kłopot, Orłowo, – Jacewo, Dalkowo, – Jacewo, Trzaski, Komasyce, – Łojewo, – Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Żalinowo, Piotrkowice	2007-2015	12 946 277,60	-	12 946 277,60	-	Inwestycja została zrealizowana w ok. 15%. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Jacewo wzdłuż drogi wojewódzkiej do miejscowości Komasyce oraz w miejscowości Łojewo. Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji w miejscowości Jacewo wzdłuż drogi powiatowej oraz w miejscowości Dalkowo. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2012-2017.
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Karczynie	2007-2010	26 000,00	-	26 000,00	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dotychczas została wykonana dokumentacja techniczna. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2013-2015.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców inowrocławskich wsi	2007-2012	2 365 689,52	266 518,57	2 099 170,95	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dotychczas oddano do użytku i wyposażono pięć budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Sławęcinek, Orłowo, Sikorowo, Łąkocin oraz Jacewo. Na bieżąco remontowane i doposażone są istniejące budynki świetlic. Oddano również do użytku 12 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Miechowice, Pławinek, Komaszycy, Orłowo, Sławęcinek, Krusza Zamkowa. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2	Modernizacja i remonty obiektów gminnych	2007-2012	1 965 785,59	240 734,97	1 725 050,62	-	Zadanie zostało wykonane w 70% w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzono remont dachu budynku Urzędu Gminy, – przeprowadzono termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Orłowo, – wybudowano i wyposażono świetlicę wraz z remizą OSP w miejscowości Jacewo, – przeprowadzono modernizację Pałacu w miejscowości Komaszycy (remont poszycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej). Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jacewie sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa Gimnazjum w Żalinowie im. Jana Pawła II	2007-2011	1 839 679,55	-	1 839 679,55	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z salami lekcyjnymi. Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górze	2007-2011	1 788 029,39	-	1 788 029,39	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z trzema salami lekcyjnymi. Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaksicach	2007-2011	4 270 763,34	-	4 270 763,34	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z salami lekcyjnymi. Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Internet pod strzechami – mieszkańcy inowrocławskich wsi w światowej sieci internetowej	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji zadania 2012-2020.

Obszar tematyczny: **Promocja dziedzictwa kulturowego**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Aktywizacja kulturalna środowisk społecznych gminy Inowrocław	2007-2012	4 073 177,00	-	4 073 177,00	-	Zadanie zrealizowano w 90%, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2011 udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego dla imprez, spotkań i szkoleń oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (m.in. wycieczki, wydano foldery i publikacje).
