



Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 7 - Gmina Rojewo

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 7

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	7 600 411,18
Środki UE	1 038 722,93
Środki własne	5 468 688,25
Inne	1 093 000,00


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 7 w ujęciu procentowym

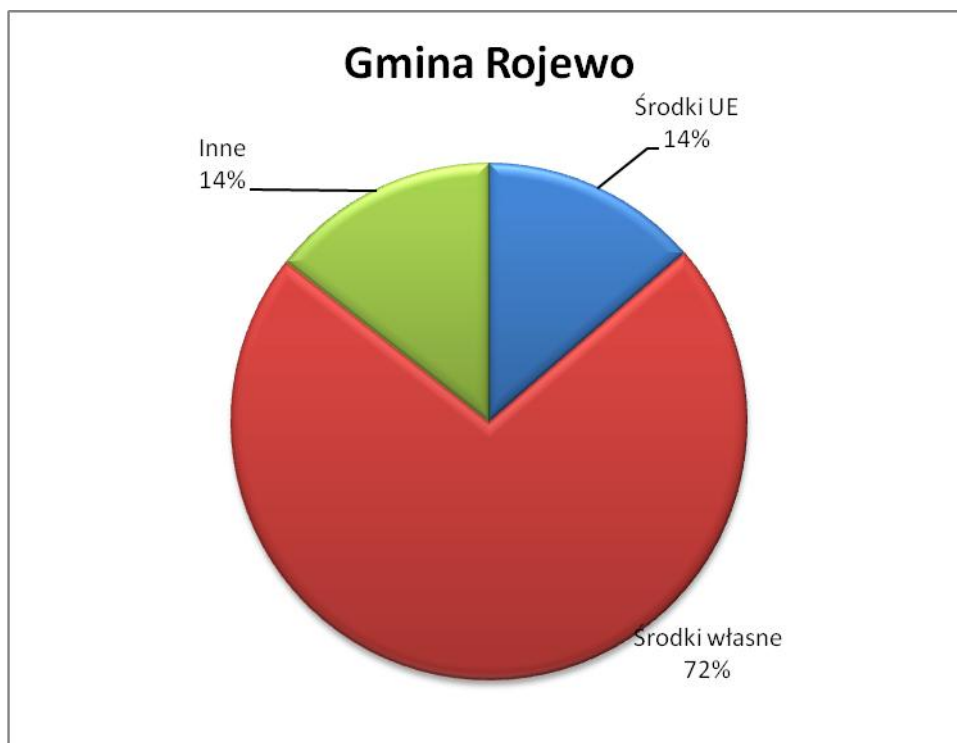


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 7

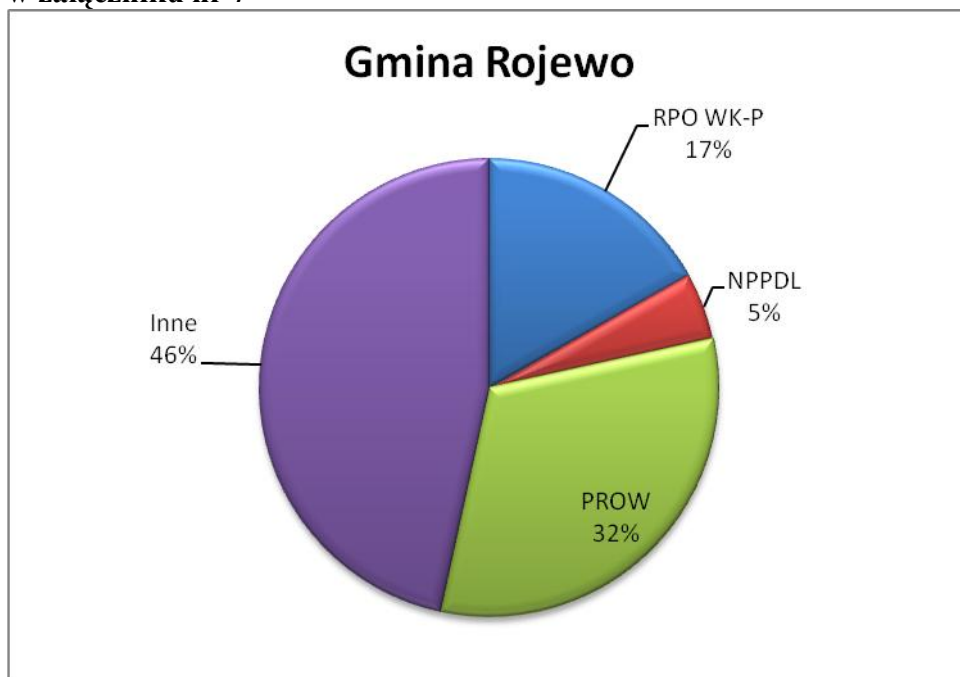

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 7

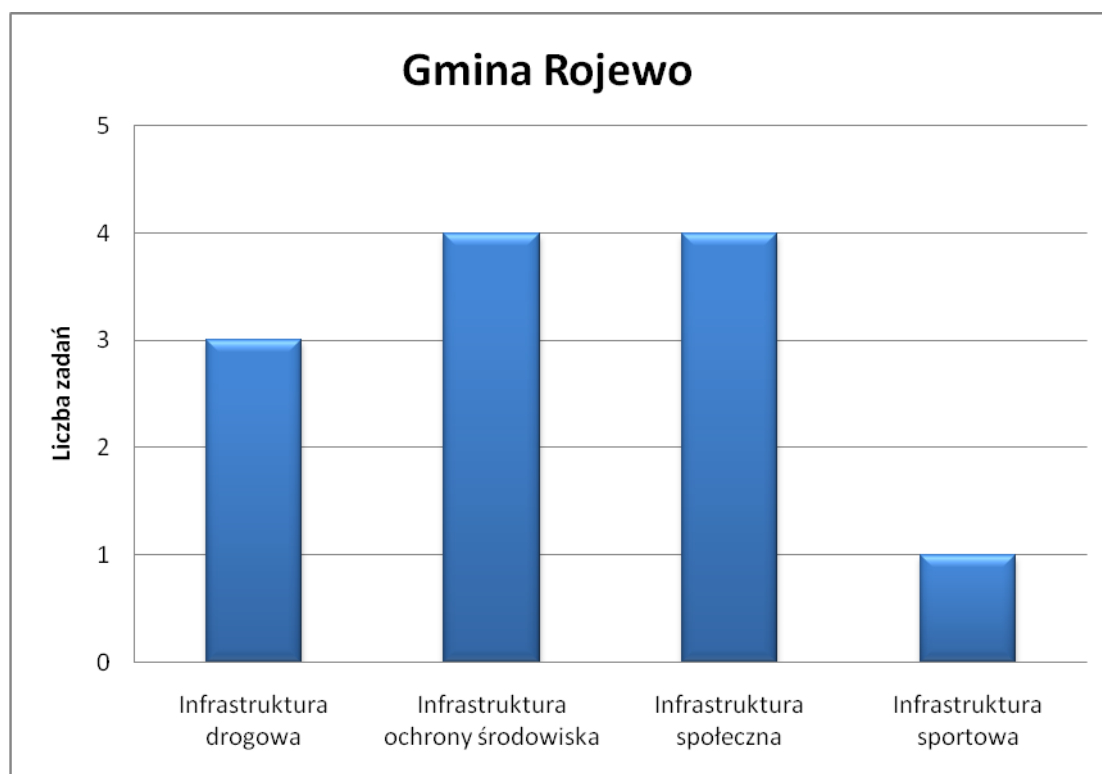

Źródło: opracowanie własne

Gmina Rojewo**Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa chodnika w miejscowości Rojewo	2011	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00 – budżet państwa	Zadanie zrealizowano w 100% ze środków własnych oraz budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Powierzchnia wybudowanego chodnika wyniosła 1823 m ² .
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jezuitska Struga	2008	741 293,87	359 422,93	381 870,94	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój Infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Długość przebudowanej drogi wyniosła 1234 mb.
3	Budowa parkingu w miejscowości Płonkowo	2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Rojewo	2008	2 032 885,20	-	2 032 885,20	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2009 r. W wyniku realizacji zadania wybudowano 4215,5 mb kanalizacji grawitacyjnej, 4721 mb kanalizacji tłocznej, 98 szt. przyłączy, 16 szt. przepompowni ścieków. Łącznie projektem objęto 610 osób.
2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Liszkowo	2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
3	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	2008-2012	686 206,69	403 890,00	282 316,69	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów

							Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W ramach zadania wybudowano w pięciu miejscowościach 55 przyzgodowych oczyszczalni ścieków.
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Ściborze	2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Topola, Liszkowo, Dobiesławice	2008	247 433,92	122 622,38	124 811,54	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2009 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Liczba wyremontowanych i doposażonych świetlic wiejskich: 3 szt.
2	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Liszkowice, Płonkowo	2012	-	-	-	-	Zadanie dotychczas nie zostało zrealizowane.
3	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ściborze, zagospodarowanie i uporządkowanie parku	2009	248 534,54	152 787,62	95 746,92	-	Zadanie zrealizowano w zakresie remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nie zrealizowano uporządkowania parku. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezuicka Struga	2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Rojewie	2010	3 444 056,96	-	2 451 056,96	993 000,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki	Zadanie zrealizowano w 100% ze środków własnych oraz budżetu państwa. W ramach zadania wybudowano 1 obiekt sportowy.
