

**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu  
Inowrocławskiego na lata 2008-2015**


**Załącznik nr 3 – Gmina Kruszwica**

**Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 3**

| <b>Źródła finansowania</b> | <b>Kwota w PLN</b> |
|----------------------------|--------------------|
| Koszty całkowite           | 19 275 130,37      |
| Środki UE                  | 6 566 647,72       |
| Środki własne              | 7 088 499,48       |
| Inne                       | 5 619 983,18       |


*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców*

**Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 3  
w ujęciu procentowym**

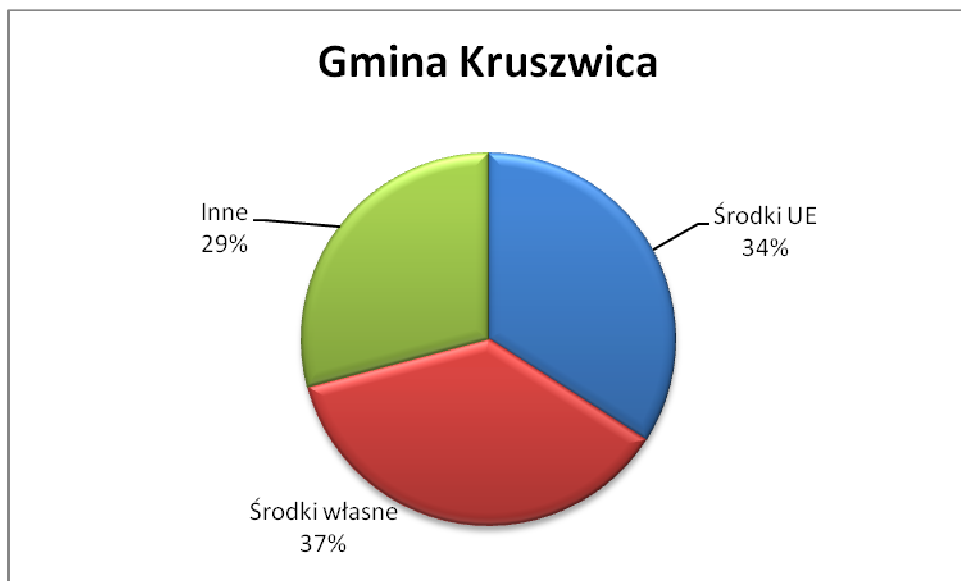


*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców*

**Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 3**

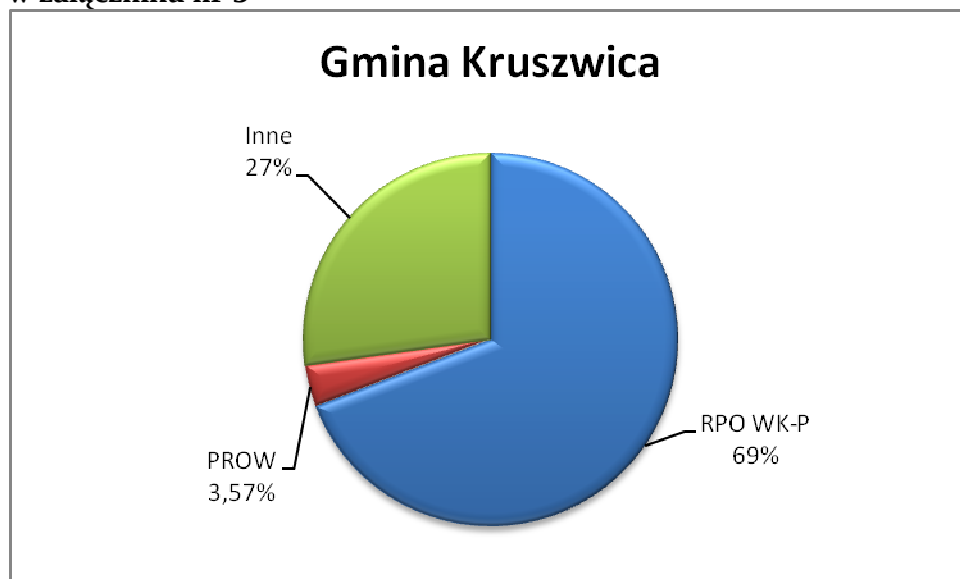

Źródło: opracowanie własne

**Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 3**

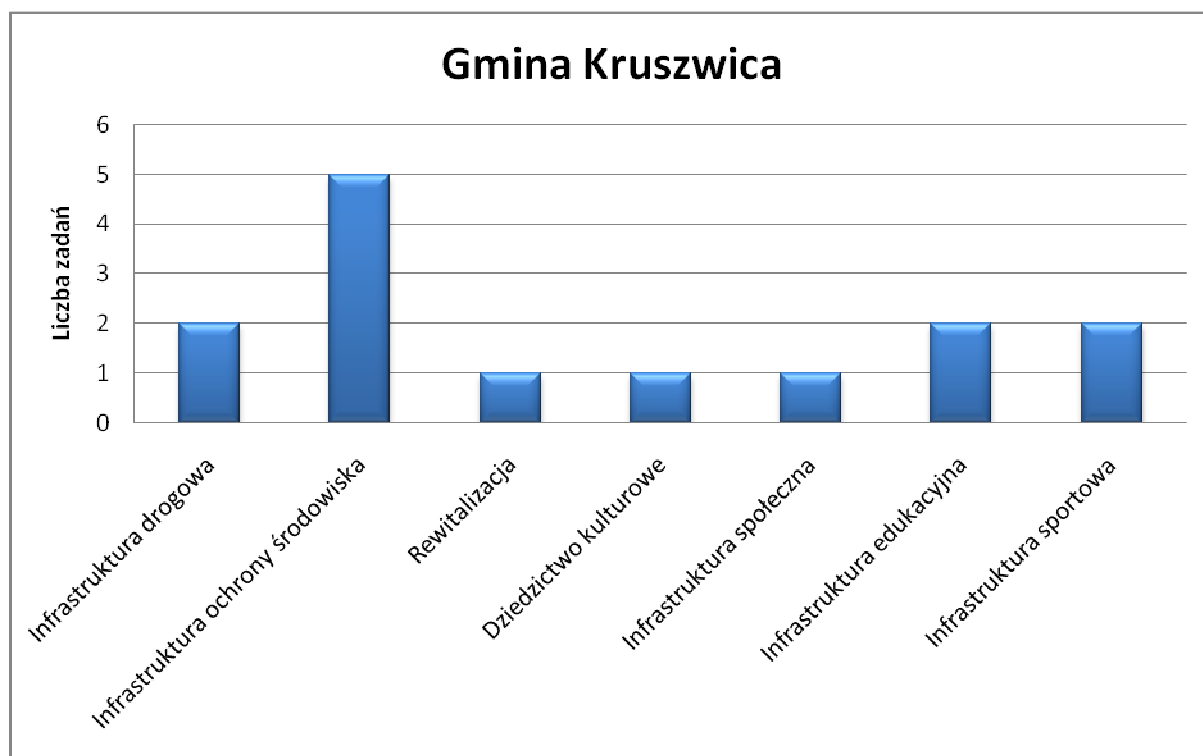

Źródło: opracowanie własne

**Gmina Kruszwica****Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa**

| Lp | Nazwa zadania                                                   | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |           |               |                                                | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 |             | Koszty całkowite                           | Środki UE | Środki własne | Inne                                           |                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej we wsi Kraszyce | 2008        | 136 105,98                                 | -         | 96 105,98     | 40 000,00<br>- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | Zadanie zrealizowano w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie koszty inwestycji. Przebudowano 1000 mb drogi metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na szerokości 4-4,5 m. |
| 2  | Przejazd do wsi Szarlej z Szosy Tryszczyńskiej                  | 2011-2013   | -                                          | -         | -             | -                                              | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.            |

**Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska**

| Lp | Nazwa zadania                                                                                         | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |            |               |                                                                                        | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |             | Koszty całkowite                           | Środki UE  | Środki własne | Inne                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Przebudowa sieci wodociągowej dla wsi Chełmce, Karsk, Mietlica, Ostrowo, Witowice, Złotowo            | 2010-2011   | -                                          | -          | -             | -                                                                                      | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.                                 |
| 2  | Budowa sieci kanalizacyjnej Bachorce, Chełmce, Chełmiczki, Grodztwo, Rusinowo, Sławsk Wielki          | 2010-2015   | 1 053 595,53                               | 322 566,00 | 431 750,04    | 299 279,49<br>- pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wybudowano 1859,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodztwo. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. |
| 3  | Budowa sieci kanalizacyjnej Kobylnica, Karsk, Witowice                                                | 2011-2015   | -                                          | -          | -             | -                                                                                      | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.                                 |
| 4  | Budowa sieci wodociągowej dla wsi Janowice, Kobylniki, Przedbojewice, Rożniaty, Sławsk Wielki, Żemiki | 2012-2015   | 61329,73                                   | -          | 61 329,73     | -                                                                                      | Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wybudowano 289 mb sieci wodociągowej w miejscowości Janowice.                                                                                                       |
| 5  | Przebudowa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków                                             | 2010-2012   | 6 245 953,25                               | -          | 1 631 249,57  | 2 118 749,44<br>- pożyczka                                                             | Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.                                                                                                                                      |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                              |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej<br>2 495 954,25<br>- środki Spółki Wodno-Ściekowej w Kruszwicy |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Obszar tematyczny: **Rewitalizacja**

| Lp | Nazwa zadania                   | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |           |               |      | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |             | Koszty całkowite                           | Środki UE | Środki własne | Inne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy | 2009        | 16 000,00                                  | -         | 16 000,00     | -    | Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy”. Dotychczas wykonano koncepcję projektu Rewitalizacji Rynku w Kruszwicy. Ze względu na przedłużające się konsultacje społeczne, zadanie będzie zrealizowane w późniejszym terminie niż pierwotnie planowano. |

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

| Lp | Nazwa zadania                                                                                              | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |              |               |      | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            |             | Koszty całkowite                           | Środki UE    | Środki własne | Inne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu | 2008-2011   | 10 633 364,65                              | 6 244 081,72 | 4 389 282,93  | -    | Zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. W 2012 r. planuje się wykonanie dodatkowych prac polegających na usunięciu zniszczeń powstałych wskutek powodzi obejmujących przebudowę ścieżek rowerowych. |

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

| Lp | Nazwa zadania                      | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |           |               |      | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                        |
|----|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    |             | Koszty całkowite                           | Środki UE | Środki własne | Inne |                                                                                                                                               |
| 1  | Budowa budynku mieszkań socjalnych | 2008-2010   | -                                          | -         | -             | -    | Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane. Będzie realizowane w latach 2012 – 2013 pod nazwą „Budowa budynku mieszkań socjalno-komunalnych” |

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

| Lp | Nazwa zadania                                                                             | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |           |               |                                                                      | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |             | Koszty całkowite                           | Środki UE | Środki własne | Inne                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej | 2011-2012   | -                                          | -         | -             | -                                                                    | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.                                            |
| 2  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy       | 2011 - 2012 | 1 128 781,23                               | -         | 462 781,23    | 666 000,00 - budżet państwa, budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Zadanie zostało zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy”. W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach programu: „Moje Boisko – Orlik 2012”. |

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

| Lp | Nazwa zadania                                 | Harmonogram | Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł |           |               |      | Informacja o stanie realizacji zadania                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |             | Koszty całkowite                           | Środki UE | Środki własne | Inne |                                                                                                                                                                                   |
| 1  | Budowa boiska sportowego we wsi Sławsk Wielki | 2010-2011   | -                                          | -         | -             | -    | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny. |
| 2  | Budowa basenu na osiedlu Zagople              | 2011-2013   | -                                          | -         | -             | -    | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny. |
