



Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 1 – Powiat Inowrocławski

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 1

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	126 447 851,79
Środki UE	45 613 145,41
Środki własne	55 936 722,68
Inne	24 897 983,70


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 1 w ujęciu procentowym

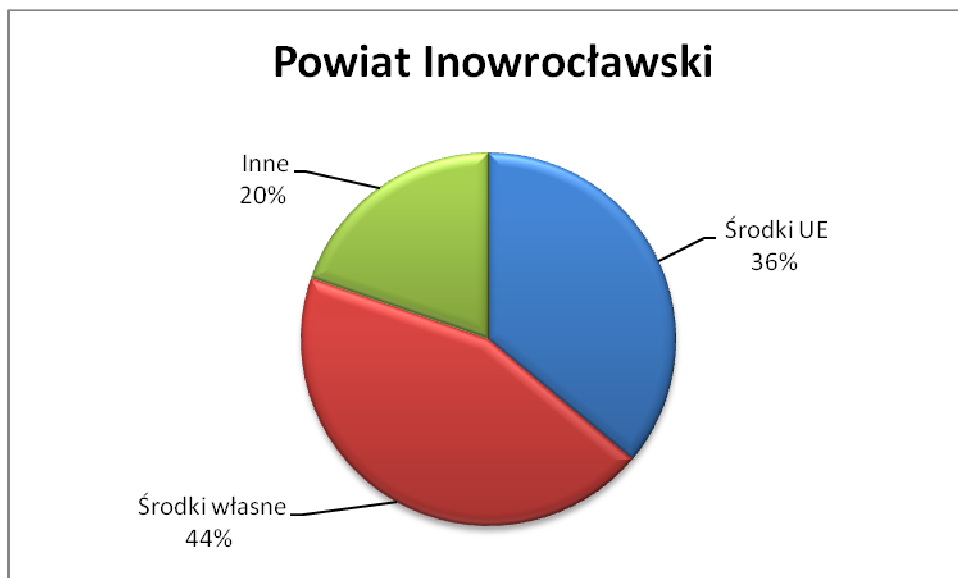


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 1

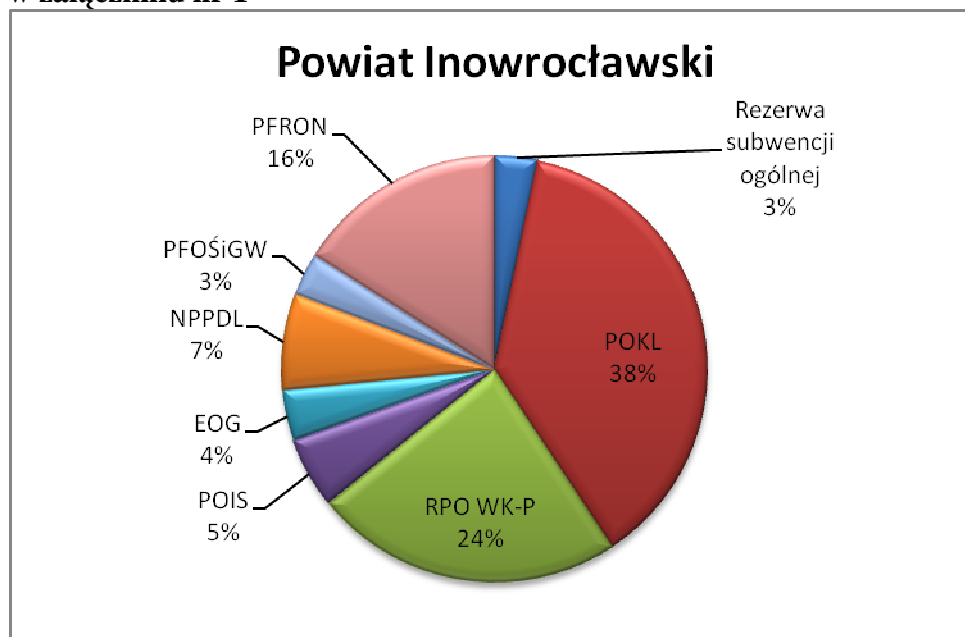

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 1

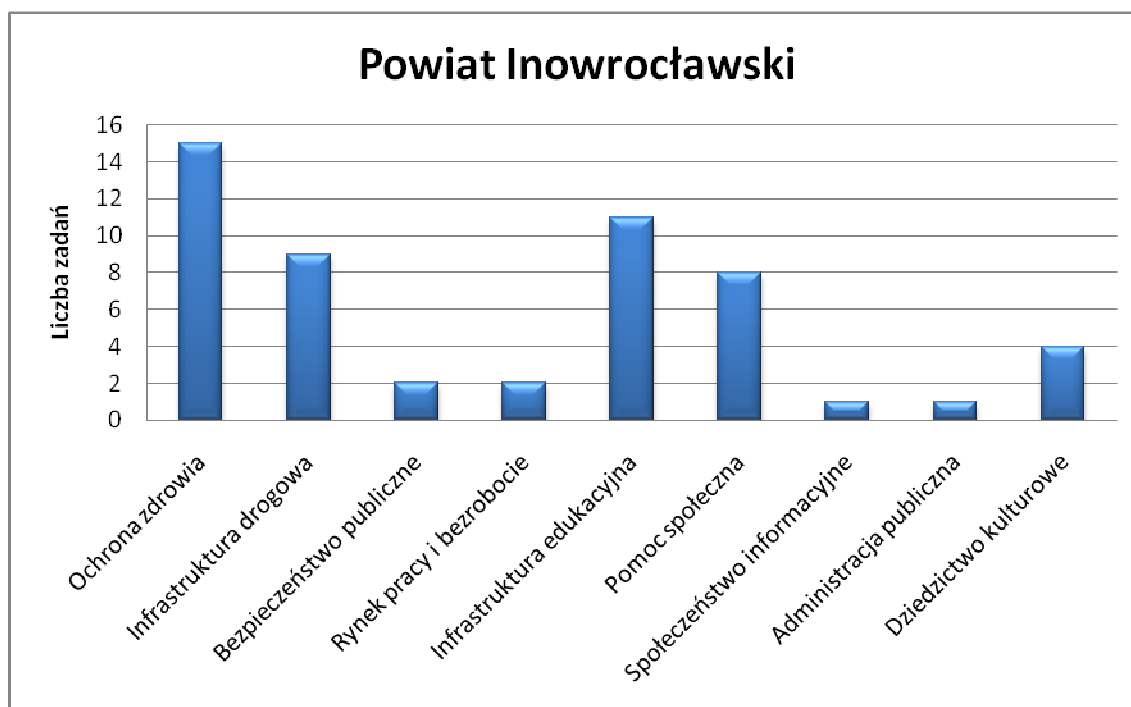

Źródło: opracowanie własne

Powiat Inowrocławski
Obszar tematyczny: **Ochrona zdrowia**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	2008-2009	4 736 050,12	2 258 018,07	2 478 032,05	-	Zadanie zrealizowano w całości jako Indywidualny Projekt Kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zadanie zakończono w 2010 r.
2	Budowa Pawilonu Psychiatrycznego na 25 łóżek + 15 „łóżek dziennych”	2010-2011	52 600	-	52 600	-	W ramach zadania wykonany został program funkcjonalno-użytkowy (listopad 2011 r.).
3	Modernizacja Bloku Operacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2010-2012	60 270	-	60 270	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową dla zadania.
4	Zakup szesnastorzędownego tomografu komputerowego	2009	4 417 525,16	2 620 969,00	1 400 000,00	396 556,16	Zadanie zostało zrealizowane. W 2010 r. zakupiono 64-rzędowy tomograf komputerowy w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
5	Zakup mammografu	2009	309 000	-	309 000	-	Zadanie zrealizowano w 2008 r.
6	Modernizacja Oddziału Położniczego, Noworodkowego i traktu porodowego szpitala powiatowego jako element projektu pn. „Kompleksowy program poprawy jakości w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym na terenie powiatu inowrocławskiego”	2008-2010	13 400	-	13 400	-	Dotychczas wykonano dokumentację projektową dla zadania. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach pierwszego naboru Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Oś priorytetowa 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Z uwagi na wyczerpanie dostępnej w ramach programu alokacji projekt nie uzyskał dofinansowania.
7	Zwiększenie dostępności usług Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2007-2010	4 631 859,09	3 715 430,05	916 429,04	-	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W 2011 r. zakończono realizację zadania 1 w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do

	poprzez likwidację barier architektonicznych Zadanie 1 – Modernizacja podjazdu do izby przyjęć Zadanie 2 – Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część internistyczna) Zadanie 3 – Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii i części Bloku Operacyjnego		78 474 54 120	- -	78 474 54 120	- -	świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Zadania 2 i 3 są w trakcie realizacji, opracowano dokumentację techniczną.
8	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Rehabilitacji w celu stworzenia nowego, kompleksowego Oddziału Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego	2007-2008	71 900	-	71 900	-	Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. W 2007 r. i 2011 r. wykonano dokumentację projektową.
9	Przebudowa zakładu mikrobiologii	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane.
10	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Kardiologii w celu utworzeniu pracowni hemodynamiki	2009-2010	230 300	-	230 300	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2009 r. uruchomiono pracownię hemodynamiki.
11	Utworzenie ośrodka endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w Inowrocławiu	2009-2010	218 310,95	-	218 310,95	-	Zadanie zrealizowano w całości w 2011 r.
12	Utworzenie Stacji Przygotowania i Dezynfekcji Łóżek	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
13	Kompleksowy program podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2008-2013	17 690	-	17 690	-	Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy zostali przeszkoleni w następującym zakresie: w 2009 r. <ul style="list-style-type: none"> • Kurs audytora wewnętrznego SZJ zgodnego z ISO 9001 : 2008 (60 osób), • Mobbing w pracy (550 osób), • Czas pracy pracowników służby zdrowia (46 osób). w 2011 r. <ul style="list-style-type: none"> • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych SZJ (24 osoby).
14	Wzrost kwalifikacji zawodowych personelu medycznego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2008-2013	27 300	-	27 300	-	Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych personel medyczny został objęty następującymi szkoleniami:

							<p>w 2009 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpieczeństwo pacjenta (129 osób), • Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia (101 osób), <p>w 2011 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkolenie FAST dla lekarzy dyżurnych SOR (28 osób).
15	Program szczepień 12-latek z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	2008-2010	3 175 214,21	-	213 777,87 - budżet Powiatu Inowrocławskiego 283 785,12 - budżety gmin	2 677 651,22 - środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)	<p>Zadanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień 2009 r. – kwiecień 2011 r. Celem projektu była ochrona życia i poprawa standardu życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie raka szyjki macicy. W ramach programu zaszczepiono 2 190 dziewczynek, tj. 94,5% populacji dziewczynek z roczników 1995, 1996, 1997, 1998 z terenu powiatu inowrocławskiego, wykonano 6 539 zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na dziewczynkę), udzielono 6 539 bezpośrednich porad profilaktycznych oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym: przeprowadzono 24 spotkania informacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci objętych szczepieniami, w których wzięło udział 2471 osób, zorganizowano 4 konferencje szkoleniowo-informacyjne, utworzono stronę internetową projektu, wyemitowano 48 audycji radiowych, 154 audycji i spotów telewizyjnych oraz wydano 25200 szt. materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, foldery). W wyniku realizacji projektu 6680 kobiet, zostało zachęconych do wykonania badania cytologicznego.</p>

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami	2008-2009	4 455 118,00	-	2 227 559,00	2 227 559,00 - rezerwa	Zadanie zostało zrealizowane w 50% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Zakończono

	inżynierskimi – II oraz III etap		1 762 548,28		1 762 548,28	subwencji ogólnej budżetu państwa	II etap obejmujący przebudowę mostu drogowego w miejscowości Gorzany. W ramach trzeciego etapu planowanej inwestycji wykonano dokumentację projektową. Zmodernizowano odcinek drogi o długości 3,8 km. W ramach remontu wykonano warstwę profilową, ułożono geosiatkę z włókna szklanego. Ponadto wykonano profilowanie poboczy i zjazdów oraz przełożenie zjazdów z kostki betonowej do wysokości nowej nawierzchni.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo – Kruszwica	2009-2010	1 591 659,88	-	1 591 659,88	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 C Cierpice – Rojewo – Inowrocław	2009-2010	4 020 380,95	-	2 010 190,48	2 010 190,47 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
4	Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic: al. Kopernika nr 3404C, Roosevelta nr 3415C, al. Niepodległości nr 3410C	2009-2012	7 456 799,02	-	7 456 799,02	-	Zostały zrealizowane dwa z trzech etapów inwestycji, co stanowi 85 % zaawansowania prac. Przebudowana została droga powiatowa nr 3410C w ciągu al. Niepodległości w Inowrocławiu i droga nr 3415C w ciągu ul. Roosevelta w Inowrocławiu. Wykonany zakres zadania jest zgodny z planowanym. W ramach trzeciego etapu planowanej inwestycji wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.
5	Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic: Świętokrzyskiej nr 3421C i Szymborskiej nr 3419C w Inowrocławiu	2005-2010	9 450 089,38	-	5 875 089,38	3 000 000,00 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 575 000,00 - Miasto Inowrocław	Inwestycja została zrealizowana w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Zadanie zrealizowano wraz z przebudową ulicy Wierzbińskiego.

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego miasta Janikowa	2009-2012	34 965 299,32	12 647 979,10	18 553 975,56	3 763 344,66	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Zadanie zostało podzielone na dwie inwestycje:	
			20 855 447,51	6 664 379,10	10 427 723,75	3 763 344,66	-budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – projekt kluczowy zrealizowany przez Gminę Janikowo w 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa w trybie indywidualnym.
			14 109 851,81	5 983 600,00	8 126 251,81	-		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły – projekt zrealizowany przez Powiat Inowrocławski w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa w trybie konkursowym.
7	Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do stadionu do skrzyżowania z ul. Stare Miasto	2009	53 070,00	-	53 070,00	-	Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie. Dotychczas wykonano dokumentację projektową, nie podjęto prac projektowych. W wyniku przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonywanej na zlecenie Miasta Inowrocławia, została wykonana warstwa ścieralna nawierzchni.	
8	Przebudowa ulicy Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego	2009-2010	1 802 109,90	-	1 802 109,90	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.	
9	Przebudowa ulicy Jacewskiej odcinek od ulicy Działowej do ulicy Bursztynowej w Inowrocławiu	2009-2010	122 610,00	-	122 610,00	-	Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie. Dotychczas wykonano dokumentację projektową. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2013-2015.	

Obszar tematyczny: **Bezpieczeństwo publiczne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Srodki UE	Srodki własne	Inne	
1	Budowa spójnego systemu teleinformatycznego w powiatowym systemie ratowniczym w zakresie	2008-2010	32 508,06	-	22 730,00 - budżet Powiatu Inowrocławskiego	9 778,06 - budżet Komendy	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania utworzono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej

	gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych oraz dysponowania siłami i środkami systemu a także utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego					Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Straży Pożarnej na bazie Powiatowego Stanowiska kierowania Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. W ramach budowy spójnego systemu teleinformatycznego zakupiono i uruchomiono serwer wewnętrznej sieci lokalnej LAN w KP PSP w Inowrocławiu oraz serwer do obsługi Systemu Wspomagania Decyzji SWD-ST.
2	Modernizacja bazy sprzętowej (pojazdy i urządzenia ratownicze) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	2007-2015	1 073 900	-	303 000 - budżet Powiatu	690 900 - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 80 000 - budżet Miasta Inowrocławia	Zadanie realizowane jest jako ciągle. W ramach zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zakupiła samochód operacyjny marki Chevrolet Cruze oraz samochód specjalny marki Man z podnośnikiem – SH-25. Planowane jest również pozyskanie: zestawu ratownictwa techniczno- chemiczno-ekologicznego, który składa się z samochodu ciężkiego ratownictwa techniczno-ekologicznego oraz przyczepy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Obszar tematyczny: Rynek pracy i bezrobocie

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Aktywizacja zawodowa młodzieży	2008-2013	20 068 137,30	12 601 651,17	7 466 486,13	-	Zadanie ma charakter ciągły, realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> – usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi przez polskie i unijne prawo; w wyniku tych działań pracę podjęło 7786 osób (w tym 3910 kobiet) w wieku do 25 roku życia, – projekt systemowy pn. „Praca naszym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali następujące wsparcie: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymały 5653 osoby (w tym 3421 kobiet), z czego 2409 osób (w tym 1470 kobiet) w wieku do 25 roku życia zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
2	Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu	2008-2013	15 130 747,49	11 425 973,11	3 704 774,38	-	Zadanie ma charakter ciągły, realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> – usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi przez

aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych							<p>polskie i unijne prawo,</p> <ul style="list-style-type: none"> - planowanie rozwoju zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania tworzonego wspólnie przez osobę bezrobotną oraz doradcę zawodowego, pośrednika pracy i innych pracowników urzędu, - prowadzenie poradnictwa grupowego, - projekt systemowy pn. „Praca naszym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali następujące wsparcie: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymały 5653 osoby bezrobotne (w tym 3421 kobiet), w tym 2138 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 1430 kobiet).
--	--	--	--	--	--	--	---

Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w celu rozwijania kształcenia ponadgimnazjalnego sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku	2008-2013	1 391 741,75	-	1 030 558,95	361 182,80 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania dotychczas wykonano: remont i adaptację pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych na pracownię zajęć praktycznych i laboratorium (2008 r.), remont budynku warsztatowego (2009 r.), remont pomieszczeń do nauki zawodu (2010 r.). W 2011 r. wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń magazynowych na pracownię wielozadaniową ze stanowiskiem do napraw pojazdów samochodowych. W latach 2008-2012 dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby praktycznej nauki zawodu.
2	Budowa stadionu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane
3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	2012-2014	380 103,08	-	380 103,08	-	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wybudowano wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: budowę boiska do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną, dwóch mini boisk do koszykówki, boiska do piłki siatkowej oraz boiska do gry w tenisa ziemnego, zamontowanie oświetlenia oraz kamery obrotowej.
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	2011-2012	341 750,54	-	341 750,54	-	Zadanie zostało zrealizowane.

	nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu						
5	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	2009	286 596,18	-	30 469,22	256 126,96 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano docieplenie ścian i dachu sali gimnastycznej oraz malowanie ścian i cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej.
6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	2009-2010	-	-	-	-	Z uwagi na brak dostępnych środków finansowych odroczone realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	2012	65 143,21	-	14 895,13	50 248,08 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2010 r. została wymieniona stolarka okienna, natomiast w 2011 r. wykonano termomodernizację ściany szczytowej.
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu	2009-2010	270 000,00	-	-	270 000,00 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Z uwagi na brak dostępnych środków finansowych odroczone realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	2009-2010	648 781,40	-	88 781,40	560 000,00 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Inwestycja została zrealizowana w całości w 2011 r. i obejmowała trzy etapy: 1. Termomodernizację łącznika i sali gimnastycznej. 2. Termomodernizację budynku szkoły. 3. Wymianę stolarki okiennej drewnianej na wykonaną z PCV.
10	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 – Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu	2011-2012	523 124,91	-	109 721,08	413 403,83 - Powiatowy Fundusz Ochrony	Inwestycja została zrealizowana w całości.

						Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	
11	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu	2009-2010	399 999,21	-	399 999,21	-	Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zakup instalacji systemów zabezpieczeń przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
2	Modernizacja Domu Rodziny Jana Kasprówicza w Szymborzu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
3	Konserwacja zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
4	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	2009-2010	838 334,79	628 751,09	209 583,70	-	Ze względu na fakt, iż budynek III Liceum Ogólnokształcącego objęty jest ścisłym nadzorem konserwatorskim nie jest możliwe wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych tradycyjnymi metodami (styropian, powłoka tynkowa). W 2011 r. wymienione zostały okna w ramach projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez modernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Obszar tematyczny: **Pomoc społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Wsparcie zadania w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	działania ciągłe	11 405 161,00	-	389 346,00	11 015 815,00	Zadania realizowano jako ciągłe, w ramach zadań ustawowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie”, wdrażanego w latach 2008-2011 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
2	Pomoc w adaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy osób niepełnosprawnych		1 391 384,08	1 245 032,07	146 352,01	-	
3	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie – rozbudowa filii w Parchaniu	2008-2010	4 494 044,26	2 640 516,86	1 853 527,40	-	Projekt został zrealizowany w okresie od września 2010 r. do grudnia 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Uchwałą Nr XIII/128/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu został przekształcony

							w Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu. W wyniku realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu osiągnął wymagane prawem standardy.
4	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie – rozbudowa budynku mieszkalnego filii w Tarnówku	2008-2010	3 129 896,35	2 034 432,63	1 095 463,72	-	Projekt został zrealizowany w okresie od września 2009 r. do listopada 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Uchwałą Nr XLII/415/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku. W wyniku realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku osiągnął wymagane prawem standardy i otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 grudnia 2010 r.).
5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny przy ul. Krzywoustego w Inowrocławiu	2009-2010	17 009,38	-	17 009,38	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wymieniono część okien w budynku socjalnym. Pozostało do wymiany 20% okien oraz ocieplenie ścian. Zakres zadania zmniejszył się do obszaru małego budynku (socjalnego). Nieruchomość podzielono na trzy niezależne części.
6	Termomodernizacja w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	2009-2010	413 321,67	-	413 321,67	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Sporządzono niezbędną dokumentację projektową.
7	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2009-2010	303 572,12	-	-	303 572,12 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.
8	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku	2009-2010	387 653,95	-	387 653,95	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Termomodernizacją objęto następujące budynki Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku: <ul style="list-style-type: none"> • budynek socjalno-mieszkalny, • budynek administracyjno-mieszkalny, • budynek pralni i suszarni. Termomodernizacji poddano ściany i dachy ww. budynków, które docieplono za pomocą styropianu. Elewacje zewnętrzne budynków zostały pomalowane. Na dachach położono nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Wymieniono również stare rynny.

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego ePowiat Inowrocławski	2008-2009	12 500,00	-	12 500,00	-	<p>Inwestycja nie została zrealizowana w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na odwołanie konkursu, w ramach którego planowano pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektu. Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie ze środków budżetu Powiatu. Unowocześniono infrastrukturę telekomunikacyjną urzędu (zakup komputerów, serwerów, urządzeń sieciowych) oraz wdrożono podpis elektroniczny.</p> <p>Powiat przystąpił jako partner do projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2. - Rozwój usług i aplikacji dla ludności.</p>

Obszar tematyczny: **Administracja publiczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników wszystkich jednostek administracji publicznej na terenie powiatu inowrocławskiego	2008-2015	524 190,31	458 771,36	65 418,95	-	<p>Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1.07.2009 r. do 31.12.2010 r. w ramach projektu pn. „Urzednicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo. Zakres rzeczowy projektu obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie szkoleń ogólnych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, - przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie: Budżet zadaniowy, Rachunkowość budżetowa, Prawo Zamówień Publicznych, Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek pozyskania funduszy unijnych, Studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Przygotowanie inwestycji zgodnie

								z procedurami FIDIC, Gospodarka nieruchomościami, Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, Uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii.
--	--	--	--	--	--	--	--	--
