



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowrocławskiego na lata 2008-2015**


Załącznik nr 4 - Gmina Gniewkowo

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 4

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	44 894 152,92
Środki UE	16 338 906,94
Środki własne	24 495 976,58
Inne	4 059 269,40


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

**Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 4
w ujęciu procentowym**

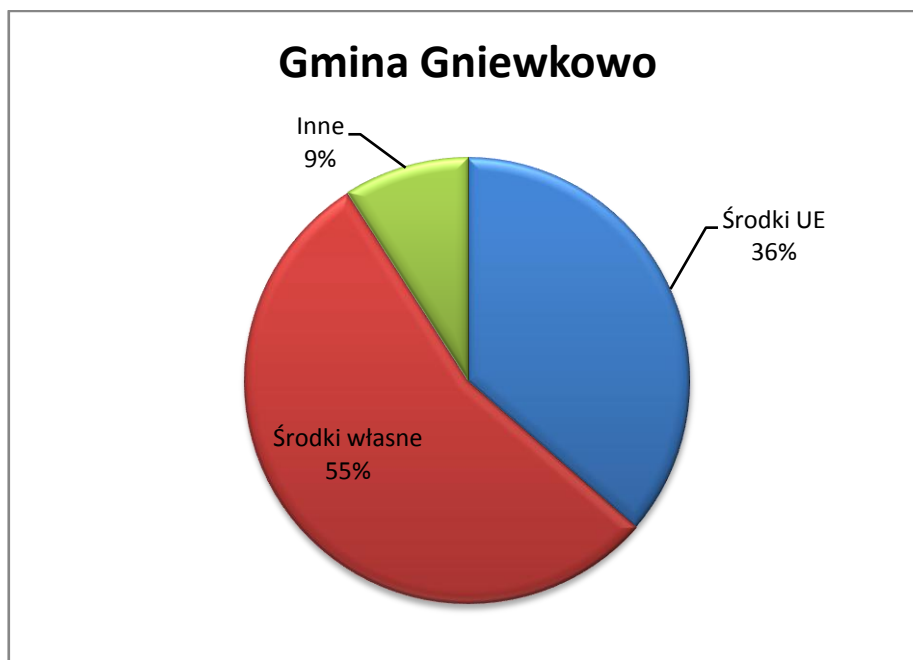


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 4

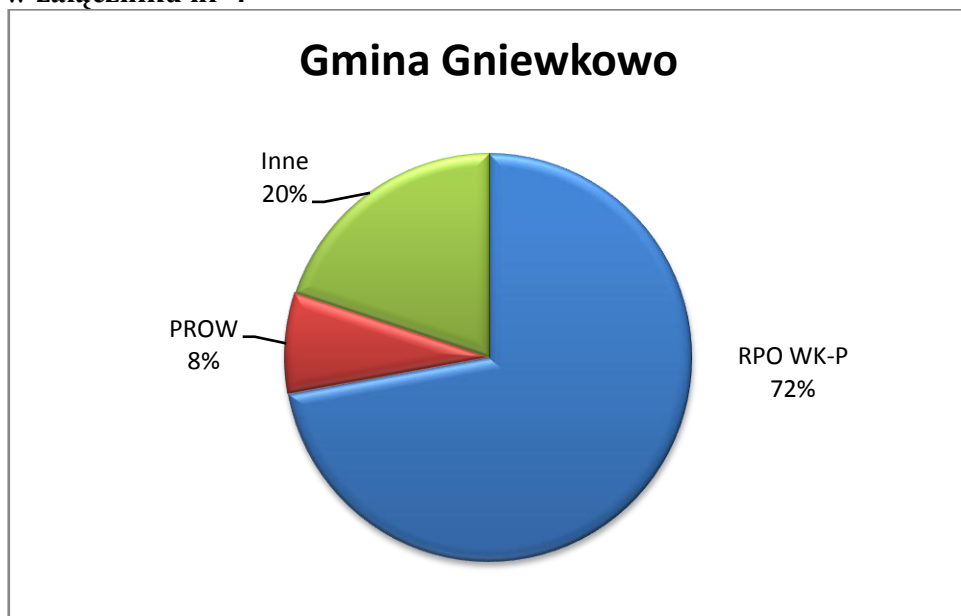

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 4

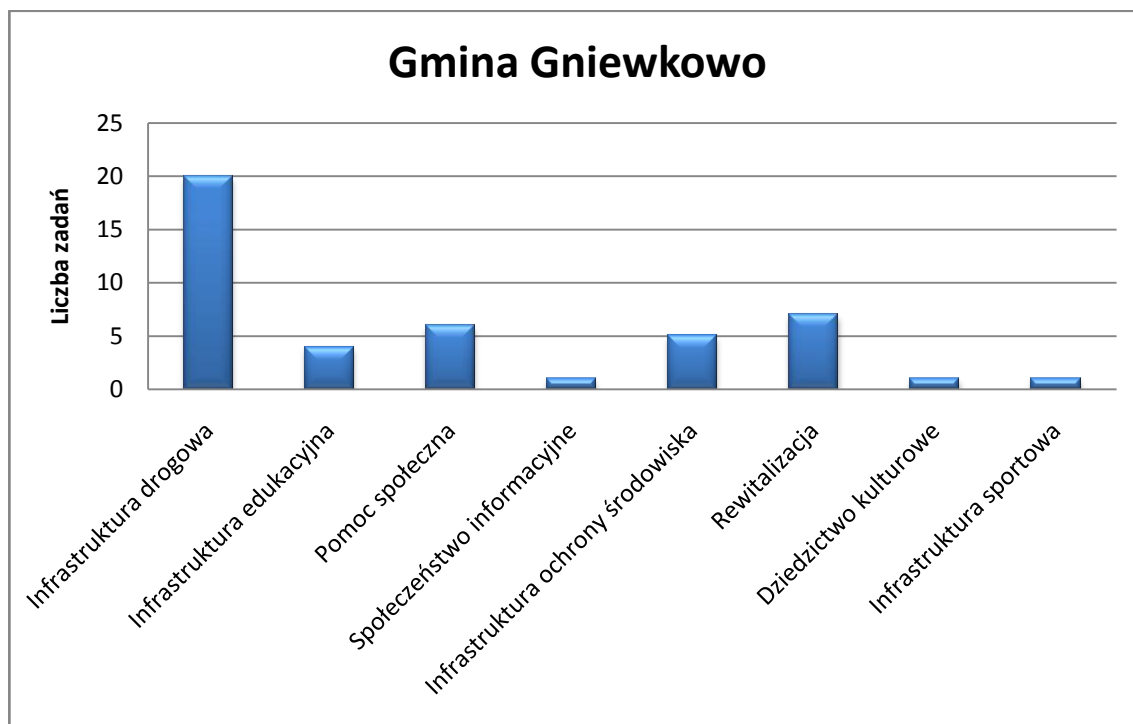

Źródło: opracowanie własne

Gmina Gniewkowo
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Modernizacja drogi gminnej Suchatówka – Kijewo – Warzyn	2008	1 501 568,08	-	1 430 768,08	70 800,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Zadanie zostało zrealizowane w 2009 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 3,5 km z utwardzonymi poboczami i zjazdami, chodnikami i oznakowaniem drogi.
2	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezerze-Suchatówka (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 2 i zadanie nr 8)	2008-2010	1 701 093,61	-	1 591 093,61	90 000,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 20 000,00 - Nadleśnictwo Gniewkowo	Zadanie zrealizowano w 2010 r. w ramach połączonych zadań 2 i 8 w ramach projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej Zajezerze-Suchatówka i Zajezerze-Perkowo”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 3 km z utwardzonymi poboczami i zjazdami oraz oznakowaniem drogi. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu agroturystyki, budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo	2008	1 058 604,99	-	717 171,26	341 433,73 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Zadanie zrealizowano w III etapach w latach 2008-2010. Wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej na odcinku o dł. 3,2 km i szer. 2 m.
4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Suchatówka-Gniewkowo	2008	655 797,81	-	410 429,34	245 368,47 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Zadanie zrealizowano w 2010 r. Wykonano ścieżkę rowerową na odcinku 1,1 km i szer. 2 m.
5	Budowa nawierzchni z kostki ul. Działkowców w Gniewkowie	2008	698 554,40	-	698 554,40	-	Zadanie zrealizowano w 100% zgodnie z planem. Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o dł. 500 m i szer. 5 m z oznakowaniem.

6	Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
7	Budowa nawierzchni z kostki ul. Kwiatowej w Gniewkowie	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
8	Modernizacja drogi gminnej Zajezerze-Perkowo (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezerze-Suchatówka”)	2010-2011	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w 2010 r. w ramach połączonych zadań 2 i 8 w ramach projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej Zajezerze-Suchatówka i Zajezerze-Perkowo”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 1,5 km z pobocznymi, zjazdami i oznakowaniem drogi. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu agroturystyki, budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
9	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierchosławice	2010-2011	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
10	Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 10,11,12 oraz zadanie nr 20)	2010	1 199 844,77	-	1 199 844,77	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina”. Zamierzony cel został osiągnięty, wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni o dł. 400 m z przebudową chodników na ulicy 17 Stycznia. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
11	Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 10 „Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie”)	2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 200 m i przebudowano chodniki na ulicy Moniuszki. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.

12	Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 10 „Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie”)	2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 200 m z przebudową chodników na ulicy Chopina. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
13	Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie	2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
14	Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie	2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
15	Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie	2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
16	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie	2011	184 000,00	-	184 000,00	-	Zadanie zrealizowano w 2010 r. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o dł. 100 m wraz z chodnikiem. W 2009 r. zmieniono nazwę ulicy z ul. Polnej na ul. Księstwa Gniewkowskiego.
17	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie	2011	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
18	Modernizacja nawierzchni Osiedla Toruńskiego w Gniewkowie	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
19	Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie	2012	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
20	Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 10 „Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie”)	2012	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o dł. 200 m z przebudową chodnika na ulicy Wałowej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie i budowa stacji uzdatniania wody	2008-2010	20 077 718,93	13 019 622,02	7 058 096,91	-	Zadanie zostało zrealizowane pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie”. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Inwestycja została zrealizowana częściowo. W 2010 r. została otwarta nowa Stacja Uzdatniania Wody w Gniewkowie. Stara stacja uzdatniania wody powstała na początku lat 90. Oparta była na technologii z lat 60. Obecnie stacja posiada nową halę filtrów z dwustopniową filtracją składającą się z areatora i pięciu filtrów pionowych na każdym poziomie. Ostatnim etapem technologii jest dezynfekcja wody z wykorzystaniem promieni UV. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków planowana jest na 2013 r.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka-Gniewkowo	2009-2010	1 993 870,26	1 225 739,00	768 131,26	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r. W 2010 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo-Gniewkowo	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zostało zrealizowane w 2009 r. w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo przez Gminę

							Rojewo. W ramach zadania wybudowano 7 km sieci kanalizacyjnej, powstało 98 przyłączy. Zadanie nie zostało zrealizowane w miejscowości Gniewkowo.
5	Kanalizacja deszczowa w Gniewkowie	2008-2012	1 185 372,69	-	297 001,97	888 370,72 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie zostało zrealizowane w 100%, zgodnie z planem. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: Dworcowej, Sobieskiego i Kościelnej w Gniewkowie.

Obszar tematyczny: Rewitalizacja

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji) (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 1,2,3,5,6,7)	2008-2012	8 204 612,57	1 693 545,92	6 511 066,65	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6,7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 700 m z przebudową chodników i budową kanalizacji deszczowej na ulicy Dworcowej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wsparcie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.

2	Modernizacja ulicy Sobieskiego w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)”	2008	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 300 m z przebudową chodników i budową kanalizacji deszczowej na ulicy Sobieskiego. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
3	Modernizacja nawierzchni Rynku w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)”	2008	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 400 m z przebudową chodników na Rynku. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
4	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Rynku z przyległymi ulicami	2008-2010	-	-	-	-	Inwestycja planowana jest w 2012 r.

5	Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)”	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 330 m z przebudową chodników i budową kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
6	Modernizacja nawierzchni ul. Zamkowej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)”	2009	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku”. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 140 m. na ulicy Zamkowej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
7	Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy	2009	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku”. W wyniku realizacji zadania

	Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)”						wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 70 m. na ulicy Podgórznej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
--	---	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Turystyka Historyczna - Księstwo Gniewkowskie	2008-2010	190 524,27	-	-	35 000,00 - budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 000,00 - budżet Powiatu Inowrocławskiego 135 524,27 - środki prywatne	Zadanie realizowane jest poprzez m.in. coroczne obchody „Dni Księstwa Gniewkowskiego” na przełomie maja i czerwca, które obejmują: imprezy, spotkania i koncerty o tematyce historycznej. Dotychczas wydano folder oraz uruchomiono stronę internetową www.ksiestwogniewkowskie.com.pl. W 2011 r. wykonano pomnik Księcia Władysława Białego, usytuowany na Rynku w Gniewkowie. Zmieniono także nazwę ulicy przylegającej do Rynku z ul. Polnej na ul. Księstwa Gniewkowskiego, przy której już wkrótce zostanie wybudowana podświetlana imitacja zabytkowego wiatraka widoczna z drogi krajowej nr 15. Jedyńm zabytkiem z czasów Księstwa jest Kościół p.w. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie. Gmina Gniewkowo realizuje wiele działań wspierających rozwój turystyki historycznej poprzez działania infrastrukturalne: ścieżki rowerowe, elementy małej architektury, budowę skwerów i terenów rekreacyjnych.

Obszar tematyczny: Społeczeństwo informacyjne

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego	2008-2010	15 000,00	-	15 000,00	-	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	2008	546 212,92	-	202 740,88	343 472,04 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie zrealizowano w latach 2008-2009. Ocieplono ściany, wymieniono okna i drzwi. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku.
2	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012”	2008	1 320 097,34	-	654 097,34	333 000,00 - Urząd Wojewódzki 333 000,00 - budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowa na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkovo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkovo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. Zadanie wpisuje się również w Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

4	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie	2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
---	---	------	---	---	---	---	-----------------------------------

Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego Walcerzewice I	2008	1 119 136,33	-	804 876,50	314 259,83 - Bank Gospodarstwa Krajowego/Fundusz dopłat	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono dach, zamontowano stolarkę budowlaną, położono instalację przez co zmniejszyły się koszty eksploatacyjne budynku; wzrósł standard mieszkań oraz wartość rynkowa nieruchomości.
2	Budowa świetlicy w Zajezierzu (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 2 i zadanie nr 6)	2008-2009	756 356,12	400 000,00	356 356,12	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 2 i 6 w ramach projektu pn. „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezierzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3	Remont budynku Pałacu w Markowie	2008-2010	200 000,00	-	-	200 000,00 - Agencja Nieruchomości Rolnych	Zadanie zostało zrealizowane. Na budynku pałacu wykonano kapitalny remont wejścia głównego w zakresie konstrukcji wiatrołapu oraz przeprowadzono częściową naprawę konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego. Do kompleksu budynku przynależy także świetlica, w której przeprowadzono modernizację – instalacja c. o., wymianę tynków, podwieszane stropy, ubikacje, pomieszczenie kuchenne oraz wymieniono okna i drzwi.
4	Budowa budynku mieszkalnego Walcerzewice II	2008-2010	1 798 001,14	-	1 258 960,80	539 040,34 - Bank Gospodarstwa Krajowego/Fundusz dopłat	Zadanie zrealizowano w latach 2010-2011 jako zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego Lipie”. W ramach zadania wybudowano 20 mieszkań, w tym 10 dwupokojowych o powierzchni 59,10 m oraz 10 jednopokojowych o powierzchni 42,10 m. W budynku zamontowano ogrzewanie centralne z kotłowni oraz przyłącze kanalizacyjne do kolektora ściekowego i oczyszczalni ścieków.

5	Budowa centrum rekreacji na ul. Piasta w Gniewkowie	2008-2009	487 786,69	-	337 786,69	150 000,00 - Bank Gospodarstwa Krajowego/Ministerstwo Sportu i Turystyki	Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku realizacji zadania powstał rekreacyjny teren służący mieszkańcom do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Obiekt posiada przebudowane chodniki, wielofunkcyjne boisko sportowe, stawek z pomostem i ozdobnymi rybkami oraz największy w mieście plac zabaw.
6	Budowa świetlicy w Kawęczynie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 2 „Budowa świetlicy w Zajezerzu”)	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 2 i 6 w ramach projektu pn. „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezerzu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Euroboisko – modernizacja stadionu MLKS UNIA w Gniewkowie	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
