Załącznik do uchwały
nr XXV/256/2012
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

listopad, 2012 r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp 3
II. Metodologia 5
III. Informacja o realizacji zadań 6
IV. Podsumowanie 8
Bibliografia 12
Wyjaśnienie skrótów 12

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Powiat Inowrocławski
2. Załącznik nr 2 – Miasto Inowrocław
3. Załącznik nr 3 – Gmina Kruszwica
4. Załącznik nr 4 – Gmina Gniewkowo
5. Załącznik nr 5 – Gmina Pakość
6. Załącznik nr 6 – Gmina Janikowo
7. Załącznik nr 7 – Gmina Rojewo
8. Załącznik nr 8 – Gmina Dąbrowa Biskupia
9. Załącznik nr 9 – Gmina Złotniki Kujawskie
10. Załącznik nr 10 – Gmina Inowrocław
11. Załącznik nr 11 – inne organizacje

I. WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 został przyjęty uchwałą nr XVI/156/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2008 r. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., „politykę rozwoju na szczeblu lokalnym prowadzą samorząd powiatowy i gminny".

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym, uwzględniającym założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz odnowionej Strategii Lizbońskiej. Został opracowany z inicjatywy Powiatu Inowrocławskiego we współpracy ze wszystkimi samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego, organizacjami pozarządowymi, kościołami, instytucjami kultury, instytucjami oświatowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami jako dokument zintegrowany z uwzględnieniem zasady partnerstwa na każdym etapie: wdrażania, monitorowania i oceny. Stanowi podstawowy mechanizm realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007-2015 oraz strategii poszczególnych samorządów uczestniczących w tworzeniu niniejszego dokumentu.

W latach 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójności. W ramach przyznanych Polsce z budżetu UE środków w kwocie około 67,3 mld euro, nasz kraj realizuje strategiczne priorytety dotyczące rozwoju poprzez 21 programów: pięć programów krajowych i szesnaście regionalnych (po jednym w każdym z 16 regionów). Największy program krajowy to Infrastruktura i Środowisko, finansowany kwotą 28 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Drugi, co do wielkości Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zakładający inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to blisko 10 miliardów euro, z tego 2/3 środków przypada na tzw. komponent regionalny.

Pozostałe programy krajowe, wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to: Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – 8,25 mld euro, Europejska Współpraca Terytorialna – 731 mln euro oraz PO Pomoc Techniczna (PO PT) 516,7 mln. Ponad 16,5 miliarda euro to środki dostępne w ramach szesnastu programów regionalnych. Regionalny

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 to środki strukturalne w wysokości ponad 951 mln euro.

Obecnie Polska jest liderem w zakresie wykorzystania środków europejskich. Wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski jest pozytywny. Oddziałują one w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, aktywność inwestycyjną i rynek pracy w Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarki. Prognozowany wpływ polityki spójności na rozwój Polski w latach 2013-2015 r. ma być jeszcze silniejszy, na co wskazują wnioski płynące z badań nad wpływem funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, prowadzonych cyklicznie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Fundusze UE powodują również wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Wynika to nie tylko z wielkości środków do wykorzystania, lecz również z kumulacji efektów wdrażania kolejnych programów.

Polska sprawnie wykorzystała środki już w pierwszych latach realizacji perspektywy finansowej 2007-2013. Fundusze z obecnej perspektywy nadal będą w najbliższych latach pozytywnie oddziaływać na gospodarkę, poprawiając jej konkurencyjność. Tym samym łączny poziom PKB będzie znacznie wyższy niż w sytuacji, gdyby Polska nie była beneficjentem funduszy europejskich. Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich tempo wzrostu PKB w 2011 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok. 0,5-0,9 pp., a poziom PKB (w cenach bieżących) był wyższy o od 4,2 proc. do nawet 7,2 proc. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski dzięki środkom z funduszy europejskich sprawia, że w coraz większym stopniu pomagają one zmniejszyć dystans rozwojowy między Polską a UE. Prognozuje się, że w 2011 r. różnica w poziomie PKB Polski na mieszkańca w stosunku do UE-27 była dzięki funduszom mniejsza o od 1,6 pp. do 4,3 pp., a w 2015 r. ma być mniejsza o od 3,0 pp. do 5,7 pp., dzięki czemu Polska ma szansę osiągnąć poziom PKB per capita wynoszący ok. 70 proc. średniej unijnej.

Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, iż do końca trzeciego kwartału 2012 r. Polska rozdzieliła 222,2 mld zł z funduszy europejskich, czyli 78,5 proc. środków dostępnych na lata 2007-13. Łącznie we wszystkich programach prognoza wydatków poświadczonych do Komisji Europejskiej została wykonana w 112 proc., co stanowi kwotę ponad 39 mld zł. Na dobry rezultat osiągnięty na koniec III kwartału br., wpływ miały przede wszystkim wyniki Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Wydatki zaplanowane w największym programie w historii UE zrealizowano na poziomie 112 proc., natomiast w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przekroczyły założoną prognozę, realizując plan w 132 proc.

Według badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Instytut Badań Strukturalnych, sumaryczna wartość całkowitych bezpośrednich i pośrednich korzyści uzyskanych przez kraje UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce 2007-2015 to 87,63 mld zł (ceny stałe z 2008r.) prognozowane na pełen okres 2004-15, czyli 24,9 mld euro, co stanowi 30 proc. łącznej wartości środków przepływających do Polski w ramach polityki spójności UE w latach 2004-15.

W 2011 r. województwo kujawsko-pomorskie otrzymało dodatkowe środki z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania w kwocie 36 432 854 euro do dotychczasowego budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 8 616 447 euro z dostosowania technicznego.

II. METODOLOGIA

Niniejsza informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 została przygotowana w ramach prowadzonego monitoringu postępu rzeczowego i finansowego zadań ujętych w przedmiotowym dokumencie w oparciu o dane wnioskodawców poszczególnych zadań z uwzględnieniem ich harmonogramu, wykonania planu finansowego oraz stopnia zaawansowania realizowanych inwestycji.

Treść załączników została zaakceptowana przez każdego z wnioskodawców. Opracowanie prezentuje zadania, które mają w perspektywie do 2015 r. przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego objętego Planem Rozwoju Lokalnego tj. powiatu i poszczególnych gmin i innych wnioskodawców oraz poprawy m.in.: środowiska naturalnego, systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, warunków i jakości życia mieszkańców powiatu inowrocławskiego i stanowią odpowiedź na problemy zidentyfikowane w analizie SWOT przedmiotowego dokumentu.

Zgodnie z przyjętą metodologią opracowania dokumentu, monitoring realizacji Planu przeprowadzono we współpracy Powiatu Inowrocławskiego z samorządami gminnymi i innymi wnioskodawcami, których zadania ujęto w niniejszym dokumencie. Integralną częścią opracowania jest jedenaście załączników, które prezentują zadania zgłoszone przez poszczególne podmioty do realizacji w latach 2008-2015. Każdy z załączników przedstawia stan realizacji zadań, harmonogram pierwotnie planowany, rzeczywiste koszty realizacji w ujęciu kosztów całkowitych, środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych w poszczególnych obszarach tematycznych. Wysokość rzeczywistych kosztów

realizacji inwestycji określono na podstawie zweryfikowanych i podanych przez wnioskodawców wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów, okresowego lub końcowego rozliczenia inwestycji w oparciu o środki przekazane przez Instytucje Zarządzające / Pośredniczące lub inne finansujące w zależności od specyfiki poszczególnych programów.

W podsumowaniu każdego z załączników zaprezentowano wykonanie planu finansowego zadań zrealizowanych w okresie objętym monitoringiem w liczbach całkowitych oraz w ujęciu procentowym z uwzględnieniem: środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych.

W formie graficznej przedstawiono również dla każdego załącznika strukturę procentową zewnętrznych źródeł w finansowaniu poszczególnych zadań oraz obszary tematyczne zadań, które określają priorytety wnioskodawców.

III. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ

W ramach monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 zweryfikowano jego komplementarność z dokumentami programowymi, strategicznymi szczebla regionalnego, krajowego a także dokumentami opracowywanymi na poziomie europejskim. Dotychczas zrealizowane zadania, ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne z następującymi dokumentami:

- Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
- Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia dla Polski na lata 2007-2013,
- Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty dla okresu 2007-2013,
- Odnowioną Strategią Lizbońską,
- Regionalnym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
- Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
- Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W okresie 2008-2012 realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego była finansowana z następujących źródeł: środków własnych poszczególnych wnioskodawców, środków europejskich, w tym Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), środków strukturalnych Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz innych środków zewnętrznych: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Rezerwy Subwencji Ogólnej, dla której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków samorządów przekazywanych w ramach tzw. konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki współfinansowaniu ze środków strukturalnych UE najwięcej zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zrealizowano w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w komponencie centralnym i regionalnym, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Leader.

Poziom dofinansowania w poszczególnych programach i osiach priorytetowych był zróżnicowany i wymagał od wnioskodawców wygenerowania wkładu własnego na poziomie od 15 do 50 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 najwięcej projektów zrealizowano w trybie konkursowym, m.in. w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i kultury. Cennym wsparciem dla miast powiatu inowrocławskiego były środki w ramach Osi Priorytetowej 7. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, które pozwoliły na przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych. Zgodnie z przyjętym algorytmem podziału środków zaproponowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P największe wsparcie w wysokości 85 proc. uzyskały miasta 5-15 tys. mieszkańców, 80 proc. – miasta 15-20 tys. mieszkańców, 75 proc. – dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz 70 proc. dla miasta Inowrocławia. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w komponencie centralnym i regionalnym zrealizowano najwięcej projektów w trybie systemowym w obszarze edukacji, przeciwdziałania bezrobociu oraz integracji społecznej

i przeciwdziałania marginalizacji grup słabszych oraz podnoszenia kwalifikacji administracji publicznej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę konkursów dla samorządów na finansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego poszerzono o dodatkowe źródła zewnętrzne dostępne dla samorządów, m.in. w ramach finansowanych z budżetu państwa: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 oraz Rezerwy subwencji ogólnej.

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 zrealizowano nowatorski w skali kraju projekt partnerski pn. „Program szczepień 12-latek z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego".

W okresie objętym monitoringiem na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego zrealizowano łącznie 226 zadań. Przy udziale współfinansowania środków europejskich i strukturalnych UE zrealizowano łącznie 55 projektów, w tym w trybie: indywidualnym – 8, konkursowym – 40 oraz systemowym – 7.

Realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 została przedstawiona w formie informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań ujętych w jedenastu załącznikach.

IV. PODSUMOWANIE

Realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego w okresie objętym monitoringiem leży w gestii samorządów i innych podmiotów, jako wnioskodawców zaplanowanych zadań inwestycyjnych i była uzależniona od dostępnych środków europejskich i innych środków zewnętrznych oraz środków własnych.


Zadania zrealizowane przez poszczególne podmioty są zgodne z dokumentami planistycznymi i strategicznymi oraz planami inwestycyjnymi samorządów i innych wnioskodawców. W okresie objętym monitoringiem zrealizowano na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego z udziałem środków europejskich i innych środków zewnętrznych oraz środków własnych wnioskodawców projekty infrastrukturalne w następujących obszarach: infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury transportowej,

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, edukacji, turystyki, sportu oraz przeciwdziałania bezrobociu i integracji społecznej.

Plan Rozwoju Lokalnego został poszerzony o zadania z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W latach 2008-2012 wydatki inwestycyjne wszystkich wnioskodawców to łącznie kwota 444 120 623,47 zł, w tym środki UE to 156 239 692,20 zł. Poniższy diagram prezentuje wykonanie planu finansowego wszystkich zadań zrealizowanych w okresie objętym monitoringiem w ujęciu procentowym z uwzględnieniem: środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych.

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego w ujęciu procentowym

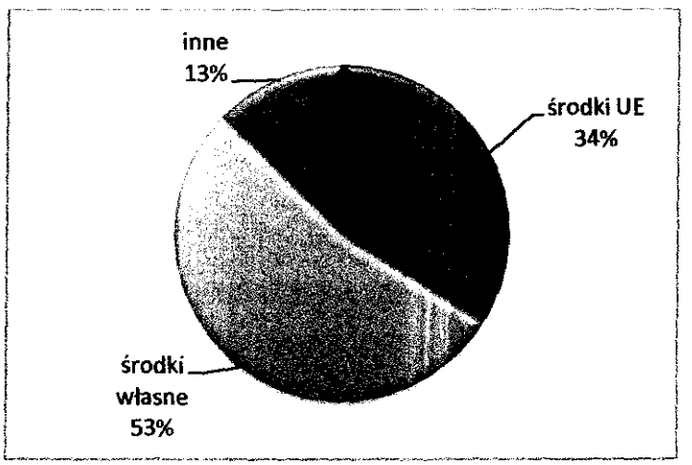

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

W latach 2008-2012 wydatki inwestycyjne Powiatu Inowrocławskiego to kwota 145 915,875 zł, z czego zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego opiewają na kwotę 126 447 851,79 zł. Zadania z udziałem środków UE, ujęte w Planie to kwota 45 613 145,41 zł.

Strategiczne zarządzanie rozwojem lokalnym prowadzone przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, jako inicjatora opracowania niniejszego dokumentu, współpraca z wnioskodawcami zadań oraz ich efektywne wdrożenie pozwoliły na wspólną realizację projektów partnerskich. W latach 2008-2012 na obszarze powiatu inowrocławskiego zrealizowano z inicjatywy Powiatu Inowrocławskiego następujące projekty partnerskie współfinansowane ze środków europejskich i strukturalnych UE:

1. **„Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego"** (projekt realizowany w latach 2009-2010 skierowany do 231 pracowników urzędów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Kruszwicą, Pakością, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem).
2. **„Zdobyć wiedzę – ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym"** (projekt realizowany w latach 2009-2010 w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Kruszwicą, Pakością, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem, Miastem Inowrocław, skierowany do 65 szkół oraz 6167 uczniów).
3. **„Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym"** (projekt realizowany w 2011 r. w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Kruszwicą, Pakością, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem, skierowany do 1100 chłopców i 1300 dziewcząt).
4. **„Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego"** (projekt realizowany w latach 2009-2011 r. w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Pakością, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem, Miastem Inowrocław skierowany do 2 190 dziewcząt z rocznika 1995, 1996, 1997, 1998 z terenu powiatu inowrocławskiego).

Efektywna realizacja projektów partnerskich w wymiarze instytucjonalnym, finansowym, merytorycznym pozwoliła na wypracowanie innowacji organizacyjnej i tzw. „dobrych praktyk", co zostało docenione przez kapituły wielu ogólnopolskich konkursów:

a. HIT 2010 za „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie ponad 100 km dróg kategorii powiatowej" w ramach konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujawsko-Pomorskiego, co stanowiło ewenement w skali kraju,

b. Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – za zarządzanie innowacyjnym projektem partnerskim z udziałem środków europejskich pn. „Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego",
c. Lider Wspierania Przedsiębiorczości 2010 roku, za wspieranie przedsiębiorczości dzięki projektom współfinansowanym ze środków europejskich i informowanie przedsiębiorców o dostępnych funduszach UE.

W ramach największego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2008-2012, w priorytecie XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, PS ZOZ w Inowrocławiu zrealizował z udziałem Powiatu Inowrocławskiego istotne dla poprawy poziomu jakości i życia mieszkańców powiatu projekty nie objęte Planem, tj. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu" oraz „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu".

Także z udziałem środków strukturalnych UE w trybie projektu systemowego uruchomiono na terenie powiatu inowrocławskiego trzy astrobazy, zlokalizowane przy: I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie oraz Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim i przy wsparciu partnerów: Powiatu Inowrocławskiego, gminy Kruszwica i gminy Gniewkowo.

Powiat Inowrocławski i samorządy gminne z terenu powiatu inowrocławskiego są również partnerami projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności w dwóch podstawowych obszarach: e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej.

Potwierdzeniem skuteczności modelu strategicznego zarządzania rozwojem zaproponowanego przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego jest podsumowanie opracowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota" Nr 42/1048 z 15 października 2011 r. rankingu samorządów polskich pod względem inwestycji w infrastrukturę techniczną ze środków własnych, w latach 2008- 2010, który wskazuje iż Powiat Inowrocławski jest Liderem, który z 290 miejsca w latach 2003-2005, zajmuje

2 miejsce w Polsce, co było możliwe dzięki bardzo dobrze prowadzonej polityce finansowej, redukcji kosztów prowadzenia jednostek powiatowych oraz pozyskanym funduszom zewnętrznym.

BIBLIOGRAFIA

1. Ewa Kusideł, Karolina Lewandowska-Gwarda, Ekspertyza dotycząca projekcji PKB per capita (wg PPS) na poziomie województw (NUTS-2) oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą konsekwencji ewentualnych zmian klasyfikacji NUTS dla polityki spójności po 2020 roku.
2. Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych.
3. Baza badań ewaluacyjnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW

RPO WK-P – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2012

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

POIS – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

NPPDL – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 1 – Powiat Inowrocławski

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 1

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	126 447 851,79
Środki UE	45 613 145,41
Środki własne	55 936 722,68
Inne	24 897 983,70


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 1 w ujęciu procentowym

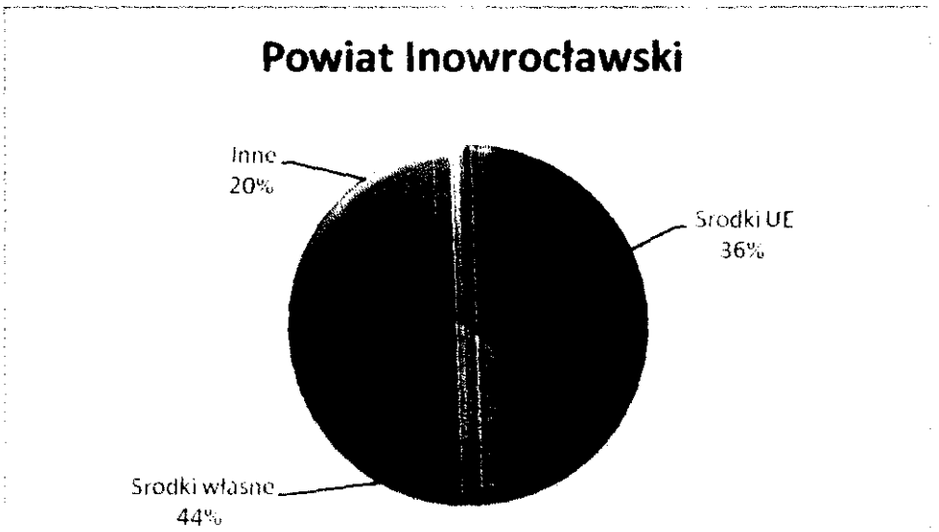


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 1

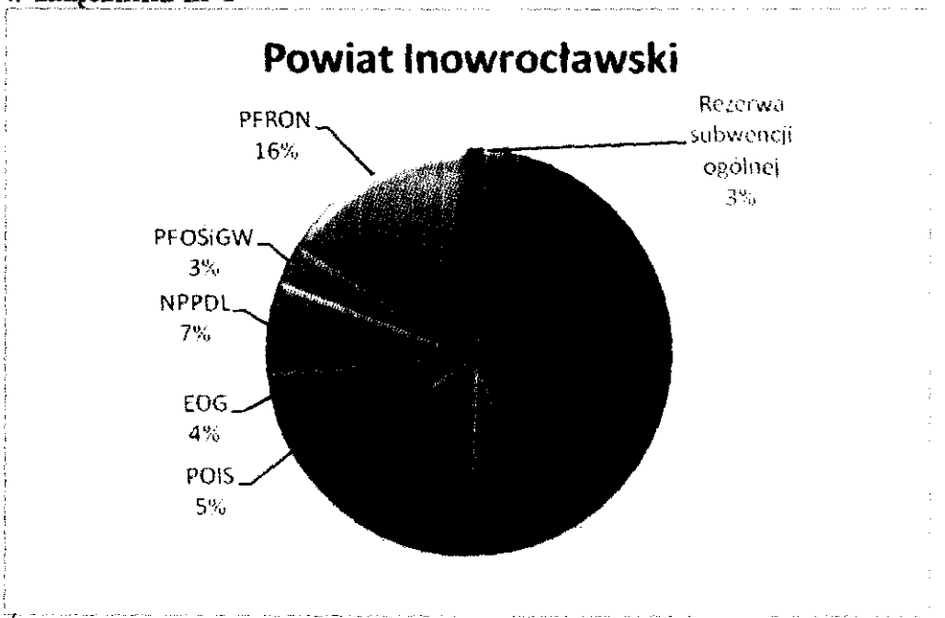

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 1

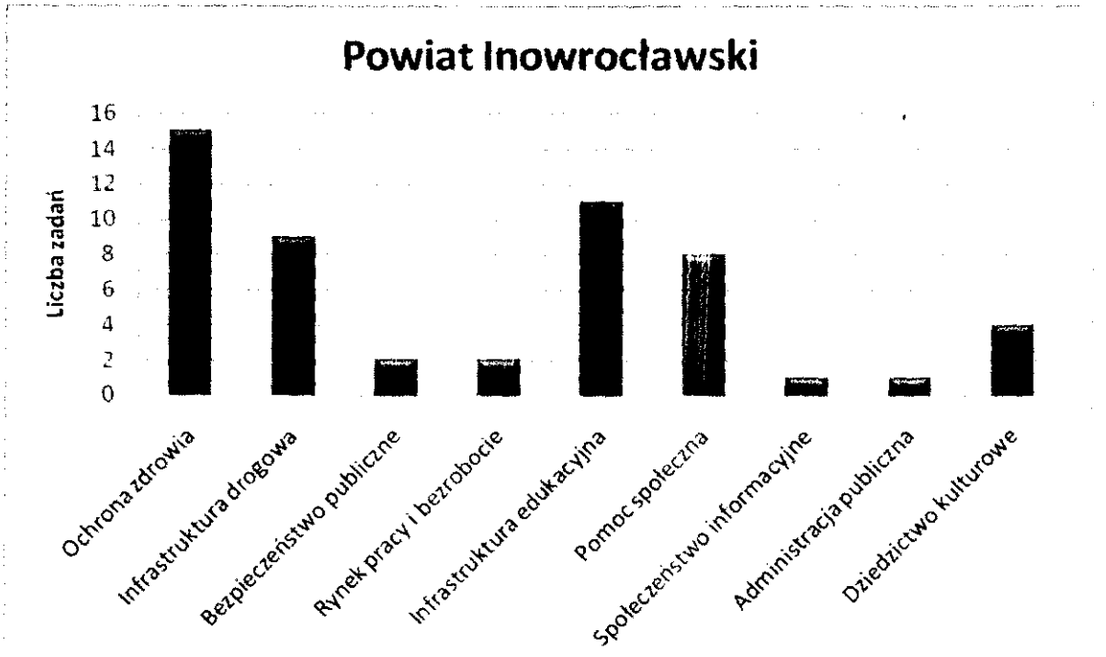

Źródło: opracowanie własne

Powiat Inowrocławski
Obszar tematyczny: **Ochrona zdrowia**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	2008-2009	4 736 050,12	2 258 018,07	2 478 032,05	-	Zadanie zrealizowano w całości jako Indywidualny Projekt Kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zadanie zakończono w 2010 r.
2	Budowa Pawilonu Psychiatrycznego na 25 łóżek + 15 „łóżek dziennych"	2010-2011	52 600	-	52 600	-	W ramach zadania wykonany został program funkcjonalno-użytkowy (listopad 2011 r.).
3	Modernizacja Bloku Operacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2010-2012	60 270	-	60 270	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano dokumentację projektową dla zadania.
4	Zakup szesnastorzędowego tomografu komputerowego	2009	4 417 525,16	2 620 969,00	1 400 000,00	396 556,16	Zadanie zostało zrealizowane. W 2010 r. zakupiono 64-rzędowy tomograf komputerowy w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
5	Zakup mammografu	2009	309 000	-	309 000	-	Zadanie zrealizowano w 2008 r.
6	Modernizacja Oddziału Położniczego, Noworodkowego i traktu porodowego szpitala powiatowego jako element projektu pn. „Kompleksowy program poprawy jakości w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym na terenie powiatu inowrocławskiego"	2008-2010	13 400	-	13 400	-	Dotychczas wykonano dokumentację projektową dla zadania. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach pierwszego naboru Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Oś priorytetowa 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. Z uwagi na wyczerpanie dostępnej w ramach programu alokacji projekt nie uzyskał dofinansowania.
7	Zwiększenie dostępności usług Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2007-2010	4 631 859,09	3 715 430,05	916 429,04	-	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W 2011 r. zakończono realizację zadania 1 w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do

	poprzez likwidację barier architektonicznych Zadanie 1 – Modernizacja podjazdu do izby przyjęć Zadanie 2 – Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część internistyczna) Zadanie 3 – Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii i części Bloku Operacyjnego		78 474 54 120	-	78 474 54 120	-	świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PS ZOZ w Inowrocławiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Zadania 2 i 3 są w trakcie realizacji, opracowano dokumentację techniczną.
8	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Rehabilitacji w celu stworzenia nowego, kompleksowego Oddziału Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego	2007-2008	71 900	-	71 900	-	Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. W 2007 r. i 2011 r. wykonano dokumentację projektową.
9	Przebudowa zakładu mikrobiologii	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane.
10	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Kardiologii w celu utworzeniu pracowni hemodynamiki	2009-2010	230 300	-	230 300	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2009 r. uruchomiono pracownię hemodynamiki.
11	Utworzenie ośrodka endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w Inowrocławiu	2009-2010	218 310,95	-	218 310,95	-	Zadanie zrealizowano w całości w 2011 r.
12	Utworzenie Stacji Przygotowania i Dezynfekcji Łóżek	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
13	Kompleksowy program podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2008-2013	17 690	-	17 690	-	Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy zostali przeszkoleni w następującym zakresie: w 2009 r. • Kurs audytora wewnętrznego SZJ zgodnego z ISO 9001 : 2008 (60 osób), • Mobbing w pracy (550 osób), • Czas pracy pracowników służby zdrowia (46 osób). w 2011 r. • Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych SZJ (24 osoby).
14	Wzrost kwalifikacji zawodowych personelu medycznego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	2008-2013	27 300	-	27 300	-	Zadanie zrealizowano częściowo. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych personel medyczny został objęty następującymi szkoleniami:

							w 2009 r. • Bezpieczeństwo pacjenta (129 osób), • Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia (101 osób), w 2011 r. • Szkolenie FAST dla lekarzy dyżurnych SOR (28 osób).
15	Program szczepień 12-latek z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	2008-2010	3 175 214,21	-	213 777,87 - budżet Powiatu Inowrocławskiego 283 785,12 - budżety gmin	2 677 651,22 - środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)	Zadanie zostało zrealizowane w okresie kwiecień 2009 r. – kwiecień 2011 r. Celem projektu była ochrona życia i poprawa standardu życia mieszkańców regionu poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej w zakresie raka szyjki macicy. W ramach programu zaszczepiono 2 190 dziewczynek, tj. 94,5% populacji dziewczynek z roczników 1995, 1996, 1997, 1998 z terenu powiatu inowrocławskiego, wykonano 6 539 zabiegów szczepienia (3 dawki szczepionki na dziewczynkę), udzielono 6 539 bezpośrednich porad profilaktycznych oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym: przeprowadzono 24 spotkania informacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci objętych szczepieniami, w których wzięło udział 2471 osób, zorganizowano 4 konferencje szkoleniowo-informacyjne, utworzono stronę internetową projektu, wyemitowano 48 audycji radiowych, 154 audycji i spotów telewizyjnych oraz wydano 25200 szt. materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, foldery). W wyniku realizacji projektu 6680 kobiet, zostało zachęconych do wykonania badania cytologicznego.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami	2008-2009	4 455 118,00	-	2 227 559,00	2 227 559,00 - rezerwa	Zadanie zostało zrealizowane w 50% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Zakończono

	inżynierskimi – II oraz III etap		1 762 548,28		1 762 548,28	subwencji ogólnej budżetu państwa	II etap obejmujący przebudowę mostu drogowego w miejscowości Gorzany. W ramach trzeciego etapu planowanej inwestycji wykonano dokumentację projektową. Zmodernizowano odcinek drogi o długości 3,8 km. W ramach remontu wykonano warstwę profilową, ułożono geosiatkę z włókna szklanego. Ponadto wykonano profilowanie poboczy i zjazdów oraz przełożenie zjazdów z kostki betonowej do wysokości nowej nawierzchni.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo – Kruszwica	2009-2010	1 591 659,88	-	1 591 659,88	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 C Cierpice – Rojewo – Inowrocław	2009-2010	4 020 380,95	-	2 010 190,48	2 010 190,47 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
4	Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic: al. Kopernika nr 3404C, Roosevelta nr 3415C, al. Niepodległości nr 3410C	2009-2012	7 456 799,02	-	7 456 799,02	-	Zostały zrealizowane dwa z trzech etapów inwestycji, co stanowi 85 % zaawansowania prac. Przebudowana została droga powiatowa nr 3410C w ciągu al. Niepodległości w Inowrocławiu i droga nr 3415C w ciągu ul. Roosevelta w Inowrocławiu. Wykonany zakres zadania jest zgodny z planowanym. W ramach trzeciego etapu planowanej inwestycji wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Inowrocławskiego na lata 2011-2014 inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.
5	Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic: Świętokrzyskiej nr 3421C i Szymborskiej nr 3419C w Inowrocławiu	2005-2010	9 450 089,38	-	5 875 089,38	3 000 000,00 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 575 000,00 - Miasto Inowrocław	Inwestycja została zrealizowana w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Zadanie zrealizowano wraz z przebudową ulicy Wierzbińskiego.

6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego miasta Janikowa	2009-2012	34 965 299,32	12 647 979,10	18 553 975,56	3 763 344,66	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Zadanie zostało podzielone na dwie inwestycje:
			20 855 447,51	6 664 379,10	10 427 723,75	3 763 344,66 -budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1. Budowa obwodnicy miasta Janikowa – projekt kluczowy zrealizowany przez Gminę Janikowo w 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa w trybie indywidualnym.
			14 109 851,81	5 983 600,00	8 126 251,81	-	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły – projekt zrealizowany przez Powiat Inowrocławski w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa w trybie konkursowym.
7	Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do stadionu do skrzyżowania z ul. Stare Miasto	2009	53 070,00	-	53 070,00	-	Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie. Dotychczas wykonano dokumentację projektową, nie podjęto prac projektowych. W wyniku przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonywanej na zlecenie Miasta Inowrocławia, została wykonana warstwa ścieralna nawierzchni.
8	Przebudowa ulicy Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego	2009-2010	1 802 109,90	-	1 802 109,90	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.
9	Przebudowa ulicy Jacewskiej odcinek od ulicy Działowej do ulicy Bursztynowej w Inowrocławiu	2009-2010	122 610,00	-	122 610,00	-	Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie. Dotychczas wykonano dokumentację projektową. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2013-2015.

Obszar tematyczny: **Bezpieczeństwo publiczne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa spójnego systemu teleinformatycznego w powiatowym systemie ratowniczym w zakresie	2008-2010	32 508,06	-	22 730,00 - budżet Powiatu Inowrocławskiego	9 778,06 - budżet Komendy	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania utworzono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej

	gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych oraz dysponowania siłami i środkami systemu a także utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego					Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	Straży Pożarnej na bazie Powiatowego Stanowiska kierowania Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. W ramach budowy spójnego systemu teleinformatycznego zakupiono i uruchomiono serwer wewnętrznej sieci lokalnej LAN w KP PSP w Inowrocławiu oraz serwer do obsługi Systemu Wspomagania Decyzji SWD-ST.
2	Modernizacja bazy sprzętowej (pojazdy i urządzenia ratownicze) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	2007-2015	1 073 900	-	303 000 - budżet Powiatu	690 900 - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 80 000 - budżet Miasta Inowrocławia	Zadanie realizowane jest jako ciągłe. W ramach zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zakupiła samochód operacyjny marki Chevrolet Cruze oraz samochód specjalny marki Man z podnośnikiem – SH-25. Planowane jest również pozyskanie: zestawu ratownictwa techniczno- chemiczno-ekologicznego, który składa się z samochodu ciężkiego ratownictwa techniczno-ekologicznego oraz przyczepy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Obszar tematyczny: **Rynek pracy i bezrobocie**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Aktywizacja zawodowa młodzieży	2008-2013	20 068 137,30	12 601 651,17	7 466 486,13	-	Zadanie ma charakter ciągły, realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu poprzez: – usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi przez polskie i unijne prawo; w wyniku tych działań pracę podjęło 7786 osób (w tym 3910 kobiet) w wieku do 25 roku życia, – projekt systemowy pn. „Praca naszym celem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali następujące wsparcie: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymały 5653 osoby (w tym 3421 kobiet), z czego 2409 osób (w tym 1470 kobiet) w wieku do 25 roku życia zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
2	Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu	2008-2013	15 130 747,49	11 425 973,11	3 704 774,38	-	Zadanie ma charakter ciągły, realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu poprzez: – usługi i instrumenty rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi przez

	aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych						polskie i unijne prawo, – planowanie rozwoju zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania tworzonego wspólnie przez osobę bezrobotną oraz doradcę zawodowego, pośrednika pracy i innych pracowników urzędu, – prowadzenie poradnictwa grupowego, – projekt systemowy pn. „Praca naszym celem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali następujące wsparcie: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymały 5653 osoby bezrobotne (w tym 3421 kobiet), w tym 2138 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 1430 kobiet).

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w celu rozwijania kształcenia ponadgimnazjalnego sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku	2008-2013	1 391 741,75	-	1 030 558,95	361 182,80 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania dotychczas wykonano: remont i adaptację pomieszczeń po byłych warsztatach szkolnych na pracownie zajęć praktycznych i laboratorium (2008 r.), remont budynku warsztatowego (2009 r.), remont pomieszczeń do nauki zawodu (2010 r.). W 2011 r. wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń magazynowych na pracownię wielozadaniową ze stanowiskiem do napraw pojazdów samochodowych. W latach 2008-2012 dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby praktycznej nauki zawodu.
2	Budowa stadionu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane
3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	2012-2014	380 103,08	-	380 103,08	-	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wybudowano wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: budowę boiska do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną, dwóch mini boisk do koszykówki, boiska do piłki siatkowej oraz boiska do gry w tenisa ziemnego, zamontowanie oświetlenia oraz kamery obrotowej.
4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	2011-2012	341 750,54	-	341 750,54	-	Zadanie zostało zrealizowane.

	nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu						
5	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	2009	286 596,18	-	30 469,22	256 126,96 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. W ramach zadnia wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano docieplenie ścian i dachu sali gimnastycznej oraz malowanie ścian i cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej.
6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	2009-2010	-	-	-	-	Z uwagi na brak dostępnych środków finansowych odroczono realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	2012	65 143,21	-	14 895,13	50 248,08 -Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2010 r. została wymieniona stolarka okienna, natomiast w 2011 r. wykonano termomodernizację ściany szczytowej.
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu	2009-2010	270 000,00	-	-	270 000,00 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Z uwagi na brak dostępnych środków finansowych odroczono realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.
9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	2009-2010	648 781,40	-	88 781,40	560 000,00 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Inwestycja została zrealizowana w całości w 2011 r. i obejmowała trzy etapy: 1. Termomodernizację łącznika i sali gimnastycznej. 2. Termomodernizację budynku szkoły. 3. Wymianę stolarki okiennej drewnianej na wykonaną z PCV.
10	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 – Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu	2011-2012	523 124,91	-	109 721,08	413 403,83 - Powiatowy Fundusz Ochrony	Inwestycja została zrealizowana w całości.

						Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	
11	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu	2009-2010	399 999,21	-	399 999,21	-	Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zakup instalacji systemów zabezpieczeń przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
2	Modernizacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
3	Konserwacja zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.
4	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	2009-2010	838 334,79	628 751,09	209 583,70	-	Ze względu na fakt, iż budynek III Liceum Ogólnokształcącego objęty jest ścisłym nadzorem konserwatorskim nie jest możliwe wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych tradycyjnymi metodami (styropian, powłoka tynkowa). W 2011 r. wymienione zostały okna w ramach projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez modernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Obszar tematyczny: **Pomoc społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1 2	Wsparcie zadania w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych Pomoc w adaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy osób niepełnosprawnych	działania ciągłe	11 405 161,00	-	389 346,00	11 015 815,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	Zadania realizowano jako ciągłe, w ramach zadań ustawowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie", wdrażanego w latach 2008-2011 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
			1 391 384,08	1 245 032,07	146 352,01	-	W ramach zadań ustawowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu udzieliło wsparcia osobom niepełnosprawnym w następujących formach: dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej, dofinansowanie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, wniosków realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej. W ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu udzieliło wsparcia osobom niepełnosprawnym w następujących formach: zajęcia i warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczno-zawodowe, trening umiejętności i kompetencji społecznych, turnusy rehabilitacyjne, Konferencje Grupy Rodzinnej, zajęcia psychoterapeutyczne, usługi doradcze dla osób niepełnosprawnych.
3	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie – rozbudowa filii w Parchaniu	2008-2010	4 494 044,26	2 640 516,86	1 853 527,40	-	Projekt został zrealizowany w okresie od września 2010 r. do grudnia 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Uchwałą Nr XIII/128/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu został przekształcony

							w Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu. W wyniku realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu osiągnął wymagane prawem standardy.
4	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie – rozbudowa budynku mieszkalnego filii w Tarnówku	2008-2010	3 129 896,35	2 034 432,63	1 095 463,72	-	Projekt został zrealizowany w okresie od września 2009 r. do listopada 2010 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Uchwałą Nr XLII/415/2010 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 maja 2010 r. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku. W wyniku realizacji projektu Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku osiągnął wymagane prawem standardy i otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 grudnia 2010 r.).
5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny przy ul. Krzywoustego w Inowrocławiu	2009-2010	17 009,38	-	17 009,38	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Wymieniono część okien w budynku socjalnym. Pozostało do wymiany 20% okien oraz ocieplenie ścian. Zakres zadania zmniejszył się do obszaru małego budynku (socjalnego). Nieruchomość podzielono na trzy niezależne części.
6	Termomodernizacja w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	2009-2010	413 321,67	-	413 321,67	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Sporządzono niezbędną dokumentację projektową.
7	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2009-2010	303 572,12	-	-	303 572,12 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.
8	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku	2009-2010	387 653,95	-	387 653,95	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. Termomodernizacą objęto następujące budynki Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku: • budynek socjalno-mieszkalny, • budynek administracyjno-mieszkalny, • budynek pralni i suszarni. Termomodernizacji poddano ściany i dachy ww. budynków, które docieplono za pomocą styropianu. Elewacje zewnętrzne budynków zostały pomalowane. Na dachach położono nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Wymieniono również stare rynny.

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego ePowiat Inowrocławski	2008-2009	12 500,00	-	12 500,00	-	Inwestycja nie została zrealizowana w pierwotnie zakładanym terminie z uwagi na odwołanie konkursu, w ramach którego planowano pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektu. Zadanie wykonano w ograniczonym zakresie ze środków budżetu Powiatu. Unowocześniono infrastrukturę telekomunikacyjną urzędu (zakup komputerów, serwerów, urządzeń sieciowych) oraz wdrożono podpis elektroniczny. Powiat przystąpił jako partner do projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2. - Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Obszar tematyczny: **Administracja publiczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników wszystkich jednostek administracji publicznej na terenie powiatu inowrocławskiego	2008-2015	524 190.31	458 771,36	65 418,95	-	Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1.07.2009 r. do 31.12.2010 r. w ramach projektu pn. „Urzędnicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo. Zakres rzeczowy projektu obejmował: – przeprowadzenie szkoleń ogólnych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, – przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w zakresie: Budżet zadaniowy, Rachunkowość budżetowa, Prawo Zamówień Publicznych, Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek pozyskania funduszy unijnych, Studium wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego, Przygotowanie inwestycji zgodnie

							z procedurami FIDIC, Gospodarka nieruchomościami, Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, Uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 2 - Miasto Inowrocław

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 2

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	111 465 851,96
Środki UE	45 955 532,82
Środki własne	62 200 011,14
Inne	3 310 308,00


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 2 w ujęciu procentowym

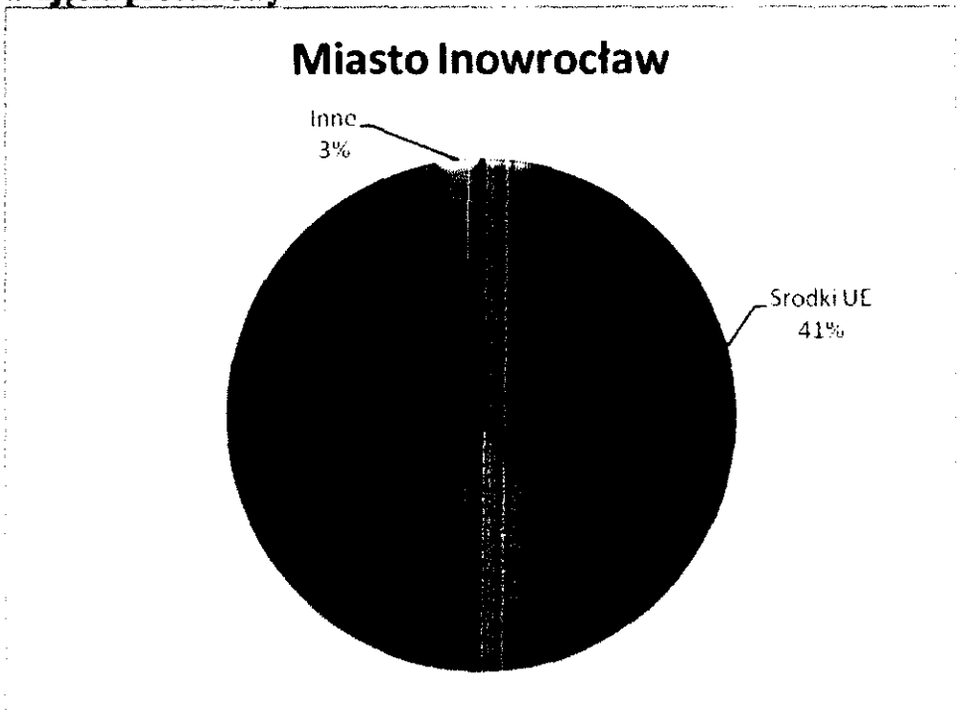


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 2

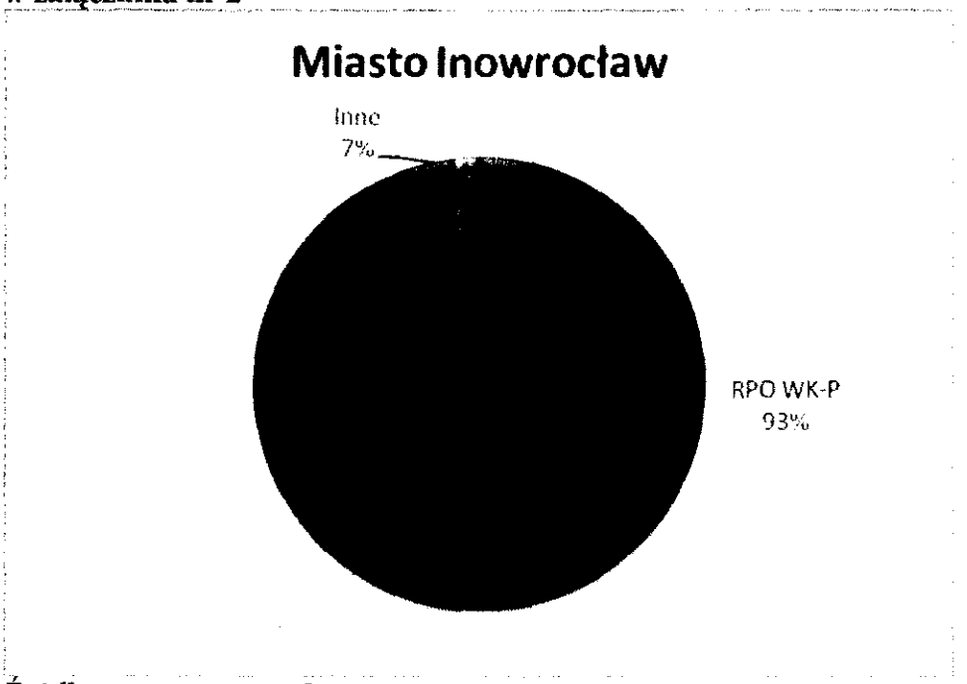

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 2

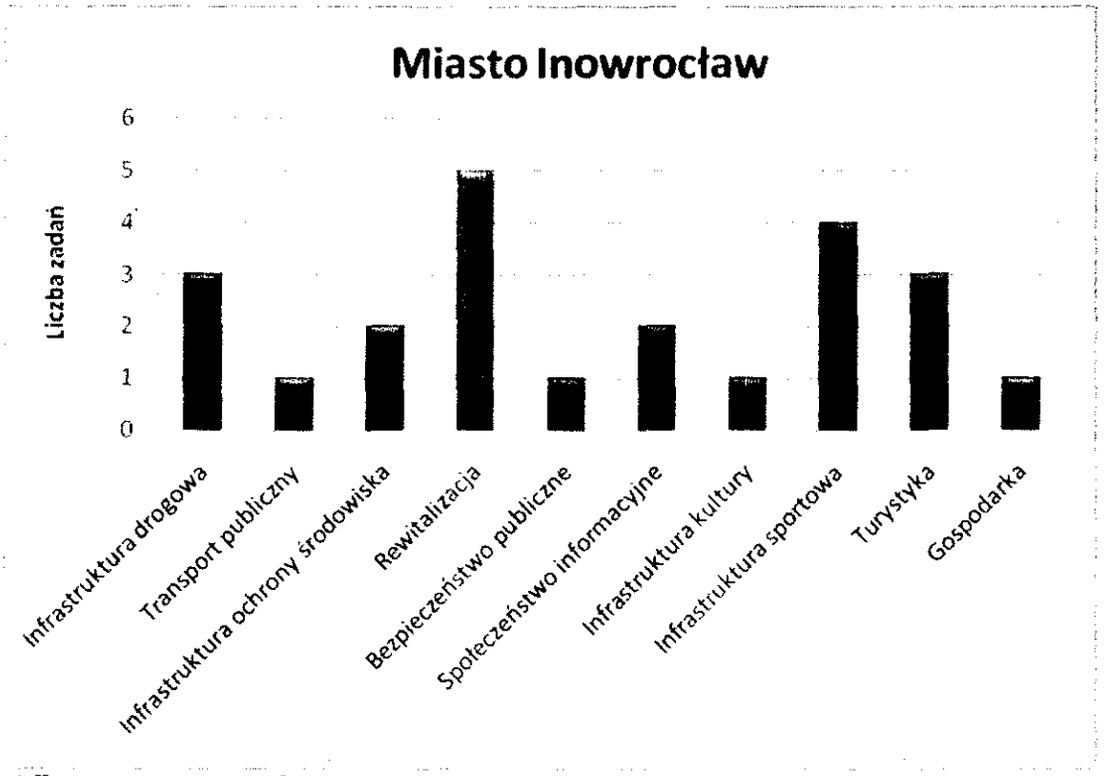

Źródło: opracowanie własne

Miasto Inowrocław

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa ul. Cmentarnej	2007-2008	547 558,39	-	547 558,39	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2007 r. W ramach zadania przebudowano i poszerzono jezdnię, wykonano chodniki, zatoki mini-bus i miejsca postojowe oraz wybudowano parkingi dla samochodów osobowych z jezdnią manewrową.
2	Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica	2008-2009	6 700 000,00	2 719 530,00	3 980 470,00	-	Zmianie uległ harmonogram realizacji zadania, w związku z brakiem możliwości finansowych ze strony GDDKiA na realizację przebudowy skrzyżowania ulic Poznańska – Stanisława Staszica – Górnicza. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2012 r., pod warunkiem przebudowy ww. skrzyżowania przez GDDKiA, w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa.
3	Budowa ul. Metalowców	2010-2011	4 490 435,25	1 822 667,66	2 667 767,59	-	Inwestycję zrealizowano w 100% w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. W wyniku realizacji zadania wybudowano 1,2 km drogi ze ścieżką rowerową i chodnikiem.

Obszar tematyczny: **Transport publiczny**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zakup autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji	2008-2010	9 004 345,22	-	9 004 345,22	-	Zadanie zrealizowano w 100%. W latach 2008-2010 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Inowrocławiu zakupiło z własnych środków jeden autobus zasilany olejem napędowym oraz pięć autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Wykonano również remonty kapitalne ośmiu pojazdów. We wszystkich zakupionych pojazdach zamontowano system monitoringu.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zagospodarowanie gazu składowiskowego	2008	710 308,00	-	400 000,00	310 308,00 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Inwestycja nie została zrealizowane w całości w planowanym terminie ze względu na niewielką ilość biogazu składowiskowego. Zadanie kontynuowane będzie w latach 2012-2013. W ramach zadania dotychczas zrealizowano: dokumentację, pomiary i badania oraz instalacje ujęcia biogazu (25 studni biogazowych, rurociągi odprowadzające biogaz), kontener-stację ssąco-tłoczącą z urządzeniami do przepompowywania biogazu, pochodnia spalania biogazu.

2	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Inowrocław	2008-2013	8 600 000,00	-	8 600 000,00	-	Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. W latach 2008-2011 wybudowano ok. 12,7 km kanalizacji sanitarnej, ok. 8,6 km sieci wodociągowej oraz ok. 8,4 km kanalizacji deszczowej.

Obszar tematyczny: **Rewitalizacja**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rewitalizacja centrum miasta (ulice i skwery) (koszty realizacji uwzględniają zadnie nr 3 – „Przebudowa Placu Klasztornego" oraz zadanie nr 5 – „Przebudowa płyty rynku")	2007-2011	11 06 2117,97	7 743 482,57	3 318 635,40, w tym: 600 000,00 – budżet Powiatu Inowrocławskiego	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015 – „Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum Miasta Inowrocławia", ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. W wyniku realizacji zadania nastąpiła odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna centrum miasta Inowrocławia. W ramach zadania przebudowano trzy ulice: Królowej Jadwigi, Św. Ducha i Wałową oraz dwa skwery: Wyczółkowskiego i Obrońców Inowrocławia.
2	Rewitalizacja centrum miasta (kamienice)	2008	3 042 473,93	2 129 731,74	912 742,19	-	Zadanie zrealizowano w 100% w latach 2008-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Projekt obejmował kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kasztelańskiej 22.

							Budynek został przystosowany na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury. W wyniku realizacji zadania rozszerzona została oferta kulturalna dla mieszkańców i turystów. W odnowionej kamienicy powstały m.in.: wystawa archeologiczna, sala wystaw czasowych, sale twórcze, sale na szkolenia zawodowe i zajęcia dydaktyczne, w których organizowane są zajęcia kulturalno-terapeutyczne, plastyczne i filmowe.
3	Przebudowa Placu Klasztornego (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1„Rewitalizacja centrum miasta (ulice i skwery)")	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. W wyniku realizacji zadania nastąpiła odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna centrum miasta Inowrocławia.
4	Rewitalizacja Parku Solankowego	2008-2010	9 884 326,42	5 930 595,85	3 953 730,57	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej miasta Inowrocławia poprzez wzbogacenie oferty usług turystyczno-uzdrowiskowych, poprawę ich jakości, rozwój nowych usług oraz rozwój infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej.
5	Przebudowa płyty rynku (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1„Rewitalizacja centrum miasta (ulice i skwery)")	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,

							Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię płyty i małą architekturę, zaprojektowano i wykonano fontannę oraz pomnik królowej Jadwigi. W wyniku realizacji zadania nastąpiła odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna centrum miasta Inowrocławia.

Obszar tematyczny: **Bezpieczeństwo publiczne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2007-2008 2012-2013	69 342,38	-	69 342,38	-	W latach 2007-2008 zadanie zrealizowano w 100%. W wyniku realizacji zadania rozbudowano monitoring miejski o trzy nowe kamery. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zwiększanie dostępu do internetu i informacji dla mieszkańców dzielnic Inowrocławia i kuracjuszy	2008	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
2	Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej na terenie miasta Inowrocławia	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura kultury**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Modernizacja Teatru Miejskiego oraz Inowrocławskiego Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza	2008-2009	3 169 230,00	2 218 461,00	950 769,00	-	Zadanie zrealizowano w 100% w latach 2008-2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. W wyniku realizacji zadania nastąpiła odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna centrum miasta Inowrocławia. Powstały m.in. sale wystawiennicze do organizowania zmiennych ekspozycji, multimedialna wystawa górnictwa soli oraz Instytut Prymasa Józefa Glempa.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa Stadionu Miejskiego nr 1 (ul. Wierzbińskiego)	2008-2010	18 186 100,00	1 835 000,00	13 351 100,00	3 000 000,00 – Ministerstwo Sportu i Turystyki	Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. I etap zakończono w 2011 r. w 100%, II etap zostanie zrealizowany do końca 2012 r. Zakres rzeczowy I etapu obejmował: budowę zadaszonej, trzykondygnacyjnej trybuny głównej z pomieszczeniami socjalnymi oraz trybun

							ziemnych z trzema tysiącami miejsc siedzących, budowę 400-metrowej bieżni poliuretanowej, skoczni i rzutni oraz nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej, budowę drogi wewnętrznej. Wykonano również ogrodzenie zewnętrzne stadionu, bramę główną oraz wejścia boczne, zainstalowano oświetlenie oraz nagłośnienie. W wyniku realizacji zadania obiekt spełnia kryteria obowiązujące przy organizacji imprez krajowych i międzynarodowych. W ramach II etapu planuje się: instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektu, systemowe bramki obrotowe wraz z oprogramowaniem, tablicę informacyjną oraz telebim, budowę pełnowymiarowego boiska bocznego oraz modernizację budynku socjalnego na terenie stadionu. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2	Budowa Skate Parku	2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
3	Rozbudowa kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1	2010	72 841,05	-	72 841,05	-	Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie. W 2011 r. zostało zmodernizowane oświetlenie kortów. Inwestycja będzie kontynuowana do 2015 r.
4	Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	2012-2013	-	-	-	-	W 2012 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej zadania, natomiast wykonanie inwestycji planowane jest w 2013 r.

Obszar tematyczny: **Turystyka**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Ujęcie wód mineralnych	2008	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizację Inwestycji przejęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
2	Rozbudowa Parku Solankowego	2008-2010	13 908 834,38	8 345 300,62	5 563 533,76	-	W latach 2008-2010 zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem i harmonogramem. Zadanie będzie kontynuowane do końca 2012 r. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych . W wyniku realizacji zadania powstały cztery nowe obiekty turystyczne: nowe alejki w Parku Solankowym, nowe dywany kwiatowe, Ogrody Papieskie, zaplecze socjalne przy tężni solankowej.
3	Przebudowa kompleksu hotelowo-basenowego przy ul. Świętokrzyskiej	2012-2013	6 537 501,97	3 922 501,18	2 615 000,79	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zmianie uległ harmonogram realizacji zadania na lata 2011-2012. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

Obszar tematyczny: **Gospodarka**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	2008-2013	15 480 437,00	9 288 262,20	6 192 174,80	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Indywidualnego Projektu Kluczowego pn. „Inowrocławski Obszar Gospodarczy", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Zmianie uległ harmonogram realizacji na lata 2009-2011. W wyniku realizacji zadania utworzono trzy strefy o łącznej powierzchni ponad 30 ha: I strefa (zachodnia) – w obrębie ul. Pakoskiej (pomiędzy ul. Pakoską a torami kolejowymi stacji PKP Inowrocław), II strefa (południowa) – w obrębie ul. Deszczowej (pomiędzy ulicami: Popowicką i Bagienną), III strefa (północna) – w obrębie ul. Szosa Bydgoska (w rejonie ulic: Szosa Bydgoska, Karola Libelta i Karola Marcinkowskiego). Strefy uzbrojono, wyposażono w infrastrukturę drogową, oświetlenie, infrastrukturę teletechniczną i wodno-kanalizacyjną. Tereny kompleksowo przygotowano do prowadzenia działalności produkcyjne i usługowej. W wyniku realizacji zadania wybudowano 1,7 km dróg, 2,9 km sieci wodociągowej, 1,8 km kanalizacji sanitarnej, 2,3 km kanalizacji deszczowej.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Załącznik nr 3 – Gmina Kruszwica

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 3

Źródła finansowania	**Kwota w PLN**
Koszty całkowite	19 275 130,37
Środki UE	6 566 647,72
Środki własne	7 088 499,48
Inne	5 619 983,18


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 3 w ujęciu procentowym




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 3

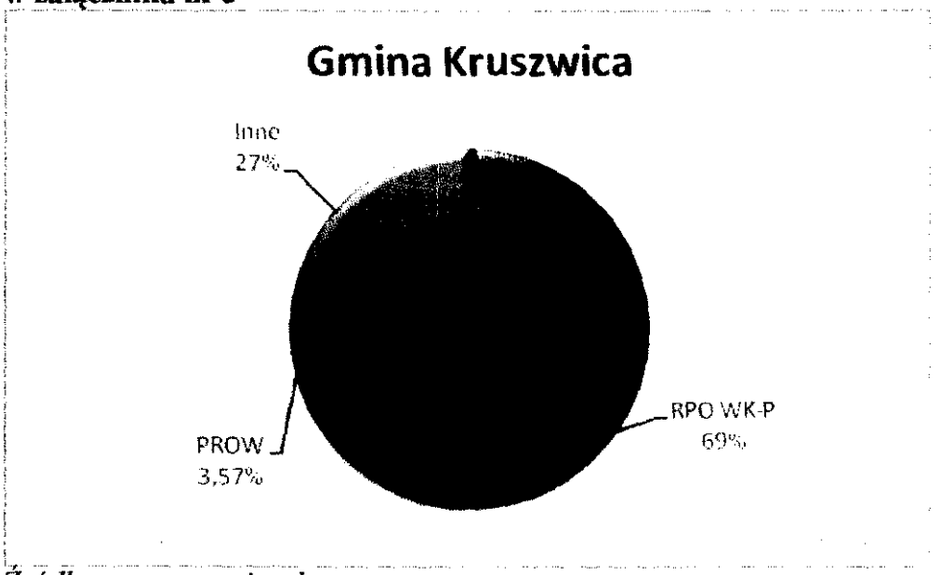

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 3

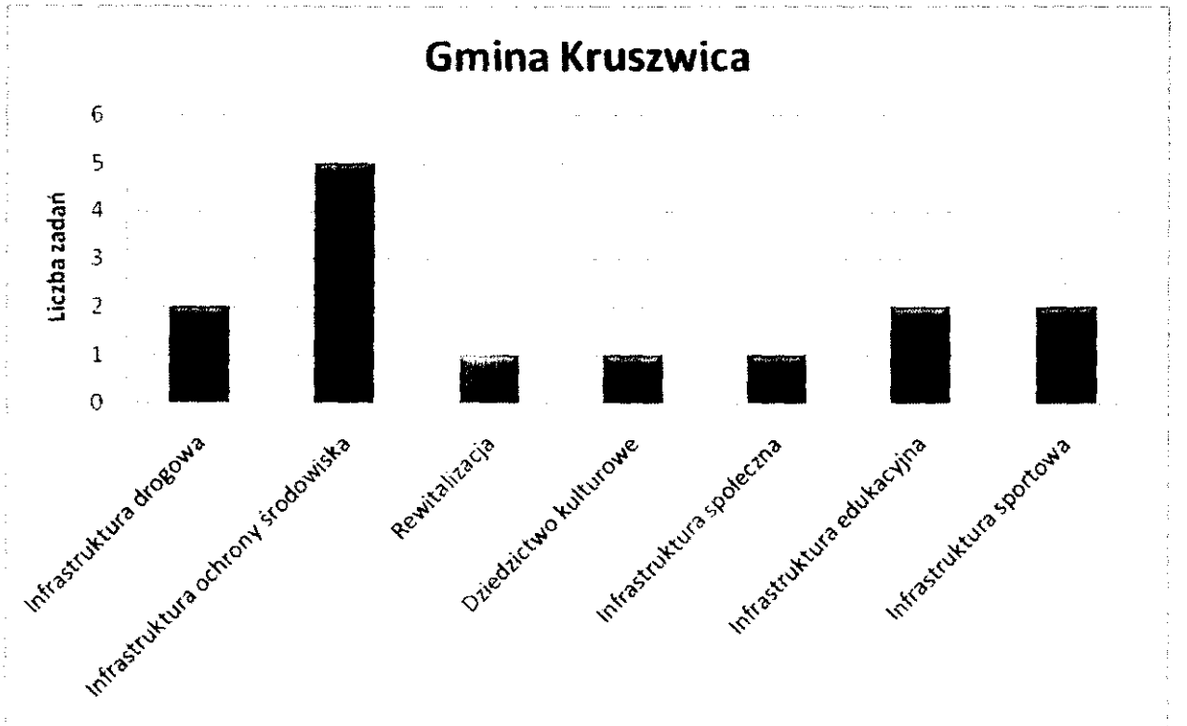

Źródło: opracowanie własne

Gmina Kruszwica

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej we wsi Kraszyce	2008	136 105,98	-	96 105,98	40 000,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Zadanie zrealizowano w ograniczonym zakresie ze względu na wysokie koszty inwestycji. Przebudowano 1000 mb drogi metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na szerokości 4-4,5 m.
2	Przejazd do wsi Szarlej z Szosy Tryszczyńskiej	2011-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa sieci wodociągowej dla wsi Chełmce, Karsk, Mietlica, Ostrowo, Witowice, Złotowo	2010-2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.
2	Budowa sieci kanalizacyjnej Bachorce, Chełmce, Chełmiczki, Grodztwo, Rusinowo, Sławsk Wielki	2010-2015	1 053 595,53	322 566,00	431 750,04	299 279,49 - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wybudowano 1859,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodztwo. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3	Budowa sieci kanalizacyjnej Kobylnica, Karsk, Witowice	2011-2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.
4	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Janowice, Kobylniki, Przedbojewice, Rożniaty, Sławsk Wielki, Żerniki	2012-2015	61329,73	-	61 329,73	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wybudowano 289 mb sieci wodociągowej w miejscowości Janowice.
5	Przebudowa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków	2010-2012	6 245 953,25	-	1 631 249,57	2 118 749,44 - pożyczka	Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.

						Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 495 954,25 - środki Spółki Wodno-Ściekowej w Kruszwicy	

Obszar tematyczny: **Rewitalizacja**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy	2009	16 000,00	-	16 000,00	-	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy". Dotychczas wykonano koncepcję projektu Rewitalizacji Rynku w Kruszwicy. Ze względu na przedłużające się konsultacje społeczne, zadanie będzie zrealizowane w późniejszym terminie niż pierwotnie planowano.

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Gopłańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu	2008-2011	10 633 364,65	6 244 081,72	4 389 282,93	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. W 2012 r. planuje się wykonanie dodatkowych prac polegających na usunięciu zniszczeń powstałych wskutek powodzi obejmujących przebudowę ścieżek rowerowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa budynku mieszkań socjalnych	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane. Będzie realizowane w latach 2012 – 2013 pod nazwą „Budowa budynku mieszkań socjalno-komunalnych"

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.
2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy	2011 - 2012	1 128 781,23	-	462 781,23	666 000,00 - budżet państwa, budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie zostało zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy". W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach programu: „Moje Boisko – Orlik 2012".

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa boiska sportowego we wsi Sławsk Wielki	2010-2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.
2	Budowa basenu na osiedlu Zagople	2011-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 4 - Gmina Gniewkowo

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 4

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	44 894 152,92
Środki UE	16 338 906,94
Środki własne	24 495 976,58
Inne	4 059 269,40


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 4 w ujęciu procentowym

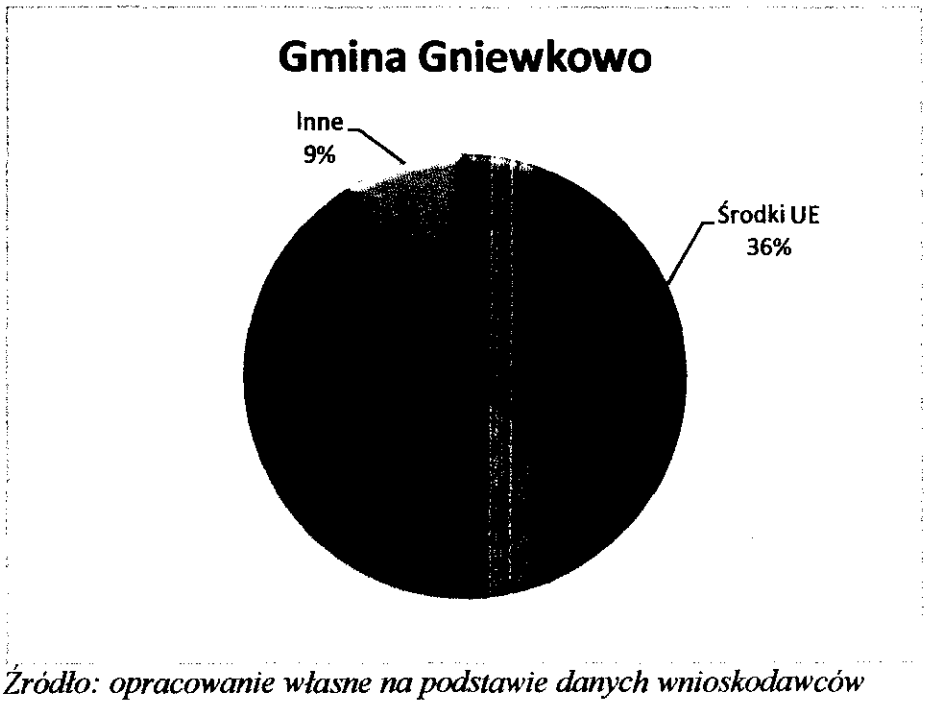


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 4

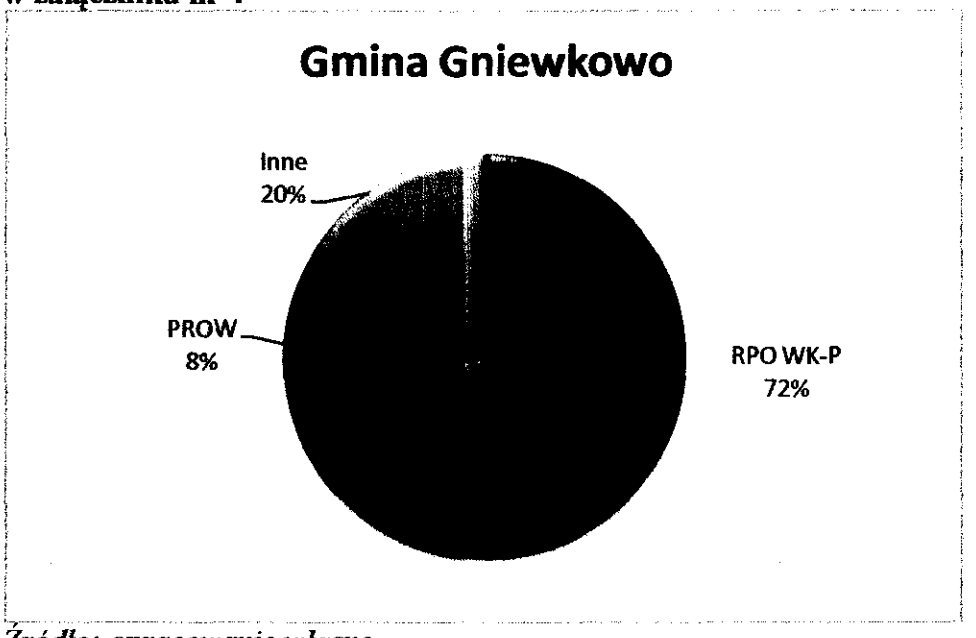

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 4

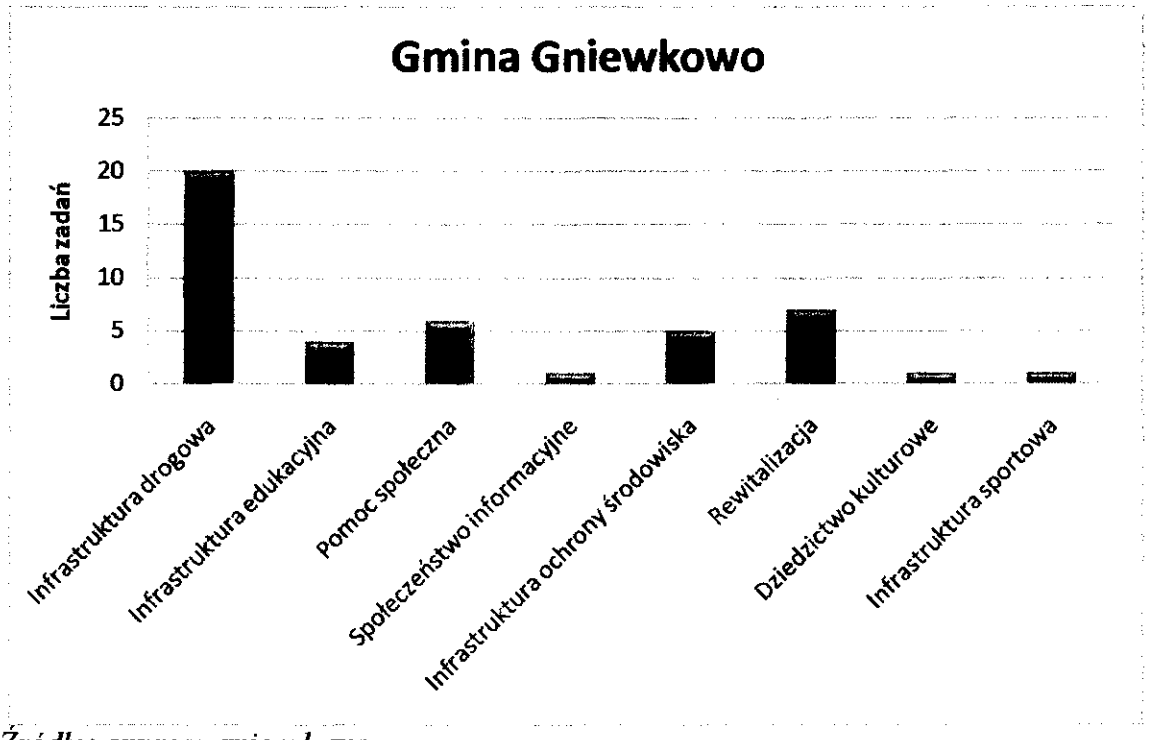

Źródło: opracowanie własne

Gmina Gniewkowo
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Modernizacja drogi gminnej Suchatówka – Kijewo – Warzyn	2008	1 501 568,08	-	1 430 768,08	70 800,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Zadanie zostało zrealizowane w 2009 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 3,5 km z utwardzonymi poboczami i zjazdami, chodnikami i oznakowaniem drogi.
2	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezierze-Suchatówka (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 2 i zadanie nr 8)	2008-2010	1 701 093,61	-	1 591 093,61	90 000,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 20 000,00 - Nadleśnictwo Gniewkowo	Zadanie zrealizowano w 2010 r. w ramach połączonych zadań 2 i 8 w ramach projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej Zajezierze-Suchatówka i Zajezierze-Perkowo". W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 3 km z utwardzonymi poboczami i zjazdami oraz oznakowaniem drogi. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu agroturystyki, budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo	2008	1 058 604,99	-	717 171,26	341 433,73 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Zadanie zrealizowano w III etapach w latach 2008-2010. Wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej na odcinku o dł. 3,2 km i szer. 2 m.
4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Suchatówka-Gniewkowo	2008	655 797,81	-	410 429,34	245 368,47 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Zadanie zrealizowano w 2010 r. Wykonano ścieżkę rowerową na odcinku 1,1 km i szer. 2 m.
5	Budowa nawierzchni z kostki ul. Działkowców w Gniewkowie	2008	698 554,40	-	698 554,40	-	Zadanie zrealizowano w 100% zgodnie z planem. Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o dł. 500 m i szer. 5 m z oznakowaniem.

6	Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
7	Budowa nawierzchni z kostki ul. Kwiatowej w Gniewkowie	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
8	Modernizacja drogi gminnej Zajezierze-Perkowo (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 2 „Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezierze-Suchatówka")	2010-2011	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w 2010 r. w ramach połączonych zadań 2 i 8 w ramach projektu pn. „Modernizacja drogi gminnej Zajezierze-Suchatówka i Zajezierze-Perkowo". W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 1,5 km z poboczami, zjazdami i oznakowaniem drogi. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu agroturystyki, budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
9	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	2010-2011	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
10	Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 10,11,12 oraz zadanie nr 20)	2010	1 199 844,77	-	1 199 844,77	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina". Zamierzony cel został osiągnięty, wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni o dł. 400 m z przebudową chodników na ulicy 17 Stycznia. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
11	Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 10 „Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie")	2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 200 m i przebudowano chodniki na ulicy Moniuszki. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.

12	Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 10 „Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie")	2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 200 m z przebudową chodników na ulicy Chopina. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.
13	Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie	2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
14	Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie	2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
15	Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie	2010	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r.
16	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Gniewkowie	2011	184 000,00	-	184 000,00	-	Zadanie zrealizowano w 2010 r. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o dł. 100 m wraz z chodnikiem. W 2009 r. zmieniono nazwę ulicy z ul. Polnej na ul. Księstwa Gniewkowskiego.
17	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie	2011	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
18	Modernizacja nawierzchni Osiedla Toruńskiego w Gniewkowie	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
19	Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie	2012	-	-	-	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 r.
20	Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 10 „Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie")	2012	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 10,11,12 oraz 20 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic 17 Stycznia, Moniuszki, Wałowej, Chopina". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o dł. 200 m z przebudową chodnika na ulicy Wałowej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu budownictwa jednorodzinnego i liczby przedsiębiorstw na trasie modernizowanej drogi, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie i budowa stacji uzdatniania wody	2008-2010	20 077 718,93	13 019 622,02	7 058 096,91	-	Zadanie zostało zrealizowane pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodnościekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie". Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Inwestycja została zrealizowana częściowo. W 2010 r. została otwarta nowa Stacja Uzdatniania Wody w Gniewkowie. Stara stacja uzdatniania wody powstała na początku lat 90. Oparta była na technologii z lat 60. Obecnie stacja posiada nową halę filtrów z dwustopniową filtracją składająca się z areatora i pięciu filtrów pionowych na każdym poziomie. Ostatnim etapem technologii jest dezynfekcja wody z wykorzystaniem promieni UV. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków planowana jest na 2013 r.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka-Gniewkowo	2009-2010	1 993 870,26	1 225 739,00	768 131,26	-	Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r. W 2010 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo-Gniewkowo	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zostało zrealizowane w 2009 r. w części dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo przez Gminę

							Rojewo. W ramach zadania wybudowano 7 km sieci kanalizacyjnej, powstało 98 przyłączy. Zadanie nie zostało zrealizowane w miejscowości Gniewkowo.
5	Kanalizacja deszczowa w Gniewkowie	2008-2012	1 185 372,69	-	297 001,97	888 370,72 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie zostało zrealizowano w 100%, zgodnie z planem. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: Dworcowej, Sobieskiego i Kościelnej w Gniewkowie.

Obszar tematyczny: Rewitalizacja

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji) (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 1,2,3,5,6,7)	2008-2012	8 204 612,57	1 693 545,92	6 511 066,65	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6,7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 700 m z przebudową chodników i budową kanalizacji deszczowej na ulicy Dworcowej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.

2	Modernizacja ulicy Sobieskiego w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)"	2008	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 300 m z przebudową chodników i budową kanalizacji deszczowej na ulicy Sobieskiego. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
3	Modernizacja nawierzchni Rynku w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)"	2008	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 400 m z przebudową chodników na Rynku. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
4	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Rynku z przyległymi ulicami	2008-2010	-	-	-	-	Inwestycja planowana jest w 2012 r.

5	Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)"	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 330 m z przebudową chodników i budową kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
6	Modernizacja nawierzchni ul. Zamkowej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)"	2009	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku". W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 140 m. na ulicy Zamkowej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.
7	Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji) koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 1 „Modernizacja ulicy	2009	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 1,2,3,5,6 oraz 7 w ramach projektu pn. „Przebudowa ulic Dworcowej, Sobieskiego, Kościelnej, Zamkowej, Podgórnej i Rynku". W wyniku realizacji zadania

	Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)"						wykonano nową nawierzchnię jezdni o dł. 70 m. na ulicy Podgórnej. Inwestycja przyczyniła się do wzrostu turystyki, liczby punktów handlowych i przedsiębiorstw na terenie inwestycji, zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich.

Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Turystyka Historyczna - Księstwo Gniewkowskie	2008-2010	190 524,27	-	-	35 000,00 - budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 000,00 - budżet Powiatu Inowrocławskiego 135 524,27 - środki prywatne	Zadanie realizowane jest poprzez m.in. coroczne obchody „Dni Księstwa Gniewkowskiego" na przełomie maja i czerwca, które obejmują: imprezy, spotkania i koncerty o tematyce historycznej. Dotychczas wydano folder oraz uruchomiono stronę internetową www.ksiestwogniewkowskie.com.pl. W 2011 r. wykonano pomnik Księcia Władysława Białego, usytuowany na Rynku w Gniewkowie. Zmieniono także nazwę ulicy przylegającej do Rynku z ul. Polnej na ul. Księstwa Gniewkowskiego, przy której już wkrótce zostanie wybudowana podświetlana imitacja zabytkowego wiatraka widoczna z drogi krajowej nr 15. Jedynym zabytkiem z czasów Księstwa jest Kościół p.w. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie. Gmina Gniewkowo realizuje wiele działań wspierających rozwój turystyki historycznej poprzez działania infrastrukturalne: ścieżki rowerowe, elementy małej architektury, budowę skwerów i terenów rekreacyjnych.

Obszar tematyczny: Społeczeństwo informacyjne

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego	2008-2010	15 000,00	-	15 000,00	-	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	2008	546 212,92	-	202 740,88	343 472,04 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie zrealizowano w latach 2008-2009. Ocieplono ściany, wymieniono okna i drzwi. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku.
2	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012"	2008	1 320 097,34	-	654 097,34	333 000,00 - Urząd Wojewódzki 333 000,00 - budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Gniewkowa na lata 2007-2013, z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Strategią Lizbońską. Zadanie wpisuje się również w Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

4	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie	2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego Walcerzewice I	2008	1 119 136,33	-	804 876,50	314 259,83 - Bank Gospodarstwa Krajowego/Fundusz dopłat	Zadanie zostało zrealizowane. Wymieniono dach, zamontowano stolarkę budowlaną, położono instalację przez co zmniejszyły się koszty eksploatacyjne budynku; wzrósł standard mieszkań oraz wartość rynkowa nieruchomości.
2	Budowa świetlicy w Zajezierzu (koszty realizacji uwzględniają zadanie nr 2 i zadanie nr 6)	2008-2009	756 356,12	400 000,00	356 356,12	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 2 i 6 w ramach projektu pn. „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezierzu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3	Remont budynku Pałacu w Markowie	2008-2010	200 000,00	-	-	200 000,00 - Agencja Nieruchomości Rolnych	Zadanie zostało zrealizowane. Na budynku pałacu wykonano kapitalny remont wejścia głównego w zakresie konstrukcji wiatrołapu oraz przeprowadzono częściową naprawę konstrukcji i wymianę pokrycia dachowego. Do kompleksu budynku przynależy także świetlica, w której przeprowadzono modernizację – instalacja c. o., wymianę tynków, podwieszane stropy, ubikacje, pomieszczenie kuchenne oraz wymieniono okna i drzwi.
4	Budowa budynku mieszkalnego Walcerzewice II	2008-2010	1 798 001,14	-	1 258 960,80	539 040,34 - Bank Gospodarstwa Krajowego/Fundusz dopłat	Zadanie zrealizowano w latach 2010-2011 jako zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego Lipie". W ramach zadania wybudowano 20 mieszkań, w tym 10 dwupokojowych o powierzchni 59,10 m oraz 10 jednopokojowych o powierzchni 42,10 m. W budynku zamontowano ogrzewanie centralne z kotłowni oraz przyłącze kanalizacyjne do kolektora ściekowego i oczyszczalni ścieków.

5	Budowa centrum rekreacji na ul. Piasta w Gniewkowie	2008-2009	487 786,69	-	337 786,69	150 000,00 - Bank Gospodarstwa Krajowego/Ministerstw o Sportu i Turystyki	Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku realizacji zadnia powstał rekreacyjny teren służący mieszkańcom do odpoczynku i aktywnego spędzania walnego czasu. Obiekt posiada przebudowane chodniki, wielofunkcyjne boisko sportowe, stawek z pomostem i ozdobnymi rybkami oraz największy w mieście plac zabaw.
6	Budowa świetlicy w Kawęczynie (koszty realizacji zadania uwzględniono w zadaniu nr 2 „Budowa świetlicy w Zajezierzu")	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie zrealizowano w ramach połączonych zadań 2 i 6 w ramach projektu pn. „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i Zajezierzu", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Euroboisko – modernizacja stadionu MLKS UNIA w Gniewkowie	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 5 - Gmina Pakość

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 5

Źródła finansowania	**Kwota w PLN**
Koszty całkowite	23 795 552,10
Środki UE	12 382 261,05
Środki własne	7 628 682,31
Inne	3 784 608,74


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 5 w ujęciu procentowym

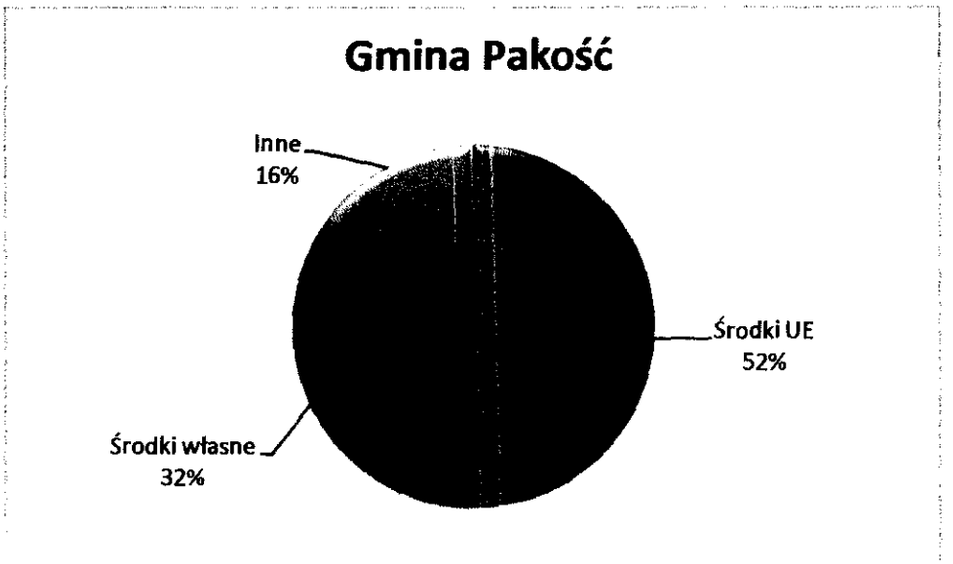


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 5

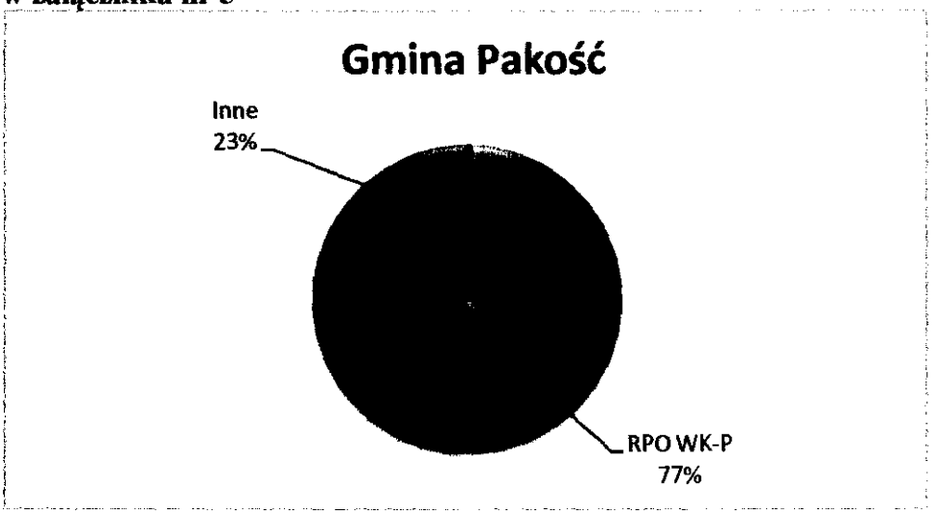

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 5

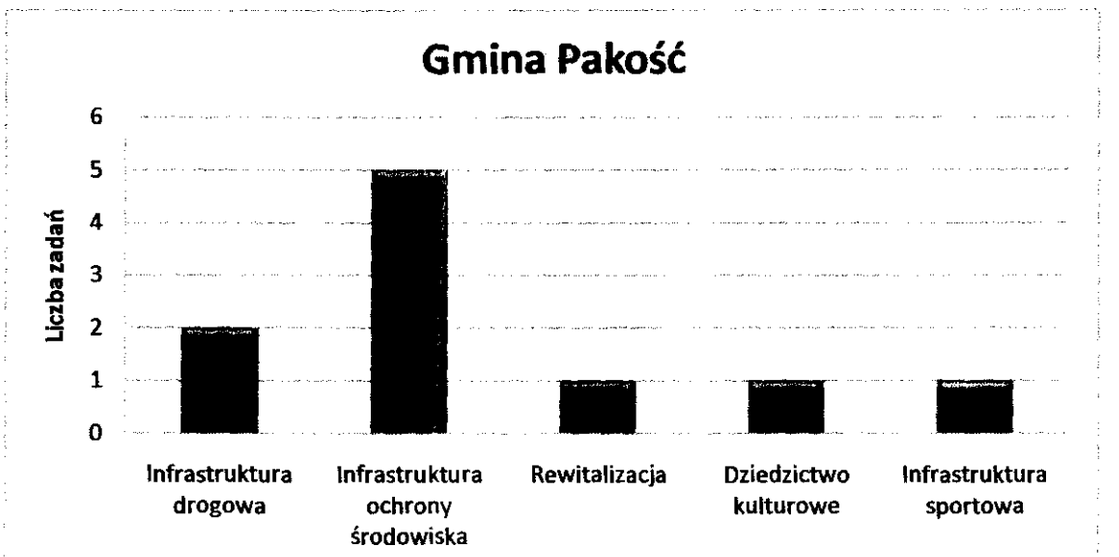

Źródło: opracowanie własne

Gmina Pakość

Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej	2007-2013	7 100 333,19	3 500 000	3 600 333,19	-	Zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Zrealizowany zakres zadania jest zgodny z planowanym. Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej została wykonana na długości 1,870 km. Realizacja projektu polegała m.in. na wykonaniu utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji, oświetlenia ulic oraz zatoki autobusowej.
2	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jankowo	2012	549 946,28	-	459 946,28	90 000,00 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Zadanie zostało zrealizowane w 100% w 2010 r. Nawierzchnia została wykonana na odcinku 1.718 mb.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz modernizacja stacji uzdatniania wody przy	2007-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, Gmina przeprowadziła niezbędną do prawidłowego funkcjonowania modernizację stacji uzdatniania wody przy

	ul. Inowrocławskiej w Pakości i w miejscowości Kościelec						ul. Inowrocławskiej.
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	2007-2013	I etap 931 124,65 II etap 440 000,00	-	231 124,65 115 000,00	700 000,00 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 325 000,00 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie jest w trakcie realizacji. Ze względów finansowych inwestycja została podzielona na 3 etapy niezależne technologicznie. W 2011 r. został zrealizowany etap I, w ramach którego wybudowano 766 m sieci o średnicy 200 mm oraz przepompownię ścieków PS-3. W 2012 r. przystąpiono do realizacji II etapu (termin zakończenia 15 listopada 2012r.), w ramach którego wybudowano 438 m sieci o średnicy 200 mm, 178 m przyłączy o średnicy 180 mm oraz przepompownie ścieków PS-2
3	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej we wsi Rybitwy	2010-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2012 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej.
4	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Radłowskiej	2010-2012	1 109 130,98	-	717 130,98	392 000,00 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wybudowano 551 mb sieci o średnicy 250 mm, co umożliwiło podłączenie odcinków sieci wybudowanych w ramach zadania: pn. „Budowa obwodnicy m. Pakość - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255 w Pakości" do istniejącej sieci.

5	Budowa instalacji spalania gazu wysypiskowego	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar tematyczny: Rewitalizacja

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłych zakładach lniarskich	2008-2013	-	-	-	-	W 2012 r. podjęto pracę nad dokumentacją projektową zgodnie z przyjętym planem. Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	2009-2013	13 665 017,00	8 882 261,05	2 505 147,21	2 277 608,74 - kredyt bankowy	Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska" jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury. Dotychczas zrealizowanych zostało w ramach projektu ponad 46% zakładanych prac. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało w 2012 r. W ramach zadania wykonano: - infrastrukturę drogową, - kanalizację, - sanitariaty, - oświetlenie, - oświetlenie ul. Cmentarnej, - zieleń,

							- małą architekturę, - kapliczki, - elektrykę w kapliczkach, - uruchomiono Centrum Informacji Turystycznej.

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej	2010-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 6 - Gmina Janikowo

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 6

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	49 695 854,50
Środki UE	10 841 291,31
Środki własne	29 970 938,02
Inne	8 883 625,17


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku 6 w ujęciu procentowym

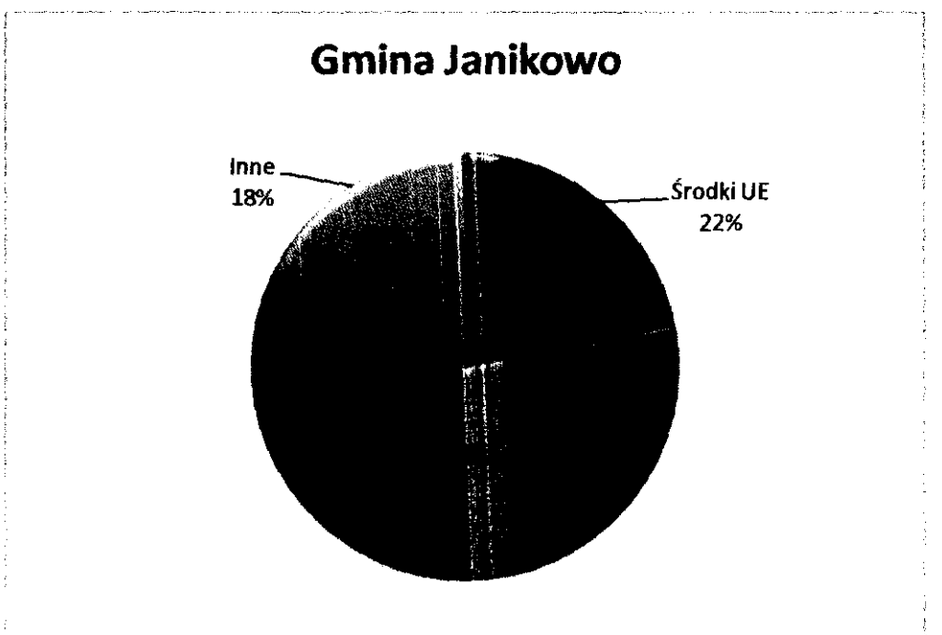


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 6

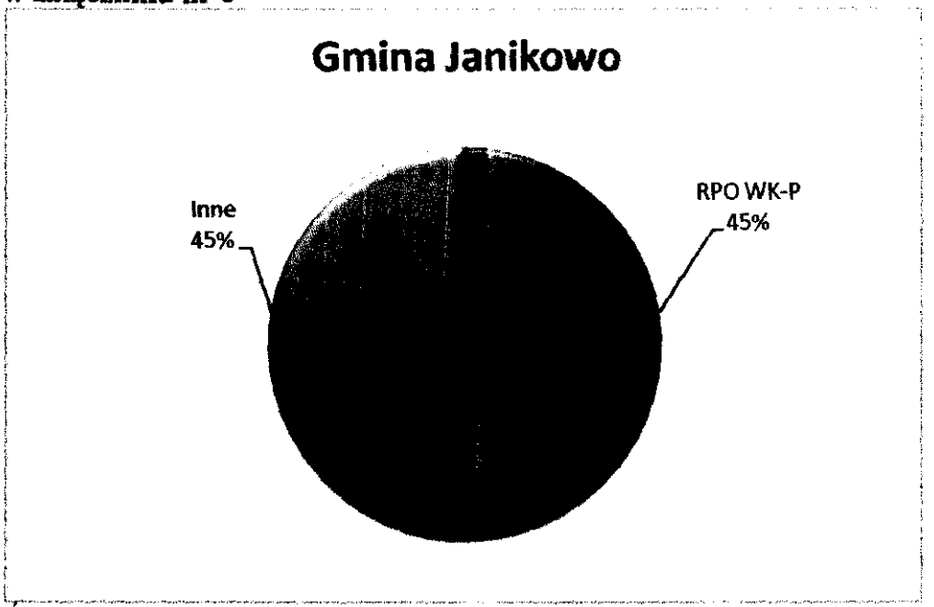

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 6

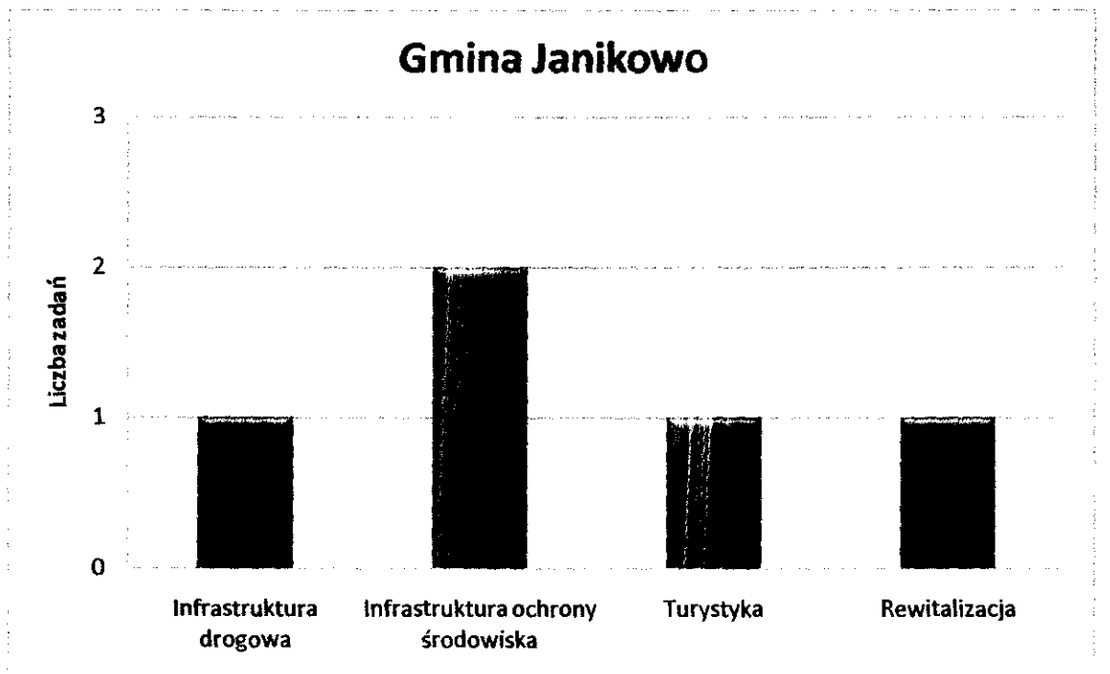

Źródło: opracowanie własne

Gmina Janikowo

Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego miasta Janikowa i budową wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Toruń	2009-2015	20 855 447,51	6 664 379,10	10 427 723,75	3 763 344,66 - budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało podzielone na dwie inwestycje: 1. „Budowa obwodnicy miasta Janikowa" – projekt kluczowy zrealizowany przez Gminę Janikowo w 2011 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa w trybie indywidualnym; 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły" – projekt zrealizowany przez Powiat Inowrocławski w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa w trybie konkursowym.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa instalacji do nawodnień ciśnieniowych dla upraw rolniczych i warzywniczych	2009-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie zostało ujęte w Programie Nawodnień Rolniczych w Województwie Kujawsko – Pomorskim przyjętym do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janikowo	2009-2015	4 049 777,30	2 043 495,00	2 006 282,30	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2010 r. wybudowano kanalizację we wsiach: Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała, w 2011 r. w Broniewicach i Dobieszewicach. Około 50 % powierzchni gminy jest wyposażone w kanalizację sanitarną. Osiągnięto zakładany cel w zakresie dotychczas wykonanych robót – 50% mieszkańców korzysta z możliwości odprowadzenia ścieków do oczyszczalni. Do 2017 r. planowane jest wykonanie najważniejszych elementów kompleksowej kanalizacji gminy.

Obszar tematyczny: Turystyka

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i zaplecza dla rozwoju turystyki nad Jeziorem Pakoskim	2009 - działanie ciągłe	21 247 901,10	-	16 127 620,59	5 120 280,51 - budżet państwa, budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano 50% planowanego zakresu rzeczowego. Wybudowano halę widowiskowo sportową z zapleczem noclegowym. W ramach rządowego programu budowy boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012" wybudowano dwa boiska. W ramach rządowego programu budowy lodowisk „Biały Orlik" wybudowano lodowisko. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę kempingu wraz z zapleczem socjalnym.

Obszar tematyczny: Rewitalizacja

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janikowa	2008-2013	3 542 728,59	2 133 417,21	1 409 311,38	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach I etapu inwestycji zrealizowano budowę miejskiego placu zabaw, zainstalowano urządzenia wyposażenia parkowego, wybudowano budynek z pomieszczeniami zaplecza socjalnego i gastronomią dla korzystających z placu zabaw. Teren podzielony został na strefy funkcjonalne i tereny zielone połączone ciągami pieszymi. W ramach II etapu planowana jest budowa targowiska miejskiego. Dotychczas wykonano 40% zadania. Zakończenie II etapu inwestycji planowane jest w 2014 r. w zakresie budowy targowiska oraz infrastruktury rynku miejskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 7- Gmina Rojewo

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 7

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	7 600 411,18
Środki UE	1 038 722,93
Środki własne	5 468 688,25
Inne	1 093 000,00


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 7 w ujęciu procentowym

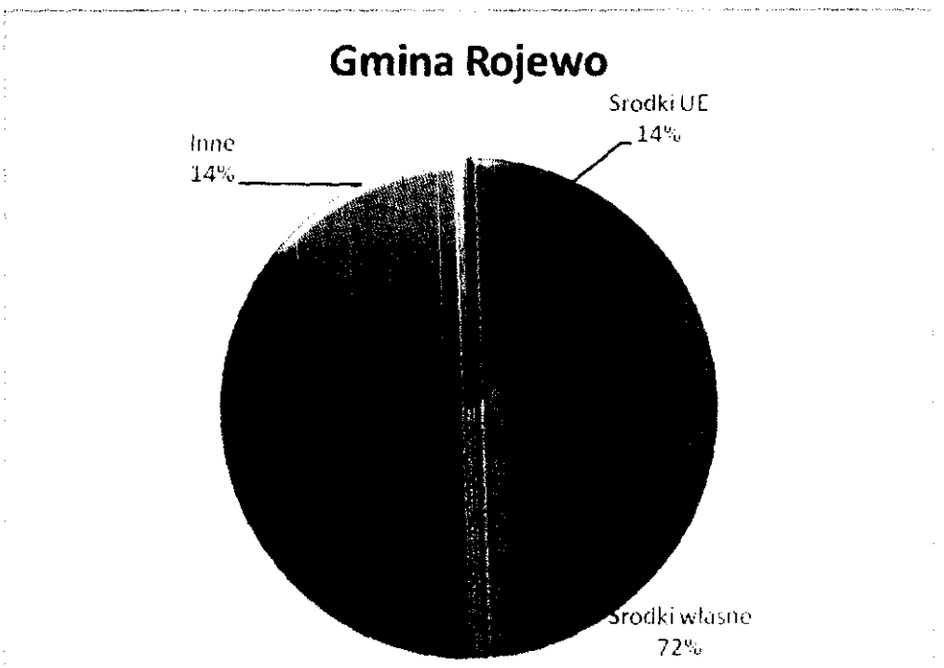


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 7

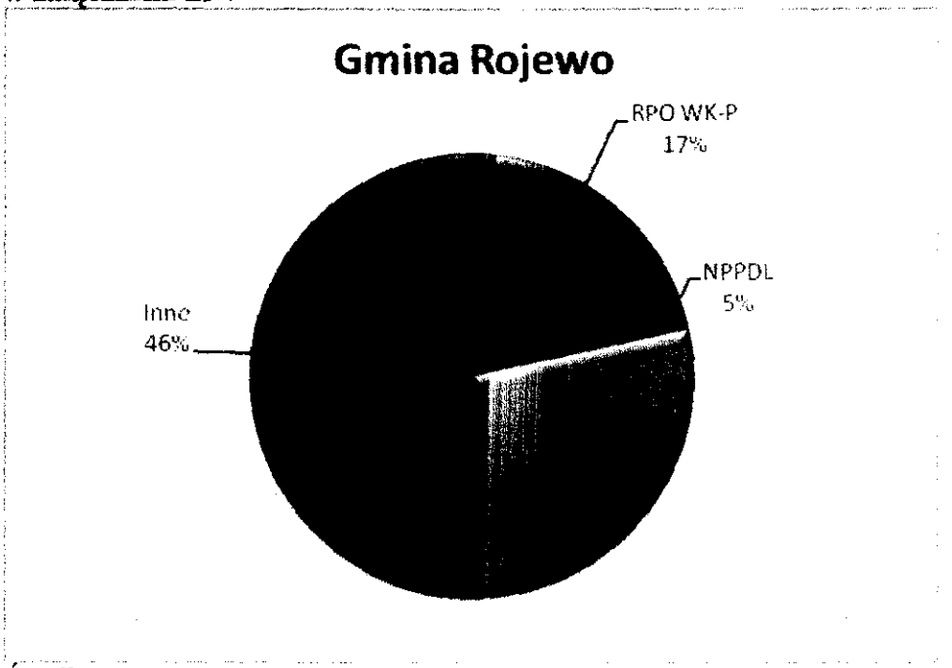

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 7

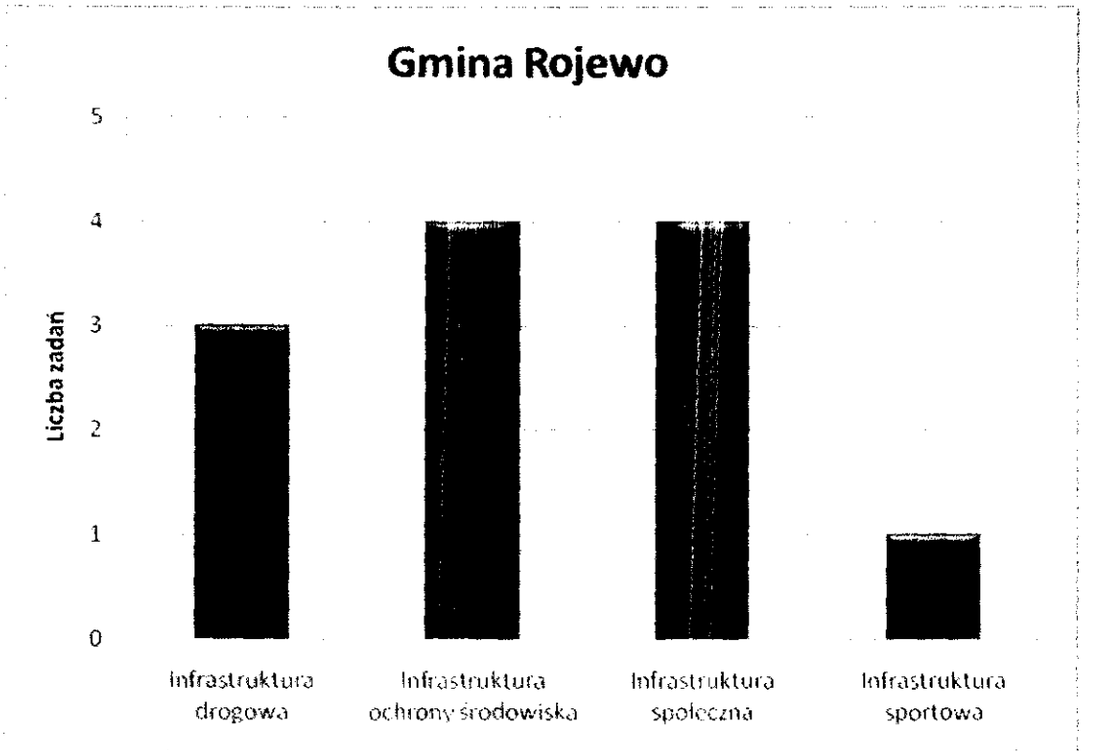

Źródło: opracowanie własne

Gmina Rojewo

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa chodnika w miejscowości Rojewo	2011	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00 – budżet państwa	Zadanie zrealizowano w 100% ze środków własnych oraz budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Powierzchnia wybudowanego chodnika wyniosła 1823 m^2.
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jezuicka Struga	2008	741 293,87	359 422,93	381 870,94	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój Infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Długość przebudowanej drogi wyniosła 1234 mb.
3	Budowa parkingu w miejscowości Płonkowo	2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Rojewo	2008	2 032 885,20	-	2 032 885,20	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2009 r. W wyniku realizacji zadania wybudowano 4215,5 mb kanalizacji grawitacyjnej, 4721 mb kanalizacji tłocznej, 98 szt. przyłączy, 16 szt. przepompowni ścieków. Łącznie projektem objęto 610 osób.
2	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Liszkowo	2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
3	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	2008-2012	686 206,69	403 890,00	282 316,69	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów

							Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W ramach zadania wybudowano w pięciu miejscowościach 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
4	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Ściborze	2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Topola, Liszkowo, Dobiesławice	2008	247 433,92	122 622,38	124 811,54	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2009 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Liczba wyremontowanych i doposażonych świetlic wiejskich: 3 szt.
2	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Liszkowice, Płonkowo	2012	-	-	-	-	Zadanie dotychczas nie zostało zrealizowane.
3	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ściborze, zagospodarowanie i uporządkowanie parku	2009	248 534,54	152 787,62	95 746,92	-	Zadanie zrealizowano w zakresie remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej. Nie zrealizowano uporządkowania parku. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
4	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezuicka Struga	2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Rojewie	2010	3 444 056,96	-	2 451 056,96	993 000,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki	Zadanie zrealizowano w 100% ze środków własnych oraz budżetu państwa. W ramach zadania wybudowano 1 obiekt sportowy.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 8 - Gmina Dąbrowa Biskupia

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 8

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	7 099 182,61
Środki UE	2 949 748,88
Środki własne	4 029 683,13
Inne	119 750,60


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 8 w ujęciu procentowym

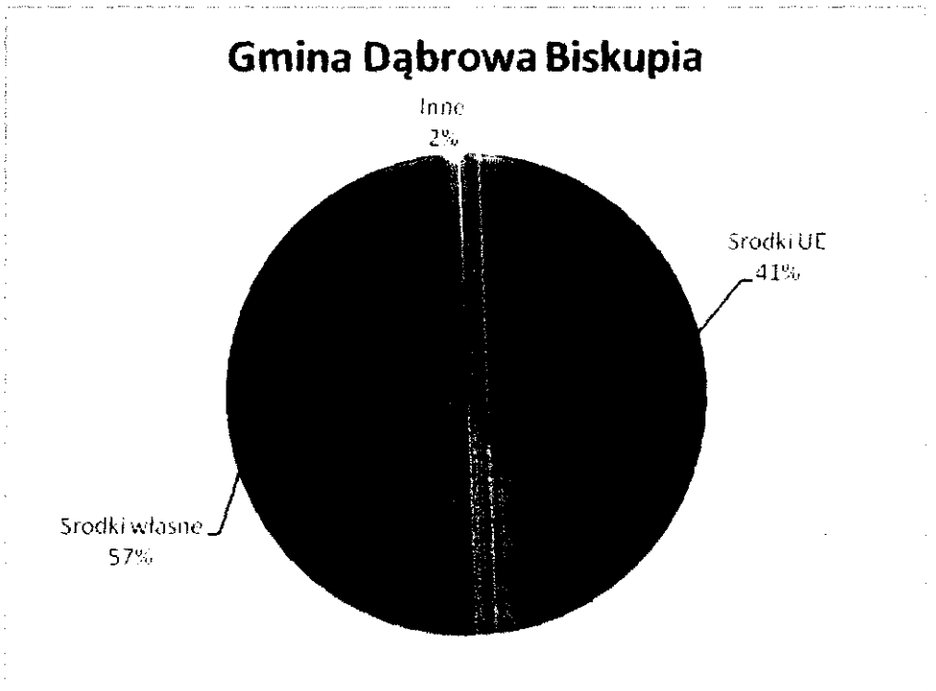


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 8

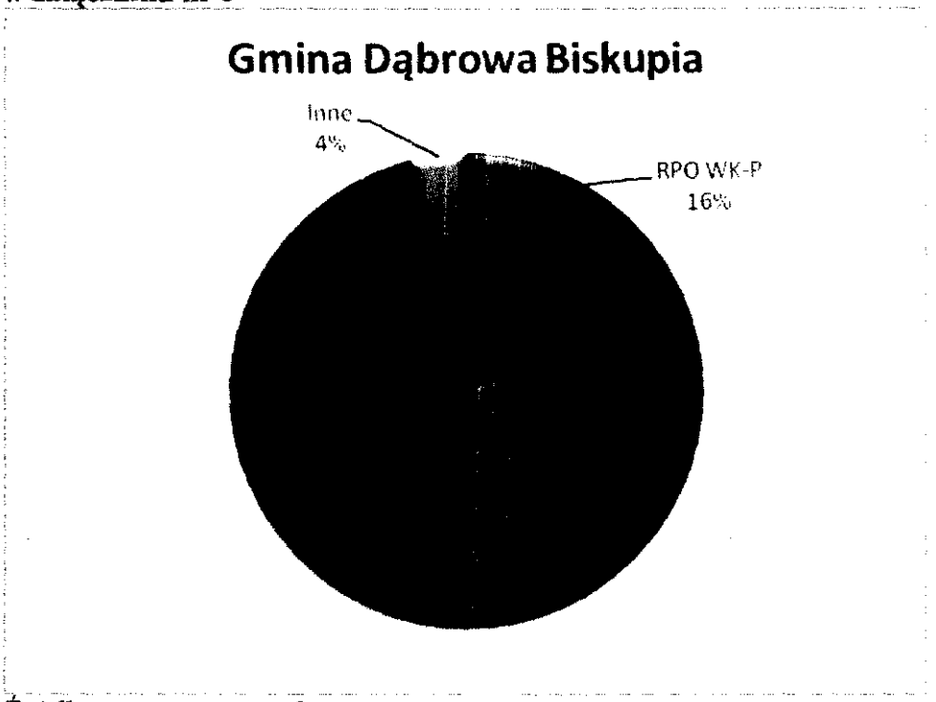

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 8

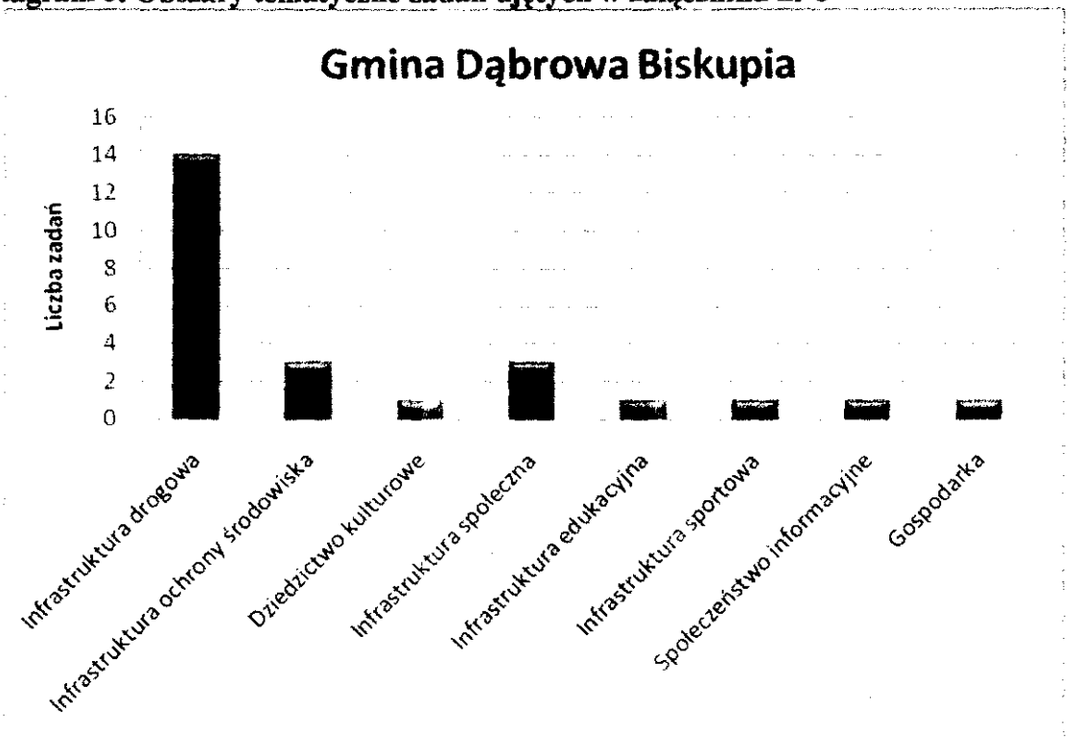

Źródło: opracowanie własne

Gmina Dąbrowa Biskupia
Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Regeneracja drogi Modliborzyce-Brudnia	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2013-2015
2	Budowa dróg w Radojewicach kolonia I i kolonia II	2009-2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji zadania: 2013-2015
3	Wykonanie nawierzchni drogi w Dąbrowie Biskupiej	2009-2011	1 169 159,51	499 976,94	669 182,57	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. W ramach zadania przebudowano ulice: Spacerową, Słoneczną, Leśną i Budowlaną. Długość przebudowanych dróg wyniosła: 668,47 m.
4	Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej	2008-2010	88 139,77	52 966,00	35 173,77	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Długość wybudowanego chodnika wyniosła: 268,54 m.
5	Budowa drogi w Konarach	2008-2013	317 279,67	-	317 279,67	-	Zadanie zrealizowano w 100%. Długość wybudowanej drogi wyniosła: 1164,46 m.
6	Kontynuacja modernizacji drogi w Nowym Dworze	2007-2009	78 274,27	-	78 274,27	-	Zadanie zrealizowano w 100%. Długość wybudowanej drogi wyniosła: 1,0 km.
7	Budowa drogi w Zagajewiczkach	2008-2010	60 037,25	-	60 037,25	-	Dotychczas zrealizowano I etap inwestycji. W latach 2012-2015 planowana jest realizacja II etapu w ramach zadania pn. „Budowa drogi w Zagajewiczkach – II Etap – metodą podwójnego utwardzenia: nawierzchnia emulsja+grys".
8	Budowa chodników w miejscowościach Brudnia, Ośniszczewko, Parchanie, Pieranie	2007-2013	70 7972,56	165 869,00	455 623,81	86 479,75 – budżet Powiatu Inowrocła wskiego	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich. W wyniku realizacji zadania wykonano chodniki z kostki polbrukowej

						i Zarządu Dróg Wojewódz kich	w miejscowościach: Brudnia – 392,25 m, Parchanie – 942,49 m, Pieranie 500 m, Ośniszczewko – 600 m.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych	2007-2008 2008-2009	880 448,05	531 614,53	348 833,52	-	Zadanie zrealizowano w 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wybudowano siedem oczyszczalni grupowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia: w miejscowości Brudnia – 1 szt., Modliborzyce – 1 szt., Dziewa – 1 szt., Mleczkowo – 1 szt., Parchanie – 3 szt.
2	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych (budowa oczyszczalni przydomowych z osadem czynnym - II ETAP)	2009-2013	2 125 181,18	871 859,00	1 253 322,18	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach inwestycji wykonane zostały 54 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: Parchanie, Ośniszczewo, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
3	Rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i modernizacja pod kątem przyjmowania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	2009-2010	433 126,58	261 618,06	171 508,52	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano system instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Parchaniu: zmodernizowano instalację technologiczną dla prowadzenia procesu uzdatniania wody, wyremontowano

							pomieszczenia kotłowni w budynku hydroforni, węzeł sanitarny, pomieszczenia chloratorów, pomieszczenia sterowni oraz halę filtrów.

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przejęcie i adaptacja dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu na świetlicę i Izbę Pamięci oraz zagospodarowanie parku	2008-2010	-	-	-	-	W ramach zadania rozpoczęta została rewitalizacja dworku (wykonano poszycie dachowe oraz wymieniono piec CO ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych). Zadanie realizowane będzie w przypadku posiadanych środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej	2007-2008	28 116,12	-	13 416,12	14 700,00 – budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	W ramach I etapu wybudowano plac zabaw w Dąbrowie Biskupiej. W ramach II etapu w latach 2009-2011 wybudowano place zabaw w miejscowościach: Wonorze, Bąkowo, Wola Stanomińska, Sobiesiernie, Modliborzyce (ze środków budżetu gminy) oraz Parchanki, Zagajewice, Brudnia, Stanomin, Mleczkowo, Chlewiska, Chróstowo, Przybysław, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Dabrowa Biskupia, Nowy Dwór, Pieranie, Konary, Radojewice.
2	Zagospodarowanie parku oraz stawów w Radojewicach	2008-2010	34 940,80	-	34 940,80	-	Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania uporządkowano park, odmulono dwa

							stawy wiejskie, zagospodarowano teren wokół stawów oraz wybudowano grzybek z altanką dla imprez plenerowych.
3	Zagospodarowanie parku w Zagajewicach	2008-2010	18 570,85	-	-	18 570,85 – Fundusz Solecki	Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania uporządkowano park wiejski, przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie dla świetlicy. Prace porządkowe w parku wykonano we własnym zakresie, natomiast z funduszu sołeckiego zakupione zostało wyposażenie do świetlicy i oświetlenie wokół świetlicy.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	2007-2013	-	-	-	-	Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2015 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej".

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa, modernizacja i wyposażenie boisk sportowych z terenem rekreacyjnym	2007-2013	1 121 863,85	565 845,35	556 018,50	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W wyniku realizacji zadania wybudowano, zmodernizowano i wyposażono 14 boisk na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia	2007-2013	36 072,15	-	36 072,15	-	Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem. W wyniku realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Obszar tematyczny: **Gospodarka**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przygotowanie terenów pod inwestycje	2007-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2020.

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 9 – Gmina Złotniki Kujawskie

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	14 904 926,32
Środki UE	2 475 461,32
Środki własne	9 360 624,26
Inne	3 068 840,74


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 9 w ujęciu procentowym

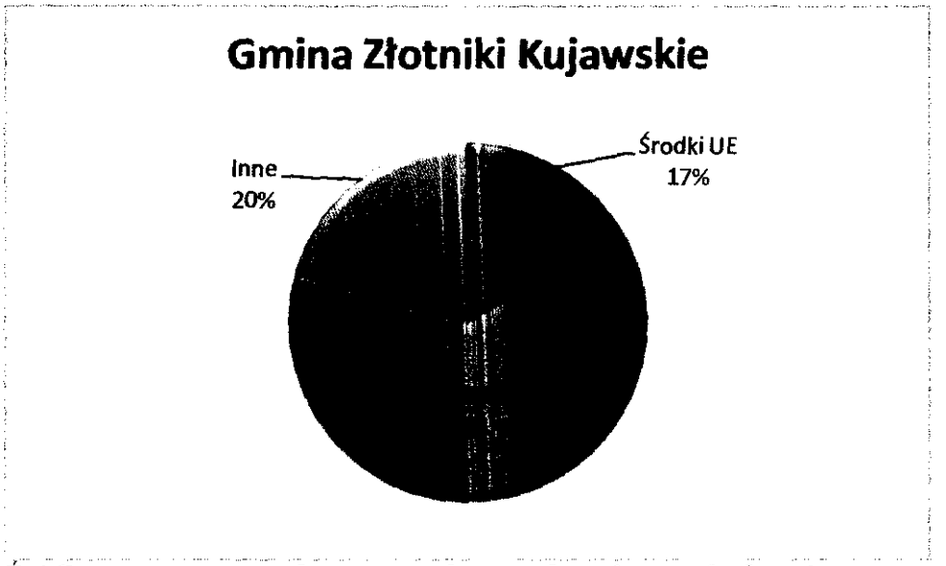


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 9

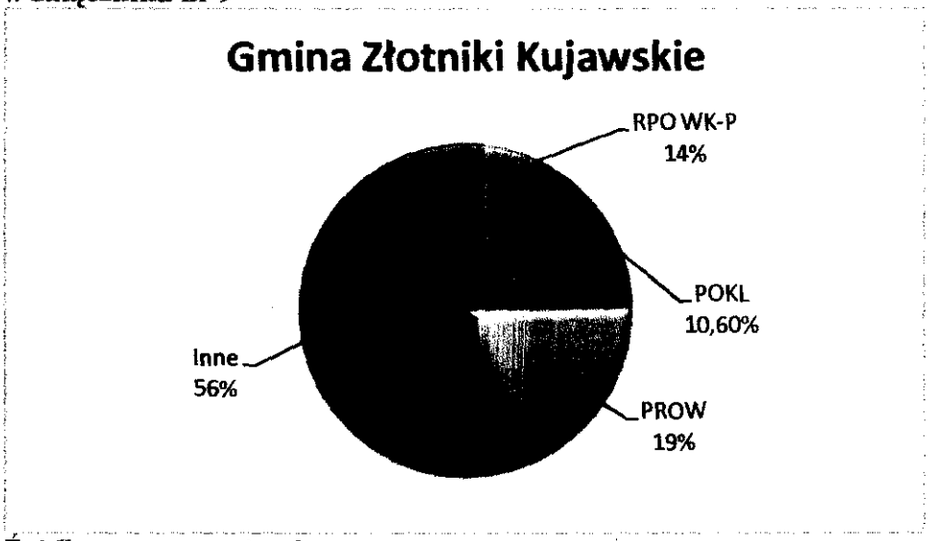

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 9

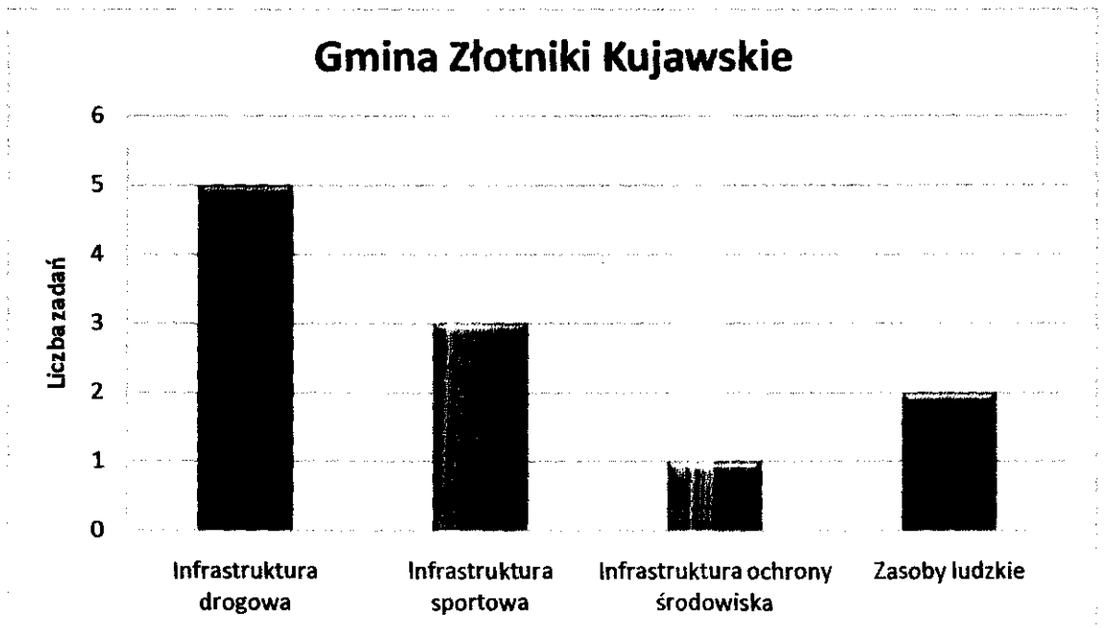

Źródło: opracowanie własne

Gmina Złotniki Kujawskie

Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa drogi gminnej Krążkowo-Palczyn	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braków środków finansowych.
2	Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie	2009	666 939,18	330 469,59	336 469,59	-	Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Celem zadania była poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców – użytkowników projektowanej drogi. Długość przebudowanej drogi gminnej wyniosła 1,05491 km.
3	Przebudowa dróg gminnych w Niszczewicach	2009-2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.
4	Przebudowa drogi Rucewo-Rucewko i drogi w Rucewie	2008-2010	1 984 094,96	499 839,59	1 484 255,37	-	Zadanie zostało zrealizowane częściowo w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0560008(a) oraz części drogi nr 0560008 i 0560018 w miejscowości Rucewo" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Długość przebudowanej drogi gminnej wyniosła 1,89 km. Przebudowa drogi Rucewo-Rucewko planowana jest do realizacji w latach 2013-2014.
5	Przebudowa ulic Lipowej, Ustronie, Wiśniowej, Słonecznej, Podgórnej, Różanej, Poprzecznej z odwodnieniem w ulicy Inowrocławskiej w miejscowości Tuczno	2008-2009	2 004 895,40	-	2 004 895,40	-	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W 2008 r. przebudowana została ulica Lipowa, w 2009 r. – ulica Wiśniowa. Zadanie zrealizowano ze środków własnych. Przebudowa pozostałych ulic planowana jest do realizacji pod warunkiem dostępnych środków finansowych.

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krężołach, Mierzwinie i Helenowie	2009	2 003 874,86	613 394,00	1 390 480,86	-	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W 2010 r. w ramach środków własnych realizowany był projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Krężoły i Mierzwin" (część miejscowości Mierzwin). W 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano kanalizację w Mierzwinie. W Helenowie kanalizacja sanitarna planowana jest do realizacji pod warunkiem dostępnych środków finansowych.

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przebudowa infrastruktury sportowej stadionu gminnego w Złotnikach Kujawskich	2008-2010	1 889 122,35	449 636,44	773 485,91	333 000,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki 333 000,00 - budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W 2009 r. wybudowano boisko w ramach projektu „ORLIK 2012". W 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złotnikach Kujawskich." W miarę dostępnych środków finansowych realizowana będzie przebudowa płyty głównej boiska.
2	Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich	2010-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

3	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie	2008-2010	4 324 168,20	-	2 474 168,20	700 000,00 - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 1 150 000,00 - Ministerstwo Sportu i Turystyki	Inwestycja została zrealizowana w latach 2009-2010. W ramach inwestycji oddano nowy obiekt sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz nową kuchnię i stołówkę szkolną.

Obszar tematyczny: Zasoby ludzkie

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Klub Integracji Społecznej – szansą dla wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym	2008-2010	569 973,10	482 790,75	61 622,74	25 559,61 - Budżet państwa	Zadanie jest realizowane w latach 2008-2013 w ramach projektu systemowego pn. „Pierwsze kroki do sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.1. W latach 2008-2011 zrealizowano zadania: 1. Aktywna integracja – poprzez aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną. Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w kursach zawodowych, spotkaniach grupy samopomocowej. Sfinansowane zostały również zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. 2. Działania o charakterze środowiskowym – obejmują inicjatywy integracyjne na rzecz społeczeństwa lokalnego, w ramach których organizowane są m. in. pikniki oraz wyjazdy do kina. 3. Zasiłki i pomoc w naturze – realizowane poprzez wypłatę zasiłków celowych ostatecznym beneficjentom projektu.

2	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	2008-2013	1 461 858,27	99 330,95	835 246,19	527 281,13 - Budżet państwa	Zadanie zostało wykonane w ramach następujących projektów: 1. „Zdobyć wiedzę ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym" – projekt partnerski realizowany w roku szkolnym 2009/2010 przez Powiat Inowrocławski w partnerstwie z samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2; 2. „Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym" – projekt partnerski realizowany w roku szkolnym 2010/2011 przez Powiat Inowrocławski w partnerstwie z samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2; 3. „Pomoc materialna o charakterze socjalnym"; 4. „Wyprawka Szkolna".

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 10 - Gmina Inowrocław

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 10

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	37 337 413,32
Środki UE	673 485,70
Środki własne	36 383 275,68
Inne	280 651,94


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 10 w ujęciu procentowym

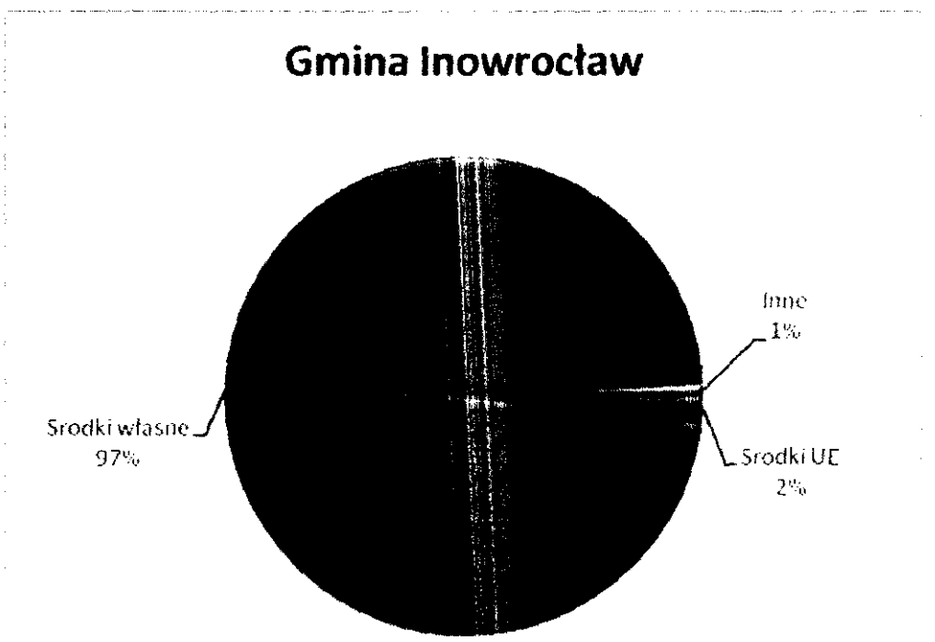


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 10

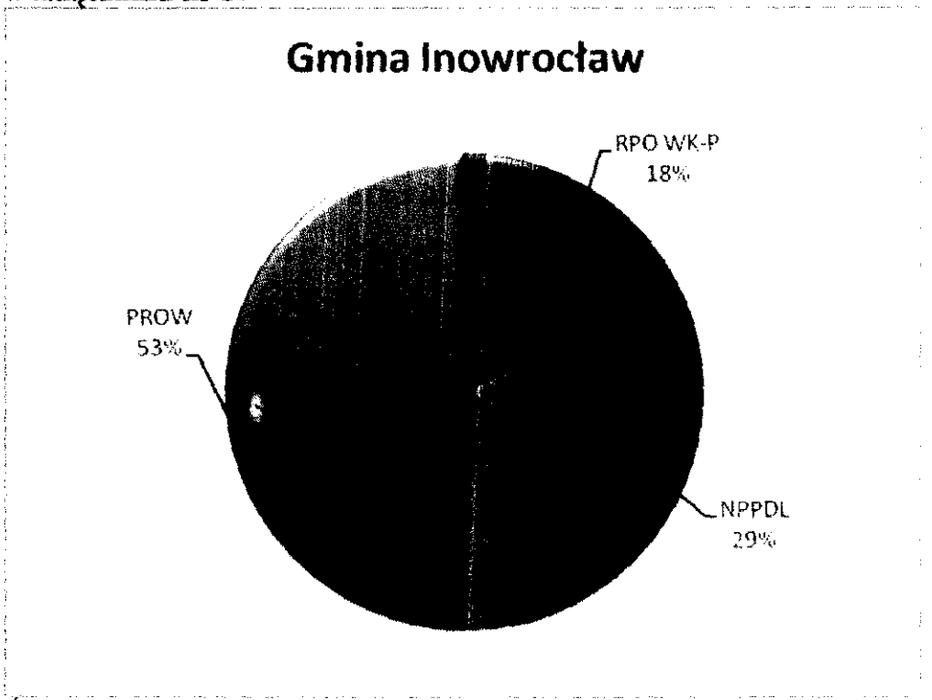

Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 10

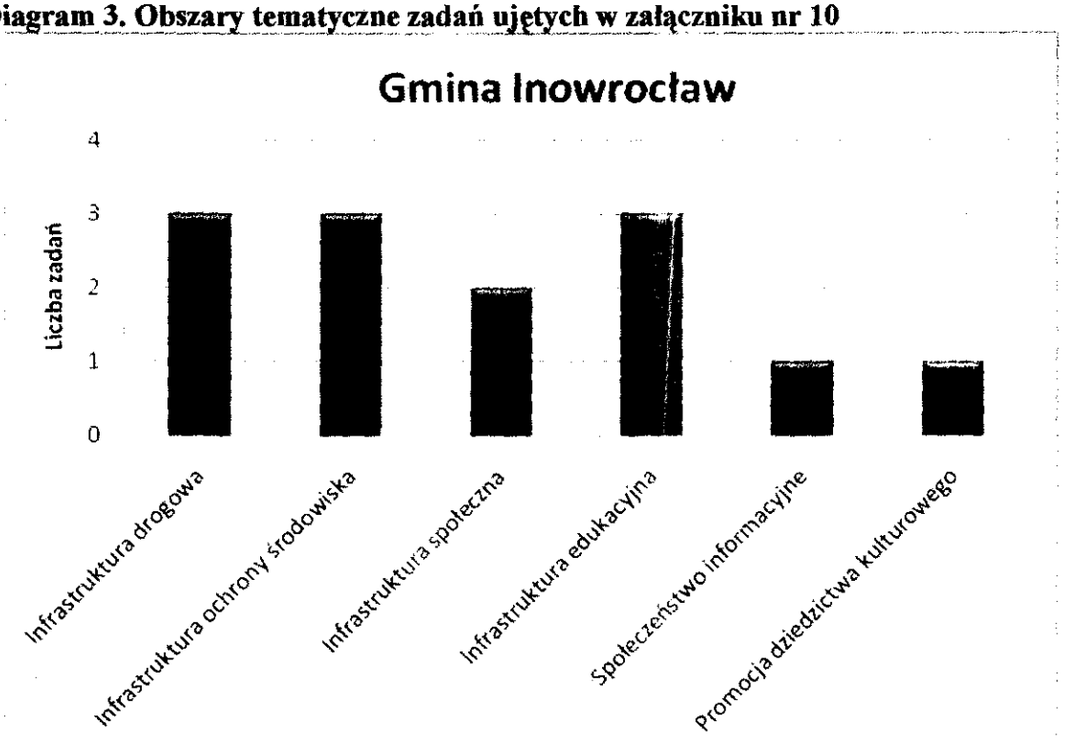

Źródło: opracowanie własne

Gmina Inowrocław

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w podinowrocławskich miejscowościach	2007-2010	1 074 833,86	-	1 074 833,86	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Wybudowano chodniki w miejscowościach: – Kłopot-Orłowo, przy drodze powiatowej nr 2033 – ok. 2110 m, – Marcinkowo, przy drodze powiatowej nr 2545 – ok. 1500 m, – Jaksice, ul. Dworcowa – ok. 320 m, – Góra, przy drodze powiatowej nr 2569 – 160 m, – Czyste, przy drodze powiatowej nr 2518 – 150 m, – Sikorowo, przy drodze powiatowej nr 2567 – 300 m. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynieryjnych na łącznym odcinku 4540 m.
2	Budowa drogi Latkowo-Jacewo-Komaszyce	2009-2012	1 222 299,93	-	1 222 299,93	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończono dwa etapy budowy: I etap od drogi wojewódzkiej nr 252 w kierunku Komaszyc (centrum) – ok. 1,1 km. II etap od drogi powiatowej nr 2545 w m. Jacewo w kierunku Balina i Latkowa ok. 900 m. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2012-2015. W wyniku zakończonych dwóch etapów inwestycji, poprawie uległ stan techniczny i użytkowy dróg na odcinku ok. 2,0 km.
3	Budowa i przebudowa dróg gminnych zapewniających dostępność do lokalnych ośrodków wzrostu i poprawiająca jakość	2007-2012	4 758 976,56	166 232,16	4 312 092,46	280 651,94 – budżet państwa	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1

	terytorium						Infrastruktura drogowa oraz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w następującym zakresie: – przebudowa drogi w m. Jacewo w kierunku Turzan – ok. 450 m, – naprawa dróg osiedlowych w m. Cieślin – ok. 300 m, – przebudowa drogi w m. Dulsk (od cmentarza w kierunku Pławinka) – ok. 500 m, – przebudowa dróg w m. Jaksice (Nowe Osiedle – ul. Polna 950 m, ul. Krótka – ul. Długa) – 1500 m, – budowa drogi Radłówek-Jaksice – 650 m, – przebudowa drogi w m. Sławęcinek do drogi w kierunku Sójkowa – ok. 500 m, – przebudowa drogi w m. Turzany – ok. 350 m, – przebudowa drogi w m. Żalinowo (droga w m. Piotrkowice ok. 350 m oraz w m. Żalinowo 350 m), – budowa drogi w m. Orłowo – 1500 m, – budowa drogi w m. Balczewo – 1500 m, – budowa drogi w m. Batkowo – 1300 m, – przebudowa drogi w m. Kłopot – 300 m, – przebudowa drogi w m. Tupadły w kierunku Kruszy Duchownej – 400 m, – budowa chodnika w m. Trzaski – 300 m, – budowa miejscowości w m. Krusza Podlotowa – 1500 m, – budowa chodnika w m. Turzany – 250 m, – budowa chodnika w m. Pławinek 240 m, – budowa drogi w m. Łojewo – 170 m. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynieryjnych na odcinku 11910 m.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Inowrocław: Kłopot, Orłowo, Jacewo, Dalkowo, Marcinkowo, Balczewo, Sikorowo, Łojewo, Dulsk, Góra, Łąkocin, Pławinek, Krusza Duchowna, Tupadły, Krusza Zamkowa	2008-2012	1 005 900,98	-	1 005 900,98	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. W ramach zadania został wykony gazociąg w części miejscowości Jacewo oraz w części miejscowości Kłopot.
2	Budowa kanalizacji głównej i szczegółowej następujących wsi na terenie Gminy Inowrocław: – Borkowo, Jaksice, Stefanowo, – Kłopot, Orłowo, – Jacewo, Dalkowo, – Jacewo, Trzaski, Komaszyce, – Łojewo, – Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Żalinowo, Piotrkowice	2007-2015	12 946 277,60	-	12 946 277,60	-	Inwestycja została zrealizowana w ok. 15%. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Jacewo wzdłuż drogi wojewódzkiej do miejscowości Komaszyce oraz w miejscowości Łojewo. Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji w miejscowości Jacewo wzdłuż drogi powiatowej oraz w miejscowości Dalkowo. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2012-2017.
3	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Karczynie	2007-2010	26 000,00	-	26 000,00	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dotychczas została wykonana dokumentacja techniczna. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2013-2015.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców inowrocławskich wsi	2007-2012	2 365 689,52	266 518,57	2 099 170,95	-	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dotychczas oddano do użytku i wyposażono pięć budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Sławęcinek, Orłowo, Sikorowo, Łąkocin oraz Jacewo. Na bieżąco remontowane i doposażone są istniejące budynki świetlic. Oddano również do użytku 12 placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Miechowice, Pławinek, Komaszyce, Orłowo, Sławęcinek, Krusza Zamkowa. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2	Modernizacja i remonty obiektów gminnych	2007-2012	1 965 785,59	240 734,97	1 725 050,62	-	Zadanie zostało wykonane w 70% w następującym zakresie: – przeprowadzono remont dachu budynku Urzędu Gminy, – przeprowadzono termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Orłowo, – wybudowano i wyposażono świetlicę wraz z remizą OSP w miejscowości Jacewo, – przeprowadzono modernizację Pałacu w miejscowości Komaszyce (remont poszycia dachowego oraz wymiana stolarki okiennej). Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jacewie sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa Gimnazjum w Żalinowie im. Jana Pawła II	2007-2011	1 839 679,55	-	1 839 679,55	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z salami lekcyjnymi. Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górze	2007-2011	1 788 029,39	-	1 788 029,39	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z trzema salami lekcyjnymi. Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaksicach	2007-2011	4 270 763,34	-	4 270 763,34	-	Zadanie zrealizowano w 75%. Została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z salami lekcyjnymi. Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Internet pod strzechami – mieszkańcy inowrocławskich wsi w światowej sieci internetowej	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji zadania 2012-2020.

Obszar tematyczny: **Promocja dziedzictwa kulturowego**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Aktywizacja kulturalna środowisk społecznych gminy Inowrocław	2007-2012	4 073 177,00	-	4 073 177,00	-	Zadanie zrealizowano w 90%, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2011 udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego dla imprez, spotkań i szkoleń oraz dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego (m.in. wycieczki, wydano foldery i publikacje).

Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 11- Inne organizacje

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 11

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	1 604 296,40
Środki UE	60 950,00
Środki własne	189 433,39
Inne	1 353 913,01


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 11 w ujęciu procentowym

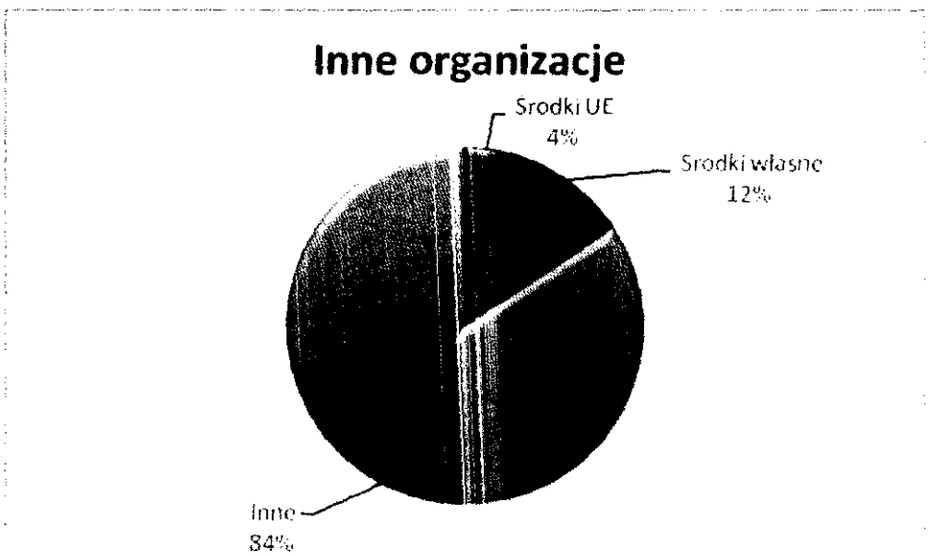

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 11

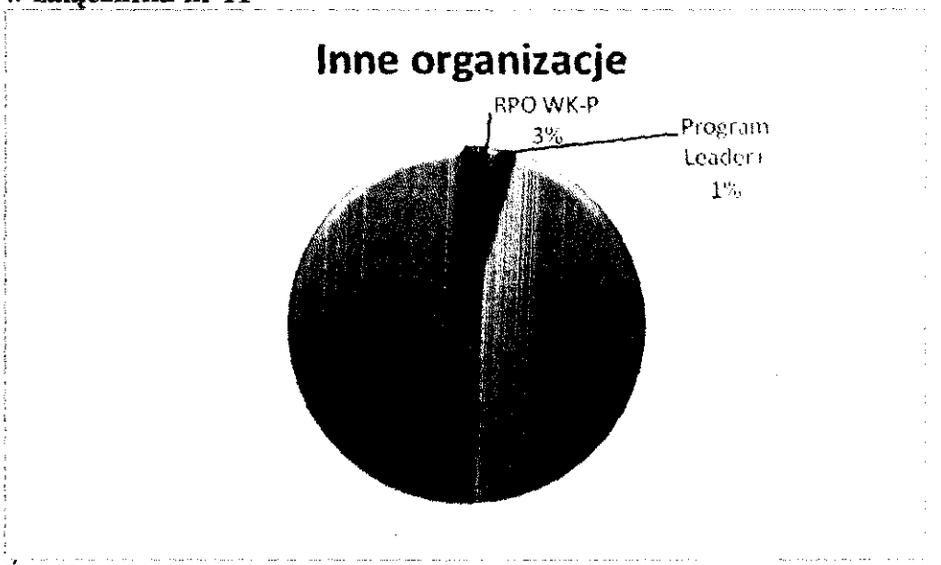

Źródło: opracowanie własne

Inne organizacje

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Remont kapitalny dachów budynku kościoła wraz z wieżą jako II etap prac budowlano-remontowych w Kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną.	2008 r.	650 016,00	-	50 016,00	600 000,00 środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym i harmonogramem. Przedmiotem zadania był remont kapitalny dachów budynku kościoła wraz z wieżą. Przeprowadzone prace remontowo - zabezpieczające, zostały uznane przez ekspertów Głównego Instytutu Górnictwa za konieczne w trybie pilnym w ramach drugiego etapu w celu zachowania zabytku, zapewnienia trwałości zakończonych w 2007 r. prac i całkowitego zabezpieczenia niniejszego obiektu sakralnego przed katastrofą budowlaną. Remont kapitalny dachów budynku kościoła obejmował następujący zakres prac: I. Remont pokryć z dachówki 1.1.Roboty różne 1.2.Wymianę pokrycia i konstrukcji II. Remont pokryć z blachy 2.1. Roboty różne 2.1. Wymianę pokrycia i dachówki. W latach 2009 – 2011 kontynuowano dalsze prace remontowo- budowlane oraz konserwatorskie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Powiatu Inowrocławskiego oraz budżetu Miasta Inowrocławia. Zakres prac został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W latach 2009-2011 przeprowadzono kompleksowe

							prace restauratorskie organów współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
2	Remont dachu kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu – wymiana zniszczonej dachówki nad nawą główną i prezbiterium.	2008 r.	50 000,00	-	-	50 000,00 - budżet Powiatu Inowrocławskiego	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym w 2009 r. Przedmiotem zadania był remont dachu kościoła obejmujący wymianę zniszczonej dachówki nad nawą główną i prezbiterium. Zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe oraz roboty pokrywcze obejmujące krycie dachu dachówką ceramiczną mnich- mniszka na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami (50% nowa dachówka - Mnich). Prace pozwoliły zapobiec dalszej degradacji tego cennego obiektu sakralnego. Zakres prac został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3	Prace konserwatorsko-remontowe w kościele p.w. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Rojewie	2008 r.	399 581,39	-	94 581,39	9 000,00 – Fundusz Rozwoju Wsi 25 000,00 – Fundusz Kościelny 180 000,00 – środki Urzędu Marszałkowskiego 65 000,00 – budżet Gminy Rojewo 26 000,00- budżet Powiatu Inowrocławskiego	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym i harmonogramem ze środków własnych Parafii, środków Fundacji Rozwoju Wsi, Funduszu Kościelnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Gminy Rojewo. Zadanie kontynuowano w latach 2009-2010. Przedmiotem zadania było przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych. W ramach zadania dotychczas wykonano remont elewacji wieży kościoła, dachu kościoła w ramach trzech etapów. Zakres prac został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4	Rewitalizacja krypt i reliktów dawnych kościołów i cmentarza przykościelnego w Płonkowie	2008-2012	176 485,00	48 750,00	44 836,00	27 149,00 - budżet Gminy Rojewo 11 250,00 – dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 000,00 – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10 000,00 – budżet Powiatu Inowrocławskiego 4 500,00 - środki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym i harmonogramem. Celem zadania była ochrona i zachowanie cennego dziedzictwa narodowego i kulturowego na terenie gminy Rojewo. W ramach zadania przeprowadzono: badania archeologiczne, projekt rewitalizacji oraz projekt Parku Kulturowego pn. „Kościół p.w. Św. Oswalda w Płonkowie" (finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013), kompleksową rewitalizację terenu Parku Kulturowego oraz rekonstrukcję dzwonnicy drewnianej. Przeprowadzone prace pozwoliły na zakończenie kompleksowej rewitalizacji terenu „Parku Kulturowego- Kościół pw. Św. Oswalda w Płonkowie". Zakres prac został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Utworzenie Parku Kulturowego wynika z Uchwały nr XXVI/201/2009 Rady miny Rojewo z 17 września 2009 r. w oparciu o wcześniej przeprowadzone prace archeologiczne obejmujące teren dawnego cmentarza przykościelnego. Określony on został jako obszar AZP 42-40, ze stanowiskiem archeologicznym nr 49, na obszarze 265 w Płonkowie.
5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rucewie gmina Złotniki	2008-2009	308 783,00	12 200.00	-	296 583.00 - Koło Gospodyń Wiejskich, Lokalna Grupa	Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie. W ramach Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój

	Kujawskie na działkach nr 79/40 i 79/41					Działania „Czarnoziem na Soli" w Inowrocławiu, społeczność lokalna, Gmina Złotniki Kujawskie, P.W. „Filar" sp. z o.o. w Inowrocławiu	obszarów wiejskich 2004-2006", Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie Pilotażowy Program Leader + zrealizowano opracowania, analizy, ekspertyzy i dokumentację dotyczącą koncepcji zagospodarowania terenu.
6.	PROJEKT SENIOR (+50)	2008-2013	Brak danych przed sporządzeniem projektu	-	-	-	Zadanie realizowane jest od 2009 r. jako ciągłe przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria" w ramach autorskiego projektu pn. „Aktywizacja społeczności osób starszych - projekt Senior (50+)". Wykonawcą działań jest Klub „Aktywni 55 plus", który realizuje następujące zadania i cele: a) wykorzystywanie wolnego czasu (po przejściu na emeryturę) dla rozwijania swoich pasji i marzeń, b) angażowanie do działania na rzecz otoczenia poprzez współpracę międzypokoleniową, pozyskiwanie większej liczby osób (członków klubu), motywowanie seniorów do większego zaangażowania się do pracy w Klubie. c) integracja z innymi Klubami i Stowarzyszeniami i wymiana doświadczeń. Sposoby realizacji zadań: • spotkania i imprezy przy muzyce i śpiewie, • wycieczki turystyczne i piesze, rowerowe,

							autokarowe, • spacery po mieście z przewodnikiem, • spacery z kijkami, • uczestnictwo w sekcji robótek ręcznych (wystawki prac), • spotkania m.in. z psychologiem, lekarzem, rehabilitantem, kosmetyczką, fryzjerką itp. • utworzenie sekcji tanecznej. Co roku, Klub „Aktywni 55 plus" organizuje imprezy: Walentynki, Dzień Babci, Dzień Kobiet, Andrzejki, spotkania opłatkowe i inne. Dotychczasowe zadania realizowane były w ramach środków własnych SWP „Flandria" oraz wpłat uczestników. W następnych latach planowane są: utworzenie punktu informacji, dotyczącego zarządzeń i przywilejów dla emerytów (rzecznik seniora), udział w imprezach promujących SWP „Flandria", czynny udział w wolontariacie, powiększenie liczby klubów, poszerzenie oferty warsztatów bezpłatnych kursów, wyjazdy rehabilitacyjne – zwiększenie liczby wyjazdów w ciągu roku, zorganizowanie Targów dla seniorów, działania międzypokoleniowe. Działania na rzecz seniorów są promowane podczas Corocznej Międzynarodowej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.
7.	Promocja i ochrona zdrowia psychicznego. Praca z chorymi na schizofrenię, depresję, nerwicę	Działanie ciągłe	19 431,01	-	-	7 140,00–Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4 760,00 – budżet Miasta	Zadanie realizowane jest jako ciągłe przez Klub Pacjenta „Przystań Nadziei" w Inowrocławiu w ramach Fundacji „Przystań Nadziei". W ramach zadania przeprowadzono zajęcia w zakresie: psychoedukacji grupowej pacjentów i członków ich

						Inowrocławia 7 531,01 – łączna wartość realizacji zadań – imprez integracyjnych dla osób niepełnospraw-nych PFRON	rodzin, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej oraz zajęć terapeutycznych. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego pacjentów, Rozwoju działalności Klubu Pacjenta w zakresie integracji chorych ze środowiskiem. Wdrożono programy rehabilitacyjne dla osób chorych i niepełnosprawnych z powodu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych. Zadnie jest realizowane z udziałem środków pozyskanych w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, środków własnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Jan Biernacki
